

Drift og vedlikehold
Plan og utbygging nord
CLA40
18.06.2026



Statens vegvesen

E6 Hatterelv bru

Byggefase

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljøplan (SHA-plan)

Mime: 26/137074



Revisjons-Nr.	Endring/oppdatering:	Uført av navn/dato	Elektronisk godkjent av prosjektleder
1	Utarbeide SHA-plan før utlysning av konkurransegrunnlag	Kjersti Holm, Thor Ole Stensøy, Marlene Landbakk	Stein Inge Rasmussen

Alle versjoner sendes til prosjektleder for godkjenning i Mime.

INNHold

1.0 Distribusjon og lagring av SHA-plan	3
1.1 Innledning.....	4
2.0 Mål	5
3.0 Organisasjon	6
3.1 Byggherrens organisasjon	6
3.2 Hovedbedrift med samordningsansvar	6
3.3 Prosjekterende	7
4.0 Organisasjonskart	8
5.0 Fremdriftsplan	9
5.1 Byggherrens fremdriftsplan	9
5.2 Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid	9
5.3 Entreprenørens fremdriftsplan	9
6.0 Byggherrens risikovurdering	9
6.1 Mulige farer og tiltak	9
6.2 Oppfølging av risiko og risikoreduserende tiltak	9
6.3 Prosjektspesifikke risikoforhold for kontrakten etter BHF §8c	10
6.4 Potensielle uønskede hendelser	13
6.5 Risikovurdering og risikoreduserende tiltak.....	14
6.6 Forslag til risikoreduserende tiltak.....	15
6.7 Endring og oppdatering av SHA-planen	18
6.8 Endringslogg	19
6.9 Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter	19
6.10 Byggherrens plikter	19
7.0 Varslingsplan ved uønskede hendelser	21

1.0 Distribusjon og lagring av SHA-plan

SHA-plan skal lagres i MIME, og ELRAPP eller i felles WEB-hotell.

Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. Alle involverte parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen.

Distribusjonsliste	
Navn	Firma/kontor/seksjon mv.
Oddbjørg Mikkelsen	Statens vegvesen/drift og vedlikehold nord
Stein Inge Rasmussen	Statens vegvesen/plan og utbygging nord
Thorstein Kjøs Johnsen	Statens vegvesen/Bru drift og vedlikehold 2
Kjersti Holm	Statens vegvesen/plan og utbygging nord
Thor Ole Stensøy	Statens vegvesen/plan og utbygging nord
Lena Brox	Statens vegvesen/drift nord 1 og 2

1.1 Innledning

Prosjektet ligger på E6 mellom Skaidi og Olderfjord i Porsanger kommune. ÅDT på strekningen er 978 (2025) og har en andel lange kjøretøy på 28%. For Øst-Finnmark er denne vegen hovedferdselsåren til blant annet sykehuset i Alta og Hammerfest. Det er gode grunnforhold i området.

Det skal bygges ny veg og bru med H1-standard (9 meter) over en strekning på ca. 500 meter. Ny bjelkebru utgjør ca. 30 meter og får støpt fundament. Det er i dag etablert en interimsbru over eksisterende bru. Denne skal flyttes (mot nord), og det skal etableres ny interimsveg, som skal benyttes mens arbeidet på eksisterende E6 pågår. Elveløpet skal erosjonssikres på enkelte punkter. Det er store sesongvariasjoner i elveløpet.

Prosjektet har gjennomført en innledende risikovurdering av arbeidet. Aktuelle risikoområder:

- Arbeid ved elv
- Arbeid på og ved trafikkert veg
- Flytting av interimsbru/demontering av tunge elementer
- Prosjektet ligger på grensen mellom to reinbeiteområder. Risiko for reinsdyr inn på anlegget.

Listen er ikke uttømmende. Se *byggherrens risikovurdering* i kapittel 6.



Figur 1: Kartutsnitt med lokasjon for planområdet markert med rød markør. Kilde: Norgeskart.no

2.0 Mål

Byggherrestrategien setter krav til at HMS settes høyere enn kvalitet, framdrift og økonomi. Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål:

- H1-verdi (Fraværsskedefrekvens): 0
- H2-verdi (Personskedefrekvens): 0
- F-verdi (Fraværsfrekvens): 0
- N-verdi (Nestenulykkefrekvens): > 1000 (større eller over)

Andre prosjektmål:

3.0 Organisasjon

3.1 Byggherrens organisasjon

Statens vegvesen er Byggherre på riks- og europaveg. I dette prosjektet innehar byggherre selv rollen som SHA-koordinator iht. Byggeherreforskriften.

Prosjekteier	Oddbjørg Mikkelsen
Prosjektleder/seksjonsleder	Stein Inge Rasmussen
Byggeleder	Kjersti Holm
Koordinator prosjektering (KP)	Thorstein Kjøs Johnsen
Koordinator utførelse (KU)	Kjersti Holm
Følgende personer har utarbeidet tilbudsgrunnlagets risikovurdering inkludert restrisikorapport fra tidligere faser	Kjersti Holm, Thor Ole Stensøy, Marlene Landbakk

3.2 Hovedbedrift med samordningsansvar **XXXX**

Prosjektleder	(sett inn navn)
Anleggsleder(e)	
Leder (navn) for samordningsansvar	
Verneombud	
Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): Se ELRAPP eller HMSREG <kontrakten> /Oversiktslister/RF 504-skjema	
Andre interessenter (teleoperatører, kraftselskaper osv.)	

Andre aktører som skal utføre arbeid på/ved anleggsområde i prosjektet, og må samordnes:
(sideentreprenører, andre byggherrer som f.eks. teleoperatører, kraftselskaper, kommuner osv.)

Virksomhet	Kontaktperson
Statens vegvesen/Driftskontrakt 9506 Vest-Finnmark	Lena Brox lena.brox@vegvesen.no


Tilgrensende arbeider kan ha behov for koordinering og samordning. Dette kan innebære tilgrensende arbeid koordineres gjennom koordineringsmøter, entreprenørens fremdriftsplan, koordinerte risikovurderinger, beredskapsplaner med mer.

3.3 Prosjekterende

Byggherrens prosjekterende:	
Virksomhet:	Kontaktperson:
Statens vegvesen	Thorstein Kjøs Johnsen/prosjekteringsleder
Statens vegvesen	Ingvild Nylund/planleggingsleder
Statens vegvesen	Torkel Bjørbæk/VA
Statens vegvesen	Christian Azar Larsen/vegplanlegger

Entreprenørens prosjekterende:	
Virksomhet:	Kontaktperson:

4.0 Organisasjonskart

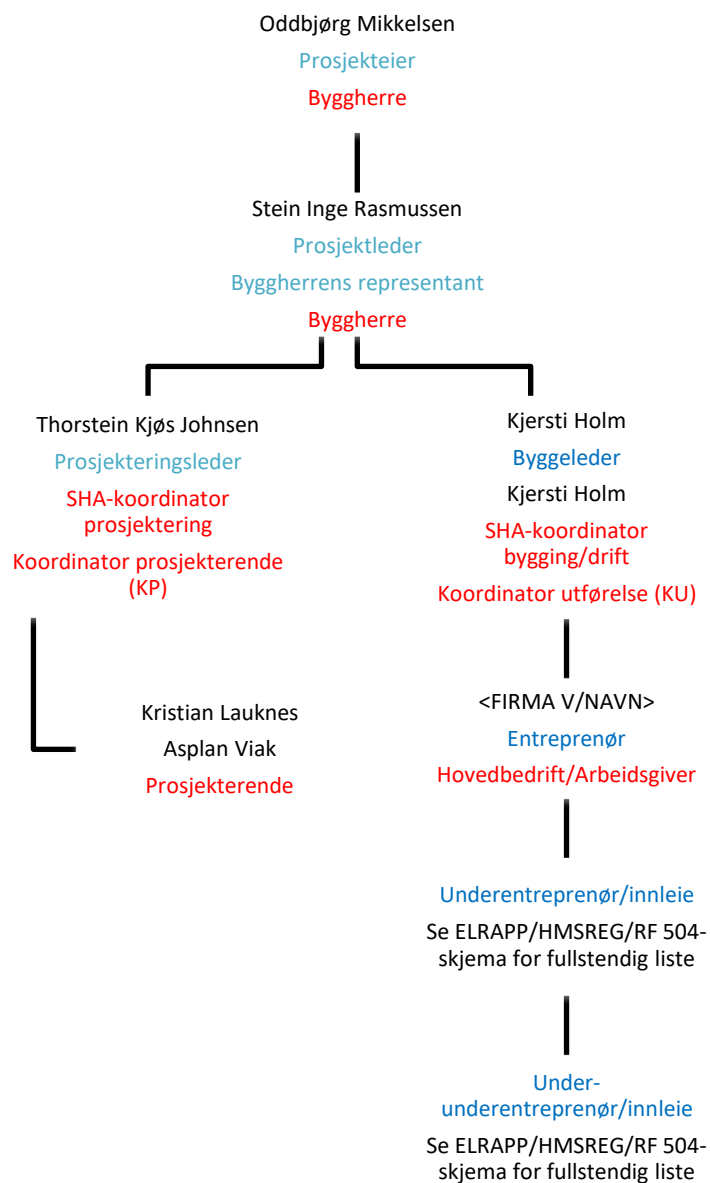

Rød tekst: Rolle iht byggherreforskriften/arbeidsmiljøloven. NB: Rollen som koordinator er å anse som kontaktpersoner hos byggherre. Juridisk person er Statens vegvesen som byggherre (rettssubjekt)
Blå tekst: Entrepriseform
Sort tekst: Navn på firma eller person

5.0 Fremdriftsplan

Det er krav i byggherreforskriftens § 8 bokstav b at det foreligger en fremdriftsplan.

5.1 Byggherrens fremdriftsplan

Beskrivelse	Dato/tid
Kontraktsinngåelse	September 2026
Samhandling	September/oktober 2026
Oppstart	September/oktober 2026
Fase 1 Etablering av interimsveg- og bru	
Fase 2 Etablere ny E6 og bru	
Ferdigstillelse	30.06.2028
Evaluering	

Se kontrakten for oppdaterte frister.

5.2 Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid

Byggetid estimert til 80 uker. Prosjektområdet er på vinterstid utsatt for mye snø i form av nedbør og fokksne. Det må på regnes stans i arbeidene i perioder hvor vinterværet gjør det vanskelig og utføre arbeid i prosjektet.

5.3 Entreprenørens fremdriftsplan

Entreprenørens til enhver tid gjeldende fremdriftsplan skal være tilgjengelig i M-Files.

6.0 Byggherrens risikovurdering

6.1 Mulige farer og tiltak

Byggherren har foretatt innledende/overordnet risikovurdering for E6 Hatterelv bru. En risikovurdering er alltid beheftet med usikkerhet og er derfor ingen fasit for hva som kan skje. Den inngår som et beslutningsunderlag både under planlegging og utførelse av arbeidet.

Risikovurderingene for E6 Hatterelv bru er gitt på de neste sidene. Identifiserte farer som krever risikoreduserende tiltak er markert med rødt og farer der tiltak må vurderes er markert med gult. Farer markert med grønt er vurdert til å ha så lav risiko at tiltak vanligvis ikke er nødvendig. Risikovurderingen er foretatt både før og etter risikoreduserende tiltak. Selv om en risikovurdering ender i en grønn kategori skal man alltid vurdere behov for tiltak. Dette basert på usikkerheten som ligger i selve risikovurderingen.

6.2 Oppfølging av risiko og risikoreduserende tiltak

Byggherrens risikovurdering i tilbudsgrunnlaget med tiltak er ikke nødvendigvis uttømmende. Arbeidsgiver og enmannsbedrift skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt

gjøre selvstendige vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Begge parter skal gi løpende tilbakemelding om nye risikoforhold eller endrede forutsetninger i risikovurderingen utover det som er påpekt i tabellene i kap. 6.3/6.6. Avdekkes det risikoforhold som ikke inngår i byggherrens innledende risikovurdering, skal disse meldes byggherre umiddelbart og ajourføring av SHA-planen. Ved endringer/tilføyelser i risikovurderingen skal dette føres i endringsloggen i kap. 6.8.

Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid eller involveres i de aktuelle arbeidsoperasjonene, skal være med på gjennomgangen av den aktuelle sikker-jobb-analysen, samt signere for dette på dokumentet. Dokumentasjon av de ulike arbeidsgiveres og enmannsbedrifters egne risikovurderinger og sikker-jobb-analyser (SJA) skal overleveres byggherre løpende i kontraktstiden. Prosedyrer skal leveres senest en uke før de aktuelle arbeidsoperasjonene starter. Alle SJA og tilhørende prosedyrer skal lagres i M-Files.

Iht. arbeidsmiljølovens §3-2 pkt. 3 skal arbeidsgiver og enmannsbedrifter sørge for at det finnes arbeidsinstrukser for aktiviteter som medfører risiko. Spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner skal avmerkes i fremdriftsplan.

6.3 Prosjektspesifikke risikoforhold for kontrakten etter BHF §8c

Byggherreforskriftens § 8 presenterer en rekke typer arbeid som kan innebære fare for liv og helse. I denne risikovurdering vurderes alle de forhold med referanse til BHF med begrunnelse for hvorfor de er aktuelle eller ikke for denne entreprisen.

Nr.	Risikoforhold og begrunnelse	Aktuelt for prosjektet	
		Ja	Nei

Velg Ja eller Nei og sett inn kryss

1	Arbeid nær installasjoner i grunnen VA-installasjoner.		X
2	Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner Kontaktskade/lysbue ved støt. Høyspent i luftlinje i nærheten av anleggsområdet (Skaidi-siden). Fiberkabel og strømførende kabel langs eksisterende trase vil krysse/krysser interimsvegen.	x	
3	Arbeid på steder med passerende trafikk/generelt arbeid på veg Arbeidet foregår på og langs vegnettet, med kontinuerlig innblanding av 3.parts trafikk. Omfatter også samtidige arbeider på vegnettet. Risiko i tilknytning til arbeidsvarsling/sikring.	x	
4	Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for skred eller synke i gjørme Fare for utglidning og arbeide på sensitiv grunn. Noe myrområde. Arbeid nært elv. Arbeid i ekstremvær og fare for flom.	x	
Nr.	Risikoforhold og begrunnelse	Aktuelt for prosjektet	
		Ja	Nei
5	Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff		x

	Ikke aktuelt for dette prosjektet.		
6	Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler Ikke aktuelt for prosjektet.		x
7	Arbeid som innebærer fare for drukning Arbeid nært elv. Arbeid med erosjonssikring i elv. Arbeid i forbindelse med skred/flom. Støping av landkar i eller ved elv for ny bru og interimsbru.	x	
8	Arbeid i senkekasser der luften er komprimert Vurderes ikke aktuelt for dette prosjektet.		x
9	Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr		x
10	Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander Arbeid ved bru. Arbeid med skilt. Bruk av lift. Stikkrenneskift og annet med hengende last. Flytting av interimsbru med kran. Påstigning og avstigning av maskiner og biler. Drift av anleggsområde.	x	
11	Arbeid som innebærer rivning av bærende konstruksjoner Riving av gammel bru. Flytting av interimsbru.	x	
12	Arbeid med montering og demontering av tunge elementer Løfting og montering av store tunge element (stikkrenner, armering, skiltfundament, langsgående sikring, interimsbru etc.)	x	
13	Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner Arbeidere vil kunne bli utsatt av støv, gasser, støy og vibrasjoner. Støv og støy i forbindelsen med boring ifm. fjerning av landkar og gammel bru. Avgasser knyttet til dekkelegging. Arbeid på trafikkert veg. Knusing av stein til forsterknings- og bærelag.	x	
14	Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll Utslipp fra maskiner og utstyr. Kan være aktuelt i tilknytning til riggarbeid. Bruk av kjemiske stoffer til renhold og plantevernmidler. Bruk av salt/saltløsning. Fjerning av døde og skadde dyr grunnet påkjørsler.	x	

Nr.	Risikoforhold og begrunnelse	Aktuelt for prosjektet	
		Ja	Nei
15	Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner Ikke aktuelt for dette prosjektet.		x
16	Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare Det vil bli utført varmearbeider. Lagring av brannfarlige varer som gassflasker, diesel, oljeprodukter. Maskinarbeider. Opplasting, knusing og transport av sprengstein som kan inneholde forsagere fra tidligere prosjekt.	x	
17	Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger Er det mye arbeid med hender over skulderhøyde, arbeid på huk eller på knær, ubekvemme løft. Er en utsatt for arbeidsstillinger med bøydhode framover, stående arbeid og gjentakende armbevegelser?	x	
18	Vinterdrift Drift av anleggsområde på vinteren.	x	
19	Sommerdrift Drift av anlegget på sommeren.	x	
20	Arbeid nær jernbane Vurderes ikke aktuelt for dette prosjektet		x
21	Fare for smitte av pandemi Kontraktsområde kan få redusert bemanning i forbindelse med smitte grunnet pandemi	x	
22	Seriøsitetsarbeid Uønskede hendelser som følge av uforsvarlige arbeidstidsordninger/vaktplaner.	x	
23	Andre risikoforhold xxxxxxx		

6.4 Potensielle uønskede hendelser

xx av de 23 vurderte kontraktstspesifikke risikoforhold er ansett å kunne inntreffe ved denne entreprisen og skal vurderes videre i denne risikoanalysen. I tabellen under vises potensielle uønskede hendelser som kan skje i driftsfasen og disse er videre linket til hvor iht. BHF § 8 c de er vurdert til å kunne inntreffe.

Nr.	Uønsket hendelse i anleggsfasen	Ref. til pkt. 6.3
1	Kollisjon mellom entreprenørens kjøretøy og andre kjøretøy	3,6,18,19
2	Personer blir påkjørt av biler, maskiner og sykler	3,6,18,19
3	Utstyr blir påkjørt av biler, maskiner og sykler	3,6,18,19
4	Bil / -Maskinvelt / Utforkjøring	3,4,6,7,18,19
5	Ekspløsjonsfare ved påtreff av forsagere i masser som skal hentes fra Vuolmasjohka	5,16
6	Fallende last under løft	10,12,19
7	Klemfare	3,6,10,12,18,19
8	Nedfall av stein / skred / gjenstander / objekter	3,5,6,10,12,18,19
9	Skade på tredje part – uønsket ferdsel av tredjepart	3,4,5,10,12,18,19
10	Akuttutslipp, kjemiske eller biologiske stoffer, mv.	3,14,16,18,19
11	Brann og eksplosjon, brannskader	5,16,18
12	Helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner	6,13,19
13	Kontakt med strømførende ledninger	2,6,19,20
14	Fall fra høyere nivå	4,5,6,10,12,18,19
15	Skliulykker – både personell og maskiner/kjøretøy	3,6,7,10,12,18
16	Av-påstigning maskiner, andre kjøretøy	3,4,6,7,10,12,18,19
17	Sprut eller støt mot øye	5,6,10,12,13,16,19
18	Fall i vann eller elv	4,7,19
19	Manglende telefondekning for varslings. Ved dårlig vær kan det tidvis være dårlig mobildekning.	Alle
20	Seriøsitetsarbeid Uønskede hendelser pga. uforsvarlige arbeidstidsordninger/vaktplaner	18
21	Smitte ved utbrudd av pandemi	21

Nr.	Uønsket hendelse i anleggsfasen	Ref. til pkt. 6.3
22	Muskel og slitasjeskader etter ensidig og gjentakende arbeidsoperasjoner ved at arbeidet blir for tungt eller med uheldige arbeidsstillinger over tid	1, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18 og 19
23	Andre hendelser som tidligere ikke er nevnt	

6.5 Risikovurdering og risikoreduserende tiltak

Risikonivået for hver hendelse indikerer hvor alvorlig situasjonen er vurdert i forhold til å opprettholde og ivareta sikre forhold i kontraktsperioden for denne entreprisen. Risikonivået er vurdert ut fra sannsynlighet og konsekvens, se risikomatriksen under.

Konsekvens	Sannsynlighet		
	Liten (S1) >5 år	Middels (S2) 1-5 år	Stor (S3-5) 0-1 år
Kritisk (K4-K5): Personskade, død eller varige men Miljøskade, kritisk			
Alvorlig (K3): Personskade, fravær utover 10 dager Miljøskade, alvorlig			
Mindre alvorlig (K1-K2): Personskade, fravær inntil 10 dager Miljøskade, liten			

Det er identifisert, gjennomført og planlagt flere risikoreduserende tiltak i tillegg til lovpålagte og forskriftsmessige krav. Tiltakene er listet opp i rubrikken «Risikoreduserende tiltak» og er hensyntatt i vurdering av risikonivået for de ulike hendelsene.

Identifiserte farer som krever risikoreduserende tiltak er markert med rødt og farer der tiltak må vurderes er markert med gult. Farer markert med grønt er vurdert til å ha så lav risiko at tiltak vanligvis ikke er nødvendig av byggherren å beskrive som spesifikke tiltak i SHA-planen.

Risikonivået er synliggjort før og etter risikoreduserende tiltak. Det forutsettes at de risikoreduserende tiltakene blir utført og at dette følges opp av koordinator utførelse (KU). Rødt indikerer stor risiko, gult middels og grønt liten risiko.

Risikomatriksen kan også brukes for å gi en visualisering og en samlet oversikt over risikoforhold slik at en får et mest mulig komplett bilde av risikotilstanden på prosjektet. Dette fås ved å føre nr. av uønsket hendelse inn i risikomatriksen.

6.6 Forslag til risikoreduserende tiltak

Denne risikovurderingen har i hovedsak tatt for seg risiko og risikoreduserende tiltak knyttet opp mot arbeidsulykker og personskader.

Nr.	Uønsket hendelse	Risikoreduserende tiltak	Risikonivå	
			Før	Etter
1	Kollisjon mellom entreprenørens kjøretøy og andre kjøretøy	Godkjent arbeidsvarslingsplan. Se kontraktens C2-29.10. Bruke varselblink. Entydig oppmerking og skilting av trafikkavvikling. Stor aktsomhet og fartstilpasning til aktuelle vær og føreforhold.	Rødt	Gult
2	Personer blir påkjørt av biler og maskiner	Ryggealarm på alle biler/maskiner. Øyekontakt med fører før passering. Synlighetsklær-verneklasse 3. Personell skal unngå å oppholde seg unødig der det foregår maskinarbeider. Avsperre anleggsområde og fysisk skille myke trafikanter fra biltrafikk.	Gult	Grønt
3	Utstyr blir påkjørt av biler, maskiner	Arbeidsområdet skal være ryddig. Sikring i h.t. arbeidsvarslingsplan.	Gult	Grønt
4	Bil/-Maskinvelt og utforkjøring	Ha stabile grunnforhold. Om nødvendig få gjort geoteknisk vurdering av stedet. Når det pågår arbeide i sensitive områder skal alltid geotekniker (byggherre) konsulteres. Myrområde i nærheten av arbeidsområde. Tipp-plass skal være jevn (ikke tippe over kant). Unngå /skrå motbakkehelling ved tipping. Tipp-mann eller fører av tippmaskin gir signal ved stopp før tipping. Det må etableres en stabil flate for plassering av kran når bru skal flyttes.	Rødt	Gult
5	Eksplisjonsfare ved transport. påboring, og opplasting av gjen- stående sprengstoff Eksplisjonsfare ved transport av masser som kan inneholde	Søk med eksplosivhunder i samarbeid med entreprenør. Før oppstart og under anleggsdrift. Oppdager maskinfører sprengstoffrester under opplasting skal arbeidet umiddelbart stanses og bergsprenger kontaktes.	Gult	Grønt

	forsagere fra tidligere sprengningsarbeid.			
6	Fallende last under løft	Godkjent løfteinnretning og løfteredskap skal brukes. Der det ikke er godkjent festeanordning på gjenstand som skal løftes skal sikker anhuking benyttes. Det er forbudt å oppholde seg under hengende last. Hjelm, vernesko og verneklær-påbud. Husk fareblind og farlige mønstre! Oppfriskningskurs for signalgiver og anhuker. Kurs – Sfs BA	Gult	Grønt
7	Klemfare	Benytte verneutstyr. Være synlig for fører av bil/maskin. Ikke oppholde seg mellom 2 gjenstander som skal kobles sammen (bil-plog, betongrør, rekkverk/stolpe, skilt, etc.) Husk fareblind og farlige mønstre! Kurs – Sfs BA	Gult	Grønt
8	Nedfall av stein/skred /gjenstander/objekter	Ikke oppholde seg under lift/kran mens det pågår arbeid i høyden. Kurs – Sfs BA	Rødt	Gult
9	Skade på tredjepart – uønsket ferdseil av tredjepart	Godkjent arbeidsvarslingplan. Om nødvendig benytte egen sikringsmann. Fysisk separere trafikantgrupper.	Rødt	Gult
10	Akuttutslipp, diesel, kjemiske og biologiske stoffer m.v.	Alle maskiner skal være utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. Benytte oppsamlingskar under transportable dieseltanker. Tilgjengelige HMS-datablad og verneutstyr.	Gult	Grønt

11	Brann & eksplosjon, brannskader.	Tilgjengelig slukkeutstyr i biler/maskiner og i bygninger. Kurs i brannbekjempelse. Forsvarlig og sikker lagring av brannfarlig/eksplosiv vare I h.t forskrifter.	Rødt	Gult
12	Helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner	Grundig renhold før arbeid i utsatte omgivelser. Støvdemping skal håndteres ved tilførsel av vann. Eksisterende vern og eller utstyr på maskiner for å unngå eksponering for helseskadelig steinstøv skal benyttes. Benytte vern og eller utstyr for å unngå helseskadelig eksponering. Benytte vibrasjonsdempet utstyr.	Gult	Grønt
13	Kontakt med strømførende ledninger	Arbeidsgiver og enmannsbedrift er selv ansvarlig for å få påvist eksisterende kabler og ledninger i den grad det er nødvendig for utførelse av kontraktarbeidet. Utvise stor forsiktighet ved usikkerhet om kabler i grunnen. Det ligger en fiberkabel og en strømkabel i traseen, se tegning I001. Sikringsmann ved arbeid nær høyspent (avstand <30m). Høyspent krysser vegen ca. 70 meter fra anleggsområdet.	Rødt	Gult
14	Fall fra høyere nivå	Der hvor kollektiv godkjent sikring ikke kan benyttes skal fallsikringsutstyr brukes. Nødvendig opplæring skal gis og dokumenteres. Korger og lifter skal være godkjent for personløft.	Rødt	Gult
15	Skli, fallulykker	Strøing av arbeidsområdet skal gjennomføres ved behov. Benytte piggsko/sko-kjetting og øvrig verneutstyr. Stor forsiktighet ved av/og- påstigning av maskiner. Arbeidsområdet skal holdes ryddig for gjenstander og eventuelt oljesøl.	Gult	Grønt

16	Av-påstigning, biler og maskiner	Aldri hoppe ut av maskiner-biler. Holde stigtrinn fri for is og snø. Forsiktighet ved bruk av dør i sterk vind.	Gult	Grønt
17	Sprut eller støt mot øye	Gode rutiner for bruk av foreskrevet vernebriller ved risikofyllt arbeid (farlige væsker og stoff, bruk av motorsag, slipemaskiner mv.)	Rødt	Gult
18	Fall i vann eller elv	Fører av tippmaskin / personell på bru/kai skal ha redningsvest som kan løses ut <u>manuelt</u> når det arbeides nær vann. Avvik skal dokumenteres med egen SJA. Fallsikringsutstyr om nødvendig. Aldri arbeide alene i slike risikoområder.	Rødt	Gult
19	Manglende telefondekning ved hendelser. Varsling.	Benytte alternativt samband/ satellitt-telefon som supplement.	Rødt	Grønt
20	Seriøsitetsarbeid Uønskede hendelser pga. uforsvarlige arbeidstidsordninger/vaktplaner	Arbeidstidsordninger/vaktordninger skal forsvarlighetsvurderes, jfr. kap. C2 pkt. 29.8, BHF §9 h.	Rødt	Gult
21	Ved pandemi eller smitteutbrudd	Følge råd fra Folkehelseinstituttet (FHI). Byggherre skal varsles umiddelbart.	Rødt	Gult
22	Muskel- og slitasjeskader etter ensidig og gjentakende arbeidsoperasjoner ved at arbeidet blir for tungt eller med uheldige arbeidsstillinger over tid.	Organiser arbeidet slik at arbeidstakerne unngår tunge løft og bæring. Bruk hjelpemidler for løft og forflytning. Vurder alltid belastningen og risikoen opp mot den enkelte arbeidstakers og helse. Viktig med pauser.	Gult	Grønt
23	Oversvømmelse som følger av dannelse av ispropp i elva	Ved dannelse av ispropp må denne fjernes i samråd med byggherre/driftskontrakt.	Gult	Grønt

6.7 Endring og oppdatering av SHA-planen

Følgende endringer medfører oppdatering i SHA-plan:

- Endringer i byggherres og entreprenørens organisasjon
- Endringer i fremdriftsplanen som har betydning for sikkerheten
- Nye risikoforhold som krever spesielle tiltak

Rutiner for behandling av endringer og oppdateringer:

De ulike aktørene i entreprisen har et ansvar for straks å melde fra til byggherren om endringer som påvirker SHA.

Beslutning om nødvendig tiltak tas av byggherren v/prosjektleder/byggeleder i samråd med SHA-koordinator og anleggsleder eller tilsvarende hos de utførende, samt prosjekterende der det er behov.

Endringer referatføres i byggemøte, oppdateres i SHA-planen og distribueres i henhold til liste i punkt 1 og endringslogg punkt 6.8

Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjøres kjent med planen og får informasjon når det skjer endringer i planen.

6.8 Endringslogg

Dato	Endringsbeskrivelse	Årsak	Utført av

6.9 Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter

Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (jfr. Revidert byggherreforskrift §18, datert 01.01.2021). Representant fra hovedentreprenør/sideentreprenør skal straks melde til byggherren når det avdekkes eller oppstår endringer i forhold til organisasjon, fremdrift og når nye forhold krever tiltak. I avviksmeldingen skal forslag til løsninger som bidrar til å lukke avviket-/ene fremlegges byggherren for avklaring/tiltak som skal inn i SHA-planen.

Arbeidsgiverne skal umiddelbart orientere sine ansatte om endringer

6.10 Byggherrens plikter

Byggherren skal sørge for at SHA-planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter

- Gjøres kjent med planen
- Får informasjon når det gjelder endringer i planen under prosjektets fremdrift som kan ha betydning for arbeidstakerens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Byggherren skal vurdere endringsforslagene, eventuelle drøfte forslag til løsninger før beslutning om tiltak tas.

Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse.

Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

7.0 Varslingsplan ved uønskede hendelser

Tallene 1-5 i varslingsplanen på neste side viser i hvilken rekkefølge varslingen skal skje. Dersom byggeleder ikke nås må man varsle neste ledd i varslingsplanen.

Varslingsplan må tilpasses det enkelte prosjekt. **Røde bokser skal ikke fjernes.**

Varslingsplanen skal gjelde for alle kritiske hendelser (skader, nesten-ulykker og farlige forhold). Varslingsplan må henges opp på naturlige plasser, som HMS-tavler og prosjektkontor.

VTS

VTS skal alltid varsles ved alvorlige ulykker. I varslingsplan er det laget to varslingslinjer til VTS. Primært skal den som oppdager hendelsen informere VTS. Byggeleder må sikre at VTS er varslet.

Arbeidstilsynet og politi

Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet skal alltid varsles ved alvorlige personskader eller dødsfall i forbindelse med arbeid.

Selv om hendelser ikke medfører personskader bør man alltid vurdere å kontakte både politi og Arbeidstilsyn. Det kan være relevant for nevnte etater å ha kunnskap om hendelsen. Det kan også være noen som har observert hendelsen og kontakter offentlige etater.

Arbeidstilsynet skal alltid varsles ved alvorlige faresituasjoner ved bergarbeid.

Strømulykker:

Ved strømulykke skal følgende skjema benyttes til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap): <https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/elulykker-og-stromskader/>.

Alvorlige strømulykker skal i tillegg meldes per telefon til DSB på 33 41 25 00 (sentralbord) eller til DSB vakt på telefon 482 12 000.


Statsforvalteren

Statsforvalteren skal alltid varsles når det inntreffer uønskede hendelser som er relatert til ytre miljø og klima

Oppfølging av K4-K5 hendelser

Byggherre skal følge prosedyre for oppfølging av K4-K5 hendelser.

Generell HMS varslingsplan Rv-prosjekt

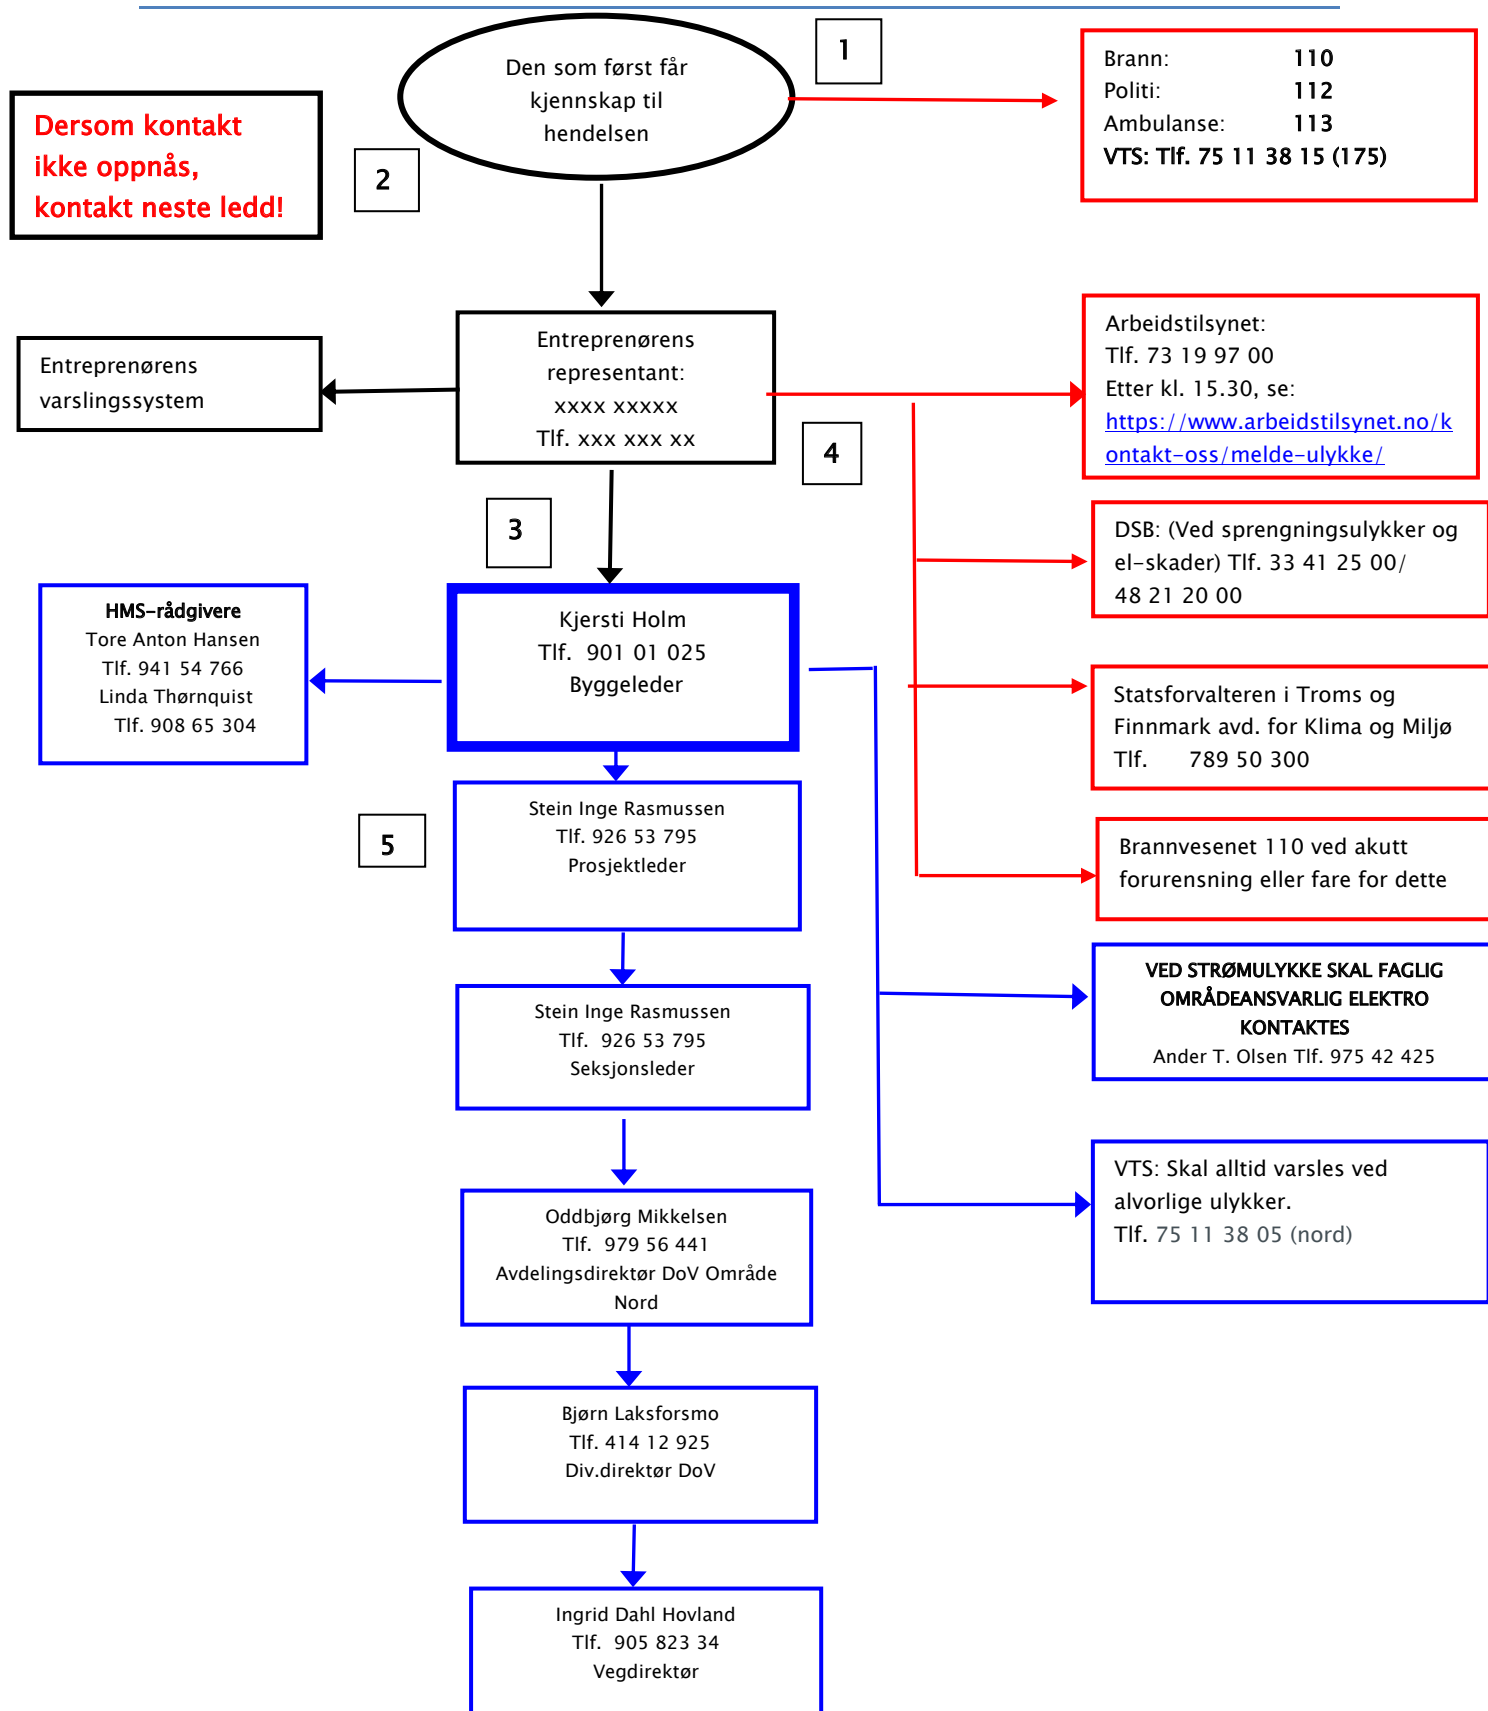

Heltrukket rød linje: Varslingslinje til redningstjeneste, tilsynsmyndigheter og Vegtrafikkentralen (VTS)

Heltrukket svart linje – Varslingslinje til entreprenørens egen organisasjon og byggeleder

Heltrukket blå linje: Varslingslinje i SVV byggherreorganisasjon
