


ID		WBS	Aktivitet	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Halvdel 2, 2025			Halvdel 1, 2026				Halvdel 2, 2026			Halvdel 1, 2027		
1		1		3269 Småhus på Ree	1454 dager	ma 24.05.21	fr 21.05.27	j		s	n	j	m	m	j	s	n	j	m	m
2		1.1		Detaljregulering	1032 dager	ma 24.05.21	ma 30.06.25													
19		1.2		Byggsak	442 dager	ma 02.06.25	fr 21.05.27													
20		1.2.1		Forprosjekt	232 dager	ma 02.06.25	to 11.06.26													
31		1.2.2		Detaljprosjektering Anlegg	135 dager	fr 19.12.25	fr 14.08.26													
40		1.2.3		Innkjøpsprsoessen	80 dager	ma 20.04.26	on 09.09.26													
41		1.2.3.1		Utarbeidelse av anbudsgrunnlag	37 dager	ma 20.04.26	fr 12.06.26													
42		1.2.3.2		Utarbeiding og levering av tilbud	15 dager	ti 16.06.26	ma 03.08.26													
43		1.2.3.3		Frist for å levere tilbud	0 dager	ma 03.08.26	ma 03.08.26													
44		1.2.3.4		Åpning og vurdering av tilbud	5 dager	ti 04.08.26	ma 10.08.26													
45		1.2.3.5		Politisk behandling av budsjett i formannskapet / Kmmunestyre	6 dager	on 02.09.26	on 09.09.26													
46		1.2.4		Utførelse	136 dager	to 17.09.26	fr 16.04.27													
47		1.2.4.1		Anlegg	134 dager	to 17.09.26	on 14.04.27													
48		1.2.4.1.1		Graving og forberedelse av tomt	15 dager	to 17.09.26	on 07.10.26													
49		1.2.4.1.2		Tilkoblingspunkt for ny vannkum i Grødalandsvegen	3 dager	to 08.10.26	ma 12.10.26													
50		1.2.4.1.3		Tilkoblingspunkt for SP og OV ledninger i Åvegen	3 dager	ti 13.10.26	to 15.10.26													
51		1.2.4.1.4		VA grøfter inkludert stikkledninger	25 dager	fr 16.10.26	to 19.11.26													
52		1.2.4.1.5		Opparbeidelse av veier uten å lage gruss på veier	14 dager	fr 20.11.26	on 09.12.26													
53		1.2.4.1.6		Utomhusarbeid	25 dager	on 17.02.27	on 31.03.27													
54		1.2.4.1.7		VA-kontroll og utlegging av grus på veier.	10 dager	to 01.04.27	on 14.04.27													
55		1.2.4.1.8		Ferdig anlegg	0 dager	on 14.04.27	on 14.04.27													
56		1.2.4.2		Bygg	136 dager	to 17.09.26	fr 16.04.27													
57		1.2.4.2.1		Detaljprosjektering for bygg	30 dager	to 17.09.26	on 28.10.26													
58		1.2.4.2.2		IG søknad for bygg	15 dager	to 29.10.26	on 18.11.26													
59		1.2.4.2.3		Fundamentering og bunnledninger	16 dager	fr 27.11.26	fr 18.12.26													
60		1.2.4.2.4		Råbygg	32 dager	ma 04.01.27	ti 16.02.27													
61		1.2.4.2.5		Tett bygg	0 dager	ti 16.02.27	ti 16.02.27													
62		1.2.4.2.6		Innredningsarbeid	36 dager	on 17.02.27	to 15.04.27													
63		1.2.4.2.7		Tilkobling for VVS-, elkraft- og teleinstallasjoner	5 dager	ma 12.04.27	fr 16.04.27													
64		1.2.4.3		Ferdig bygg	0 dager	fr 16.04.27	fr 16.04.27													
65		1.2.5		Slutfase	62 dager	on 17.02.27	fr 21.05.27													
66		1.2.5.1		Levering av FDV	20 dager	on 17.02.27	ti 16.03.27													
67		1.2.5.2		Innregulering og ferdigbefaring	10 dager	ma 19.04.27	fr 30.04.27													
68		1.2.5.3		Overtakelse bygg og anlegg	0 dager	fr 30.04.27	fr 30.04.27													
69		1.2.5.4		Inventer og innflytting	15 dager	ma 03.05.27	fr 21.05.27													
70		1.2.5.5		Prosjekt ferdig	0 dager	fr 21.05.27	fr 21.05.27													

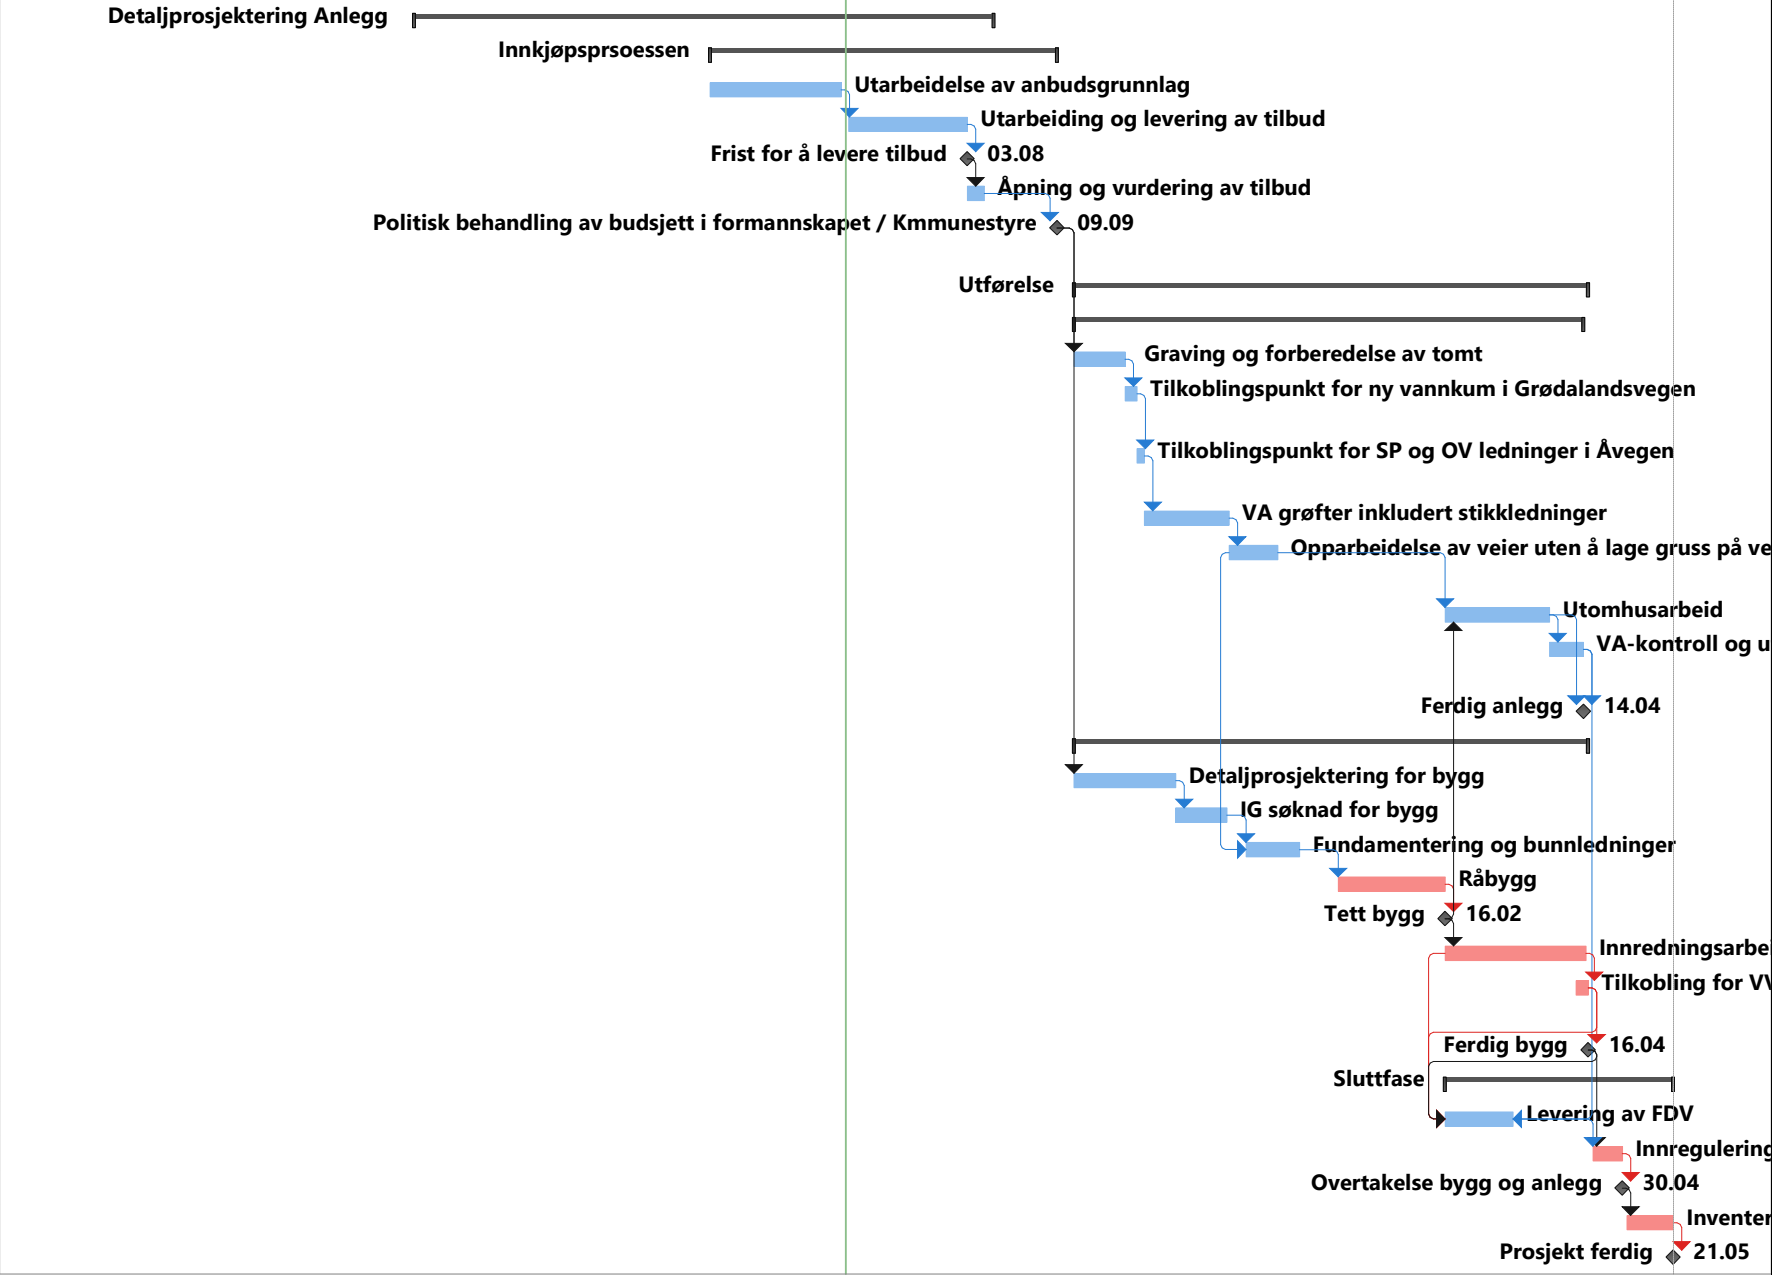

Prosjekt: Småhus på Ree Dato: ma 15.06.26	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl		Manuell fremdrift	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist			
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Kritisk			
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Kritisk deling			
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter		Fremdrift			
