

Prosjekt:

Nye Aker

Tittel:

Bilag E2 Entrepriiseplan

09	Oppdatert	17.06.26	THS	GUE	KOJ	
08	Baseline 07, cut-off 10.04.2026	10.04.26	KSS	GUE	KOJ	
07	Baseline 06, cut-off 28.09.2025	06.10.25	KSS	GUE	KOJ	
06	Baseline 05, cut-off 30.03.2025	02.04.25	KSS	GUE	KOJ	
05	Baseline 04, cut-off 29.09.2024	09.10.24	KSS	GUE	KOJ	
04	Oppdatert	23.08.24	NIS	GUU	KOJ	
03	Oppdatert	18.06.24	NIS	GUE	KOJ	
02	Baseline 15.01.2024	15.01.24	PAG	GUE	KOJ	
Rev.	Formål med utgivelsen		Rev. Dato	Utarbeidet	Kontroll	Godkjent
Kontraktor/leverandørs logo:		Bygg nr:	Etasje nr.:	Systemgr.:		Antall sider:
						Side 1 av 8
Prosjekt:	Utgivernr:	Fag:	Dok.type:	Løpenr:	Rev.nr.:	Status:
NSA	0000	Z	PL	0002	09	G

Revisjonsendringer

Rev.:	Beskrivelse av endring
09	Oppdatert med detaljerte entrepriser for innvendige arbeider

Innholdsfortegnelse

1	Generelt	3
2	Vedlegg.....	3

1 Generelt

I dette bilaget presenteres prosjektets entrepriseplan, plannivå 2.
Planen viser alle entrepriser/kontrakter med hovedaktiviteter for kontrahering og gjennomføring, slik de er beskrevet i nivå 4 i prosjektnedbrytningsstrukturen (PNS).

2 Vedlegg

Entrepriseplan.

Se neste sider.

Nye Aker Sykehus (NSA)
Entrepriplan Nivå 2
(NSA-0000-Z-PL-0002)Layout: ARH, Bilag E2 NSA
Filter: ARH, Bilag E2 NSA

Beskrivelse	Anb.Prosi.Start	Anb.Prosi.Slutt	Kunngjøring	Kontraktsign.	Byggestart	Byggeslutt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
							Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1
U2 Bygg															
U2C Rigg og drift															
1002 Felles Entreprenørigg			Apr24	Oct24	Jan25	Sep31									
1003 Felles rigg og drift råbyggfase			Apr24	Dec24	Jan25	Jul31									
1004 Felles rigg og drift innredningsfase	Oct24	Mar25	Apr25	Dec25	Apr26	Sep31									
1009 Midlertidig gangbro	Mar24	Mar24	Sep23	Nov23	Jan24	Feb24									
1011 Byggoppvarming		Aug25	Sep25	Apr26	Oct26	Apr29									
1051 Prosjektkontor bygg 60	Jan24	Apr24	Nov24	Jan25	Mar25	Nov25									
1052 Ventilasjon bygg 60					Mar25	Nov25									
1104 Felles Entreprenørigg II_UTGAR	Jun26	Dec26	Dec26	Aug27	Oct27	Mar28									
1106 Stikningstjenester			Jun25	Dec25	Feb26	Dec28									
U2D Grunnarbeider og råbygg															
2111 Grunnarbeider Somatikk			Jun23	Nov23	Feb24	Jul25									
2211 Råbygg somatikk base vest			May24	Nov24	Feb25	Jun26									
2212 Råbygg somatikk høyhus			Aug24	Feb25	Apr25	Jun27									
2213 Råbygg somatikk base øst	Oct23	Oct24	Oct24	May25	Sep25	Mar27									
2214 P-kjeller	Jan25	Aug25	Aug25	Mar26	May26	Nov27									
7311 Tilbakefylling og VA, Bygg D			Dec24	Jun25	Sep25	Jun26									
U2E Innvendige arbeider															
2215 Helikopterplattform	Jan27	Jun27	Sep27	Feb28	Mar29	Nov29									
2311 Tett bygg somatikk			Feb25	Oct25	Mar26	Oct28									
2410 Påstøp, mur og kjerneboring		Feb25	Mar25	Nov25	Aug26	Jun28									
2414 Lås og beslag	Mar25	Aug25	Aug25	Mar26											
2421 Tømrerarbeider 1 (base vest)		Feb26	Mar26	Jun26	Sep26	Aug28									
2422 Tømrerarbeider 2 (Base øst og P-hus)		Sep26	Oct26	Jan27	May27	Jun29									
2423 Tømrerarbeider 3 (Høyhus)		Jan27	Feb27	May27	Jan28	Nov29									
2424 Snekkerarbeider (Base og Høyhus)		Dec26	Jan27	Aug27	Sep27	Apr30									
2431 Systemvegger (Base og Høyhus)		Oct26	Oct26	Feb27	Sep27	Sep29									
2441 Stålprofilører og -vegger (Base og Høyhus) tidl. Ståldører		May26	Jun26	Jan27	Nov27	Nov29									
2442 Laminat- og stålplatedører (Base og Høyhus) tidl. Laminatdører		May26	Jun26	Jan27	Nov27	Nov29									
2443 Glassfiberdører (Base og Høyhus)		May26	Jun26	Jan27	Nov27	Nov29									
2444 Skyvedører		May26	Oct26	Jan27	Nov27	Nov29									
2445 Montasje og idriftsettelse lås og beslag 1		Aug26	Sep26	Dec26	Nov27	Oct29									
2446 Montasje og idriftsettelse lås og beslag 2		Aug26	Jan27	Apr27	Nov27	Oct29									
2447 Montasje og idriftsettelse lås og beslag 3		Aug26	Jun27	Sep27	Nov27	Oct29									
2448 Branngardin og porter		Apr26	Sep26	Apr27	Feb28	Jan30									
2449 Renrom dører HSI		Apr26	Sep26	Apr27	Feb28	Jan30									
2461 Malerarbeider 1 (Base vest)		Jun26	Jul26	Oct26	May27	Dec27									
2462 Malerarbeider 2 (Base øst og P-hus)		Jun26	Jul26	Oct26	Apr28	Nov28									
2463 Malerarbeider 3 (Høyhus)		Mar27	Apr27	Aug27	Jul28	May29									
2551 Gulvoverflater 1 (Vinyl base)		May26	Jun26	Sep26	Jan27	May28									
2552 Gulvoverflater 2 (Herdeplast ++ Base, P-hus og Høyhus)		May26	Jun26	Sep26	Jan27	Oct29									
2553 Gulvoverflater 3 (Vinyl Høyhus)		Mar27	May27	Aug27	Jan28	Oct29									
2554 Flis- og murerarbeider (Base og Høyhus)		Oct26	Jun26	Apr27	May27	Nov28									
2571 Himlingsarbeider 1 (Mineralull Base)		Sep26	Oct26	Jan27	Aug27	Jun29									
2572 Himlingsarbeider 2 (Metall og spesial Base og Høyhus)		Sep26	Oct26	Jan27	Aug27	Sep29									
2573 Himlingsarbeider 3 (Mineralull Høyhus)		Mar27	Apr27	Aug27	Nov28	Sep29									
2711 Fast inventar	Sep25	Sep26	Sep26	May27	Sep27	Nov29									
2715 Skilting	Aug26	Oct26	Oct26	Mar27	Sep27	Nov29									
Anbuds prosjekteringsfasen															
Kontraheringsfase															
Byggefase															

Anbuds prosjekteringsfasen Kontraheringsfase Byggefase


Nye Aker Sykehus (NSA)

Entrepriplan Nivå 2

(NSA-0000-Z-PL-0002)

Layout: ARH_Bilag E2 NSA
Filer: ARH_Bilag E2 NSA

Beskrivelse	Anb.Prosj.Start	Anb.Prosj.Slutt	Kunngjøring	Kontraktsign.	Byggestart	Byggeslutt	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031	
							Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3
2811 Stål- og metallarbeider (Base og Høyhus)		Sep26	Sep26	Apr27	Jun27	Aug30																		
2911 Brann- og lydtetting	Oct25	Mar26	May26	Aug26	Nov26	Oct29																		
U2F Utomhus																								
2903 Riving bygg 98		May26		Sep26																				
7221 Støttetur mot ring 3	Feb23	Sep23	Sep23	Jan24	Feb24	Nov24																		
7300 Utendørs Omlegging VL600	Nov22	Nov22	Feb23	Jun23	Sep23	Mar25																		
7601 Ombygging Sinsenveien og grunnarbeider VDS/TS	Sep23	Sep24	Oct24	Apr25	Jun25	Apr27																		
7602 Felles infrastruktur og byggeplog C1/B3	Sep25	May26	Jun26	Jan27	Apr27	Jul29																		
7603 Akser, torg og landskap	Apr27	Sep26	Sep26	Feb27	Apr27	Aug29																		
7604 Adkomst og heis	Apr28	Sep28	Oct28	Mar29	May29	Dec30																		
7605 Overbygning Sinsenveien og Trondheimsveien	Apr28	Dec28	Jan29	Aug29	Sep29	Jul31																		
7702 Trær	Oct24	Sep25	Apr26	Sep26																				
U2H VDS og TS																								
2041 Bygg VDS og TS	Sep24	Mar25	Apr25	Feb26	Apr26	Mar28																		
U2I Ombygging																								
2051 Rehabilitering av bygg 60		Apr28	May28	Dec28	Mar30	Sep30																		
2053 Rehabilitering bygg 28		Apr28	May28	Dec28	Mar30	Sep30																		
2061 Rehabilitering bygg 8, 9 og 21		Apr27	May27	Dec27	Mar29	Jul30																		

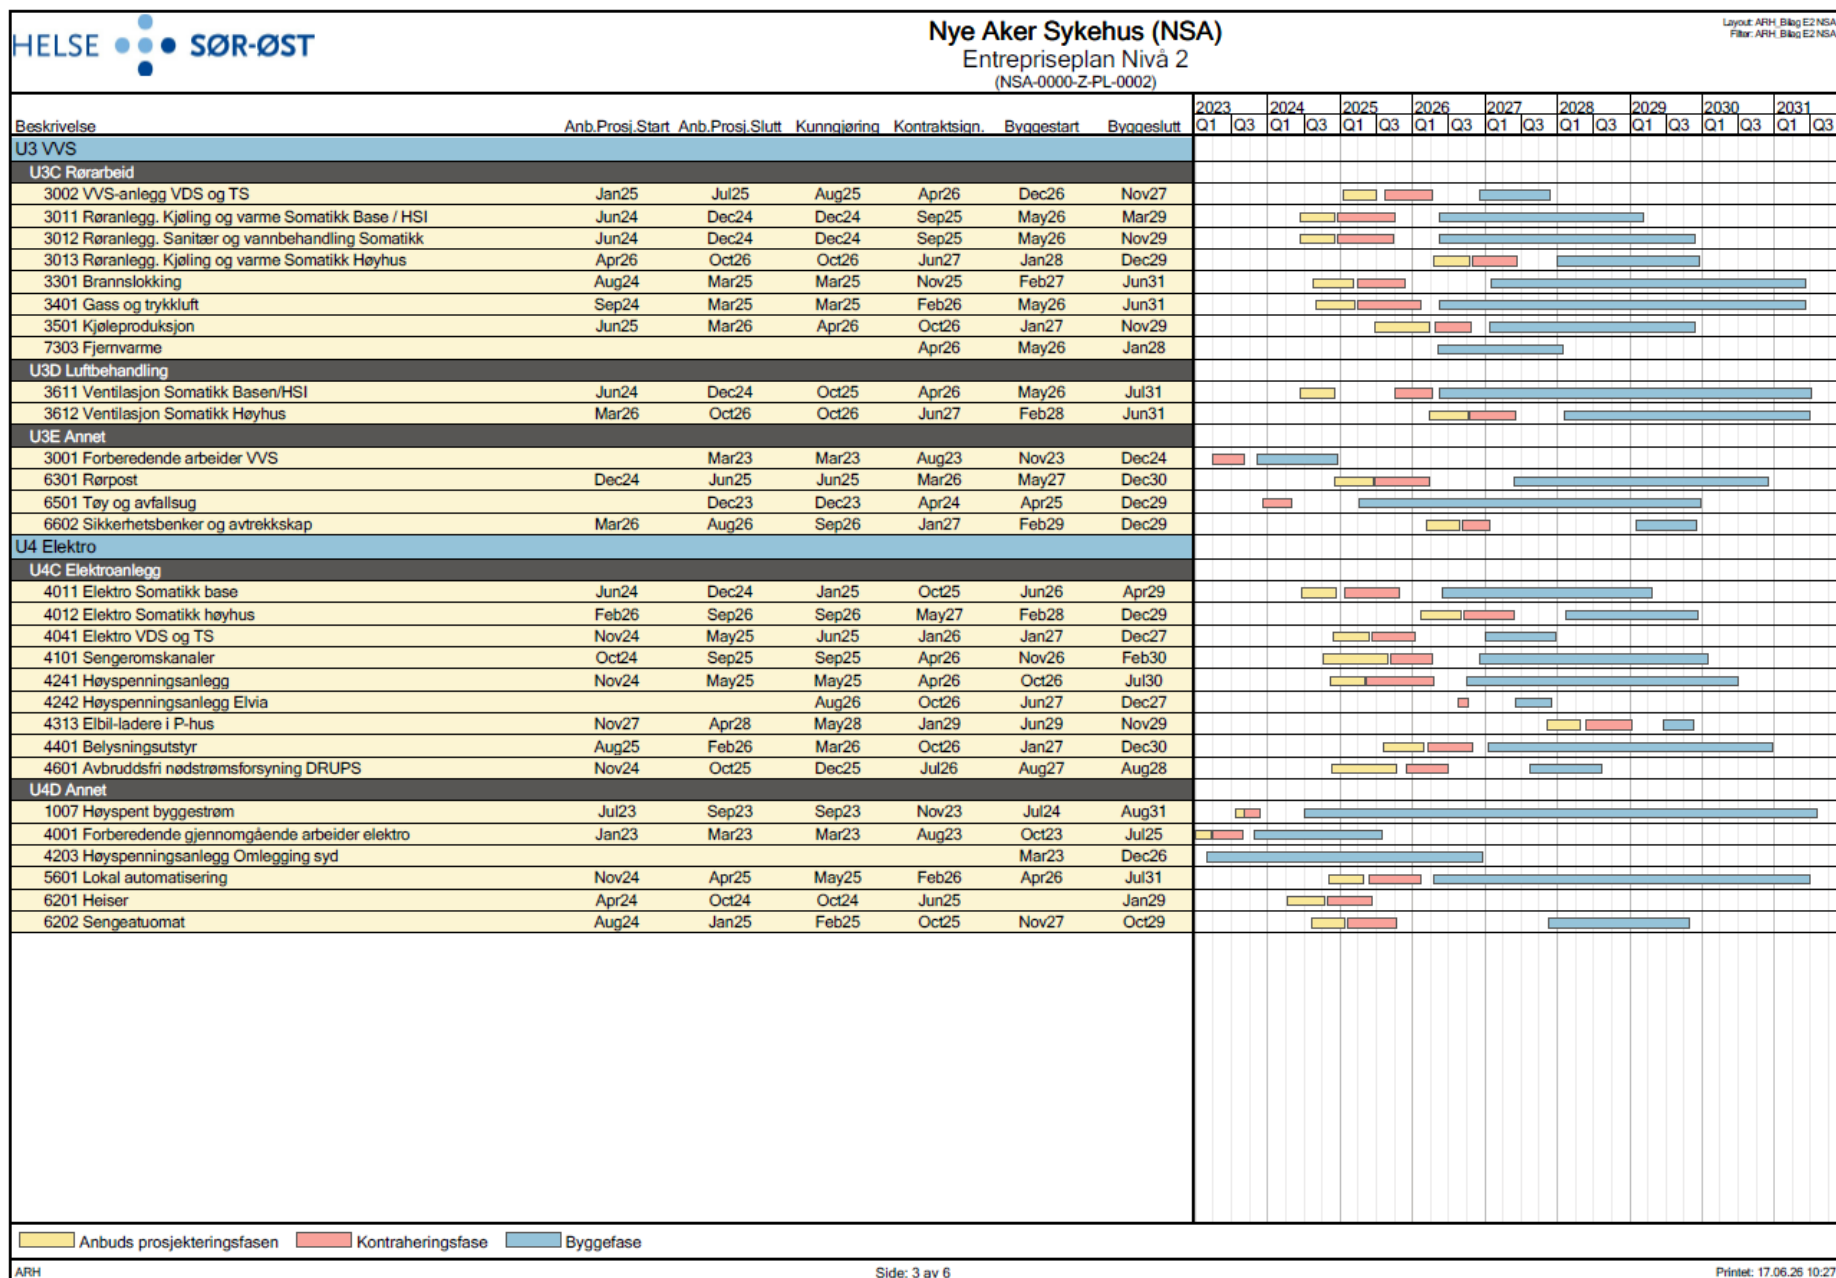

[illegible]

HELSE

SØR-ØST

Nye Aker Sykehus (NSA)

Entrepriseplan Nivå 2

(NSA-0000-Z-PL-0002)

Layout: ARH, Bilag E2 NSA
Filer: ARH, Bilag E2 NSA

Beskrivelse	Anb.Prosti.Start	Anb.Prosti.Slutt	Kunngjøring	Kontraktsign.	Byggestart	Byggeslutt	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031	
							Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3
U6E Operasjon, anestesi og intensiv																								
9400 Operasjonsbord			May28	Sep28	Oct28	Jun29																		
9405 Operasjons- og undersøkelseslamper			Aug26	Feb27	Jun30	Sep31																		
9410 Bildestyringssystem			Sep27	Jan28	Mar28	Aug28																		
9420 Pasientovervåking og telemetri			Apr28	Dec28	May29	Sep29																		
9430 Uttakssentraler			Aug26	Jan27	Jun30	Sep31																		
9440 Navigasjonsutstyr			Apr28	Aug28	Nov28	Mar29																		
9450 Kuvøser og intensivsenger spebam			May29	Sep29	Nov29	Mar30																		
9460 Samlepakke neonatalutstyr			Dec28	May29	Aug29	Nov29																		
9480 Kirurgiske instrumenter			Jun29	Oct29	Dec29	Apr30																		
9490 Samlepakke operasjon/anestesi/intensiv			Jun29	Oct29	Dec29	Apr30																		
U6F Terapi og diagnostikk																								
9540 Spesialutstyr lunge			Sep28	Jan29	Mar29	Nov29																		
9548 Søvnrregistrering			Jan27	May27	Sep27	May28																		
9550 Spesialutstyr for obstetikk			Apr29	Aug29	Oct29	Jun30																		
9570 Spesialutstyr øye			Aug28	Dec28	Sep29	May30																		
9580 EKG			Aug29	Dec29	Feb30	Oct30																		
9590 Samlepakke terapi og diagnostikk			Nov29	Feb30	Mar30	Nov30																		
U6G Grunnutrustning																								
9600 Elektronisk tøyeløsning			Oct25	Mar26	Aug27	Oct28																		
9601 Autoklav, destruksjon, gjennomgående			May26	Nov26	Apr29	Aug29																		
9611 Dekontaminator sterilisentral			Mar26	Oct26	Nov27	Mar28																		
9612 Autoklav, damp- og lavtemperatur			Sep25	Jun26	Aug27	Nov27																		
9613 Automasjon- / robotutstyr sterilisentral			Sep25	Jun26	Sep27	Mar29																		
9614 H2O2 Desinfeksjonsanlegg			Jun29	Oct29	Dec29	Aug30																		
9615 Endoskopvask (inkl. vaskebord)			Jan26	Dec26	Oct27	Jul31																		
9616 Såpedoseanlegg			Oct25	May26	Nov27	Mar28																		
9617 Ultralydvaskemaskin			Jun27	Nov27	Feb28	Oct28																		
9618 Grunnutrustning sterilisentral			Sep27	Jan28	Apr28	Dec28																		
9620 Vask- og spyledekontaminatorer			Sep25	Jun26	Oct29	Nov30																		
9625 Tørkeskap instrumenter			Mar28	Jun29	Sep29	May30																		
9631 Senge- og madrassvask			Nov25	Sep26	Aug27	Mar29																		
9632 Kabinett- og vognvaskemaskiner			Jan26	Oct26	Apr28	Nov29																		
9640 Verkstedutstyr			Jun29	Oct29	Dec29	Sep30																		
9650 Pasientløftere			Sep29	Jan30	Mar30	Dec30																		
9660 Renholdsutstyr			Sep28	Jan29	Mar29	Dec29																		
9665 Robotisering (Renhold)			Sep27	Jan28	Feb28	Nov28																		
9670 Transport- og logistikutstyr			Sep29	Jan30	Mar30	Dec30																		
9680 Kjøle- og fryseutstyr			Sep28	Jan29	Mar29	Nov29																		
9700 Fysio- og ergoterapi, treningsutstyr			Aug27	Dec27	Feb28	Nov28																		
9710 Sykehussenger			Jan30	May30	Aug30	Mar31																		
9720 Test- og måleutstyr			Jan30	May30	Aug30	Mar31																		
9780 Slynge			Jun27	Dec27	Jan28	Oct28																		
9790 Samlepakke grunnutrustning			Sep28	May29	Sep29	May30																		

HELSE  SØR-ØST							Nye Aker Sykehus (NSA) Entrepriseplan Nivå 2 (NSA-0000-Z-PL-0002)														Layout: ARH, Bilag E2 NSA Filnr: ARH, Bilag E2 NSA									
Beskrivelse	Anb.Prosj.Start	Anb.Prosj.Slutt	Kunngjøring	Kontraktsign.	Byggestart	Byggeslutt	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031							
							Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3	Q1	Q3				
U6H Løst inventar																														
9800 Kontormøbler			Mar29	Aug29	Oct29	Jun30																								
9810 Pasientromsmøbler			Mar29	Aug29	Oct29	Jun30																								
9820 Medisinske møbler			Aug28	Dec28	Feb29	Nov29																								
9840 Spesialvogner			Jan29	May29	Aug29	Mar30																								
9860 Senger			Aug28	Dec28	Feb29	Nov29																								
9870 Barnemøbler og hobbyartikler			Mar28	Aug28	Oct28	Jun29																								
9880 Bårer			Aug28	Dec28	Feb29	Oct29																								
9890 Samlepakke løst inventar			Aug29	Nov29	Feb30	Oct30																								
U8 PHA-bygg																														
U8C Totalentrepriser																														
2021 PHA Sør (inkl. A2062 Rehab. Nordre Sinsen gård)	May24	Dec24	Feb25	Nov25	Jun27	Mar30																								
2071 PHA Nord og Midt	Aug25	Jan26	Jan26	Aug26	Apr28	Sep30																								
