



Vestfold
FYLKESKOMMUNE

SHA-PLAN RIVEENTREPRISE – NY FASTLANDSFORBINDELSE

Innhold

1	Innledning	2
1.1	Mål.....	2
2	Distribusjon og lagring av SHA-plan	3
3	Organisasjonskart	4
4	Fremdriftsplan	5
4.1	Faseplan.....	5
4.2	Detaljert fremdriftsplan.....	5
5	Spesifikke risikoreduserende tiltak.....	6
6	Endring og oppdatering av SHA-plan.....	7
6.1	Entreprenørens plikter	7
6.2	Byggherres plikter.....	7
7	Varslingsplan.....	7

Revisjonsnr.	Endringer	Utarbeidet av	Dato
00	Utarbeidet for utlysning	Sveinung Lande, Grethe Bodholt, Charlene Johnsen	29.04.2026
01			
02			
03			

1 Innledning

Flere bygninger skal rives og saneres ifm. bygging av ny fastlandsforbindelse til Færder kommune.

Alle bygninger er miljøkartlagte.

Hovedmengden av arbeidene vil være på eiendommer langs mindre trafikkerte boliggater/kommunale veier, mens noen av arbeidene vil pågå langs godt trafikkerte veier som bl.a. Smidsrødveien. Entreprenøren må fremlegge godkjent arbeidsvarslingsplan jf. HB N301, disse planene skal også inkludere sikringstiltak for myke trafikanter.

1.1 Mål

Byggherrestrategien setter krav til at HMS settes høyere enn kvalitet, framdrift og økonomi.

Vestfold fylkeskommune har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål:

- H1-verdi (Fraværsskedefrekvens): 0
- H2-verdi (Personskedefrekvens): 0
- F-verdi (Fraværskdefrekvens): 0
- N-verdi (Nestenulykkefrekvens): 1000

2 Distribusjon og lagring av SHA-plan


SHA-plan skal lagres elektronisk i prosjektets dokumenthåndteringssystem; Interaxo.

Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. Alle involverte parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen.

Distribusjonsliste

Byggherre			
Funksjon	Kontaktperson	Virksomhet	E-postadresse
Prosjekteier	Nina Ambro Knutsen	VFK	nina.knutsen@vestfoldfylke.no
Prosjektleder	Morten Klokkesveen	VFK	morten.klokkesveen@vestfoldfylke.no
Delprosjektleder	Grethe Bodholt	VFK	grethe.bodholt@vestfoldfylke.no
Prosjekteringsleder/ koordinator prosjektering	Sveinung Lande	VFK	sveinung.lande@vestfoldfylke.no
SHA-rådgiver	Charlene MH Johnsen	VFK	charlene.m.h.johnsen@vestfoldfylke.no
YM-rådgiver	Kari Bjønnes Kleppe	VFK	kari.kleppe@vestfoldfylke.no
Byggeleder/ koordinator utførelse	Sveinung Lande	VFK	sveinung.lande@vestfoldfylke.no
Hovedbedrift / Totalentreprenør			
Prosjektleder, leder for samordning			
Anleggsleder			
Verneombud			

3 Organisasjonskart

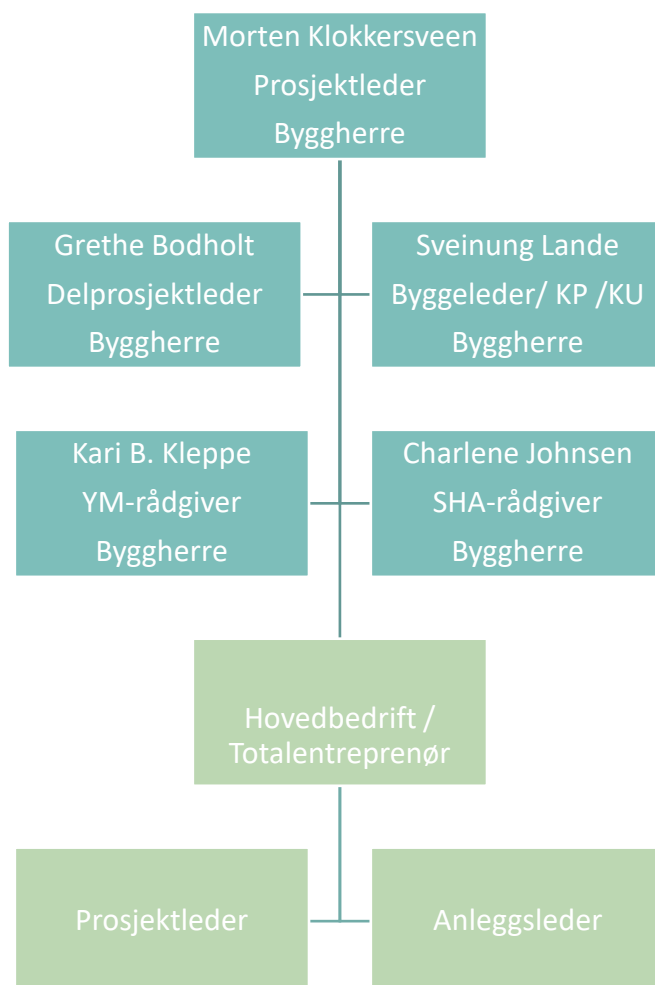

4 Fremdriftsplan

4.1 Fremdriftsplan Byggherre

Beskrivelse	Når
Prosjektoppstart	August 2026
Ferdigstillelse	Desember 2026

4.2 Fremdriftsplan Hovedentreprenør

Entreprenørens detaljerte fremdriftsplaner oppdateres løpende på Interaxo.

5 Spesifikke risikoreduserende tiltak

ID	Navn	Beskrivelse	Hovedprosess	Område	Original risiko	Forebyggende tiltak	Restrisiko
10423	Fare for asbest	Det er gjort funn av asbest i noen av boligene som skal rives. Fare for innånding av asbest støv.	HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader	13. §8c Arbeid som innebærer fare for helseskadell g eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner	20	• Alle angitte asbestforekomster skal saneres av foretak med godkjenning fra Arbeidstilsynet, i henhold til miljøkartleggingsrapporten utarbeidet av Rambøll.	1
10419	Arbeid på steder med passerende trafikk	Arbeider som inneholder frakobling av vann og avløp langs trafikkert vei - fare for påkjørsel.	HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader	3. §8c Arbeid på steder med passerende trafikk	20	• Arbeidsvarslingsplan må være på plass før påbegynte arbeider. Personer som skal jobbe ved og langs vei må ha arbeidsvarslingkurs 2. Håndbok N301 skal følges.	5
10416	Arbeid nær installasjoner i grunn	Fare for strømgjennomgang ved brudd på strømførende kabler.	HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader	1. §8c Arbeid nær installasjoner i grunnen	16	• Kabelpåvisning og forsiktig graving i henhold til retningslinjene til LEDE	4
10421	Fare for fall - uttak av vinduer	Fare ved fall i høyden ved uttak av vinduer fra hus som skal rives.	HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader	10.a §8c Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall	15	• Sikring ved hjelp av fallsikringsutstyr, lift eller stillas.	2
10420	Påkjørsel ved inn- og utkjøringer fra anleggsområder	Fare for påkjørsel ved inn- og utkjøring fra anleggsområder både langs vei og ved eiendommer.	HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader	3. §8c Arbeid på steder med passerende trafikk	15	• Entreprenør må legge til rette for arbeidere og 3.part ved inn og utkjøring fra eiendommer ved bruk av ryggevakt.	5
10417	Arbeid nær installasjoner i grunn	Fare for brudd på hovedvannledning til Færder kommune ved frakobling av stikkledning til bolighus.	HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader	1. §8c Arbeid nær installasjoner i grunnen	12	• Arbeid utføres i samråd med Færder kommune. Forsiktig graving.	4
10418	Arbeid nær luftstrekk	Arbeid skal utføres ved luftstrekk som er tilkoblet bolighus som skal rives. Fare for strømgjennomgang.	HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader	2. §8c Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner	12	• Strøm må frakobles i samråd med lede før videre arbeider.	4
10422	Fare ved riving av hus	Fare ved rivning av hus; fallende gjenstander kan treffe arbeidstgere og 3.part	HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader	11. §8c Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner	9	• Entreprenøren fremlegger en riveplan, må sikres mot trafikkert veg - både arbeidstakere, samt myke og harde trafikanter.	3

6 Endring og oppdatering av SHA-plan

Endringer kan tas i byggemøter eller andre møter som er relatert til kontrakten. Endringer må referatføres og oppdatere «Ajourføring» på side 1 i denne planen.

Følgende endringer medfører oppdatering i SHA-plan:

- Endringer i byggherres og entreprenørens organisasjon
- Endringer i fremdriftsplanen som har betydning for sikkerheten
- Nye forhold som krever spesielle tiltak

6.1 Entreprenørens plikter

Representant fra hovedentreprenør skal straks melde til byggherren når det avdekkes eller oppstår endringer i forhold til organisasjon, fremdrift og når nye forhold som krever spesielle tiltak. I meldingen skal det fremlegges for byggherren forslag til løsninger som bidrar til å lukke endringene. Entreprenøren skal umiddelbart orientere sine ansatte og underentreprenører om endringer.

6.2 Byggherres plikter

Byggherren skal vurdere endringsforslagene, eventuelt drøfte forslag til løsninger før beslutning om tiltak tas.

Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse.

7 Varslingsplan

Se vedlegg



Vestfold fylkeskommune
vfk.no

Postadresse: Vestfold fylkeskommune postboks 1213 Trudvang
3105 Tønsberg

Besøksadresser: Svend Foynsgate 9, 3126 Tønsberg

Kontakt: 33 34 40 00 / E-post: post@vestfoldfylke.no
