



SHA-plan

Granlia 40-50

Rev. nr	Dato	Skildring	KP/KU
01	04.08.2026	Revisjon 1 - Anbudsdokument	Ole Bernt Nornes


Kva som skal gjerast

Oppussing av kommunalt utleige bygg i Balestrand, prosjektet omfattar både utvendig og innvendig overflateoppussing

- Byggherre: Sogndal kommune
- Prosjektleiar byggherre: Ole Bernt Nornes/Jan Erik Thorsnes
- Utførande entreprenør:
- Prosjektleiar entreprenør:
- SHA-koordinator: Ole Bernt Nornes/Jan Erik Thorsnes
- Oppstart:
- Ferdig:

Organisering

Denne entreprisen vert gjennomført etter NS8406

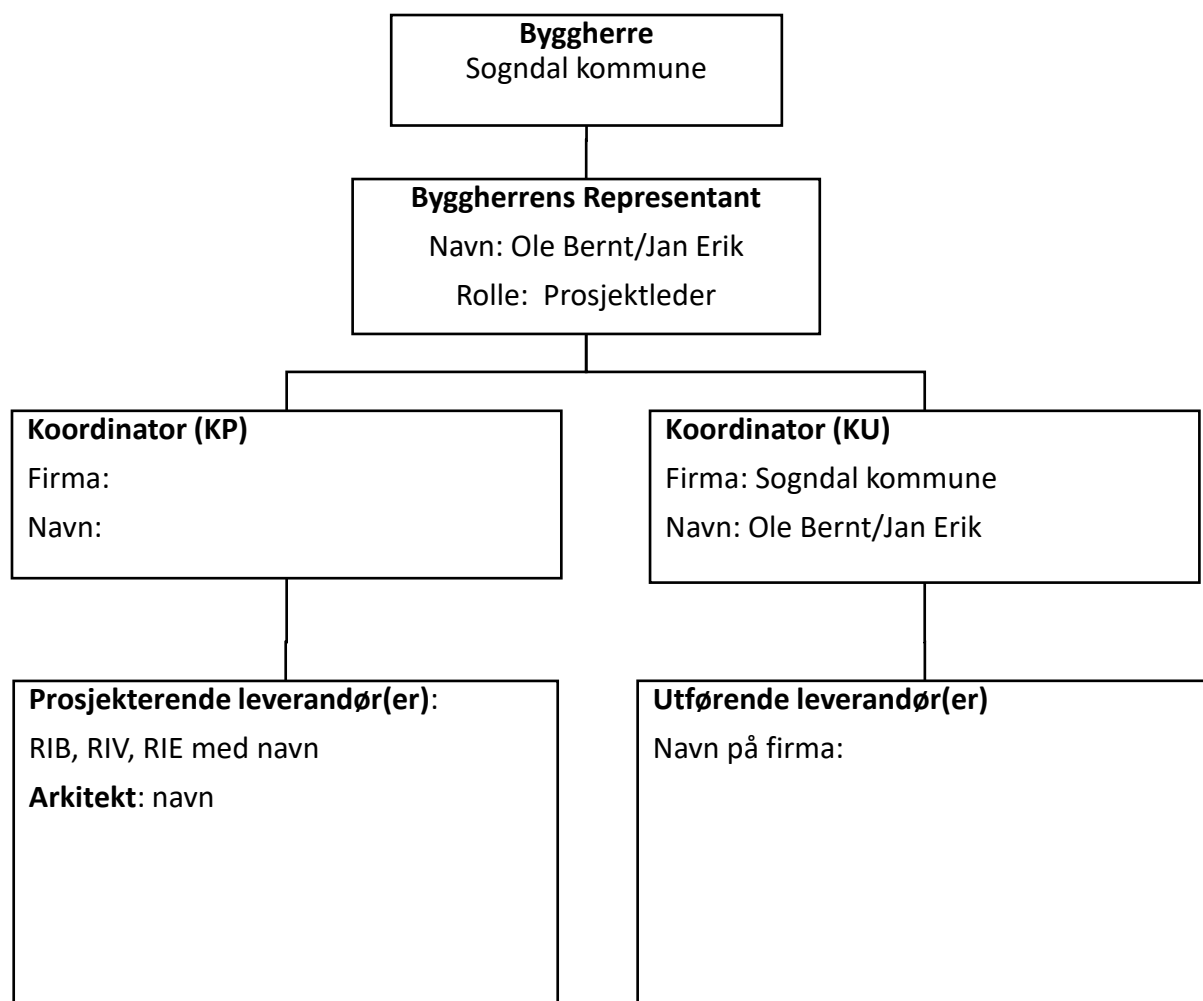

Framdriftsplan

Aktivitetar og datoar oppdaterast ved inngåing av kontrakt med entreprenør

Aktivitet	Startdato	Sluttdato
Rigging/Stillas		
Rivingsarbeid		
Utvendig oppbyggingsarbeid		
Innvendig riving		
Innvendig oppbyggingsarbeid		
VVS-arbeid		
Elektroarbeid		
Grunnarbeid		
Asbestarbeid		

Kart og rigg

Situasjonsplan settast inn her ved inngåing av kontrakt med entreprenør

Endringar og behov for oppdatering av plan

Sogndal kommune har ansvar for å holde SHA planen oppdatert til ein kvar tid ut ifrå gjeldande risiko for uønska hending og farar.

Om utførande skulle avdekke ny risikoinformasjon må dette meldast ved første anledning til KU/KP-koordinator for byggherren (sjå organisasjonskart)

SHA plan skal alltid vere eit punkt på agendaen i vernerundar og/eller byggemøter.

Ved nye truslar/risikoforhold på byggeplass vil KP/KU-koordinator revidere SHA-planen og kommunisere ut til prosjektleiaren til hovudentreprenøren. Det er hovudentreprenøren sin oppgåve å kommunisere ut vidare til sine arbeidrarar og underleverandørar.

Alle skal ha tilgang til nyaste reviderte SHA-planen på byggjeplass. Det skal både byggherre og hovudentreprenør syte for.

Spesifikke risikoforhold med tiltak

Nr	Aktivitet	Kva som er risiko	Mogleg konsekvens	Tiltak for å redusere risiko	Kven har ansvaret
1	Rigging/stillasbygging	- Fall frå stillas - Fall frå tak - Fallande gjenstandar	Personskade som følge av fall eller gjenstandar som treff personar.	Kvalifisert personell til å utføre sikringsarbeidet/stillasbygginga. Godkjenning og jamleg kontroll av stillas. Sikring av anleggsområde	Sogndal kommune & Ansvarleg entreprenør
2	Arbeid nær installasjoner i grunnen	Gravearbeid ved grunnarbeid kjem i konflikt med kablar for straum, fiber, vatn og avløp. Fare for brudd på vannledning, fare for å få straum	Naboar/byggeplass kan bli utan straum/VA om en skulle grave på kablane. Ved graving på straumkabel kan gravemaskinførar få straum gjennom seg	Grunnentreprenør gjennomfører kabelpåvising.	Grunnentreprenør
3	Kranarbeid/løftearbeid. Arbeid i høgden	Fare for at arbeidarar kjem under objekt som løftast. Fare for fall av gjenstandar frå	Personskade/dødsfall av folk som står under fallande gjenstandar.	Det må vere kvalifisert personell som utfører arbeidet. Det må utarbeidast SJA plan for arbeidet. Nødvendig verneutstyr	Sogndal kommune &

		kraning. Fare for fall frå høgde.	Eller detter ned frå høgder.	skal være tilgjengelig og nyttas ved behov.	Ansvarleg entreprenør
4	Arbeid som innebærer riving og gjenoppbygging utvendig	Matrial som kan dette ned og treffe personar eller utstyr	Personskade og matrielle skadar	TE utførar rivingsarbeid av personale som har erfaring med rivingsarbeid.	Ansvarleg entreprenør
5	Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare. Arbeid med vinkelslipar, gassbrennar el.lignande.	Brennbart materiale kan ta fyr og utvikle seg til større brann	Fare for brann	Utarbeide SJA plan for arbeidet Nødvendig sløkkjeutstyr tilgjengeleg. Brannvakt.	Ansvarleg entreprenør
