



Solund
kommune

SHA-plan

SHA plan

for

Utbetring vegparti i Klubben bustadfelt

Innhold

1	GENERELT.....	1
1.1	FORMÅL MED PLANEN	1
1.2	KONTAKTLISTE.....	1
1.3	OPPDATERING AV SHA-PLAN	1
1.4	BESKRIVING AV PROSJEKTET	2
2	SIKKERHETSSTRATEGI.....	2
2.1	BYGGING AV NY VEG MED VA-GRØFT.....	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
3	ORGANISERING OG ENTREPRISEFROM.....	3
4	FRAMDRIFTSPLAN	3
5	RUTINAR OG AVVIKSHANDTERING.....	3
5.1	AVVIKSHANDTERING.....	3
5.2	ARBEIDSMØTER OG GJENNOMFØRING	4
6	RISIKOVURDERING MED SPESIFIKKE TILTAK	4

1 Generelt

1.1 Formål med planen

Denne SHA-planen har til formål å redusere risiko og tilstrebe null skadar på bygge- og anleggsplassen. Planen gjeld for prosjekt *Asfaltering og sikring av veg – Klubben Bustadfelt*. Den omfattar heile anleggsprosessen.

SHA-planen er utarbeida i samsvar med krava i §8 i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften), og er byggherres overordna plan for styring av SHA-arbeidet i prosjektet.

Planen må ses i samanheng med krav til ivaretaking av SHA i kontraktane mellom byggherren og utførande parter.

1.2 Kontaktliste

Funksjon	Verksemd	Kontaktperson	Mobil	E-post
Byggherrens – Byggjeleiar (KP/KU)	Solund kommune	Kjartan Nyhammar	959 17 471	Kjartan.nyhammar@solund.kommune.no
Totalentreprenør – Prosjektleiar/Hovudbedrift				
Totalentreprenør - Byggjeleiar				
Totalentreprenør - HMS-koordinator				

1.3 Oppdatering av SHA-plan

Koordinator for SHA i prosjekteringsfasen (KP) er dokumentansvarlig for planen frem til oppstart av bygge eller anleggsarbeida. Koordinator for SHA i utførelsesfasen (KU) er dokumentansvarlig for planen i utførelsesfasen av prosjektet.

Planen skal reviderast dersom det er endringar i prosjektet og opplysningar om dette, eller kommande aktiviteter som krev at planen utvikles vidare. Oppdateringar av planen distribuerast på prosjekthotell/epost.

Gjeldande versjon av SHA-planen skal i tillegg være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen.

Dei som oppdagar feil eller manglar i planen eller endringar risikoforhold, har ansvar for å melde om dette til sine overordna. Byggherre skal til ein kvar tid vere oppdatert ved endra risikoforhold.

Planen skal oppbevarast i seks månadar etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avslutta.

1.4 Beskriving av prosjektet

Solund kommune ynskjer å utbetre vegen i Klubben bustadfelt.



Sunnfjord Entreprenør har utført masseoppstilling, profilering og prøvegraving på tomte. Deira filar ligg vedlagt konkurransegrunnlaget.

Mellom lengdeprofilane 8-9 i vedlegg «Kart klubben bustadfelt» er det i dag for høg stigning på vegbana, og køyestrekket må utbetrast.


Asfaltarbeid knytt til vegutbetring, parkeringsplass og renvoasjonshus.

2 Sikkerhetsstrategi

Hovudfokus skal være på høgrisikoaktiviteter (arbeid som kan inneberer fare for liv/helse). Risikostyring skal være en integrert del av prosjektgjennomføringa. Byggherren skal sørge for at det tas omsyn til SHA i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygg-/anleggsprosjektet.

3 Organisering og entreprisefrom

Denne anskaffelsen skal gjennomførast som NS8407 totalentreprise.

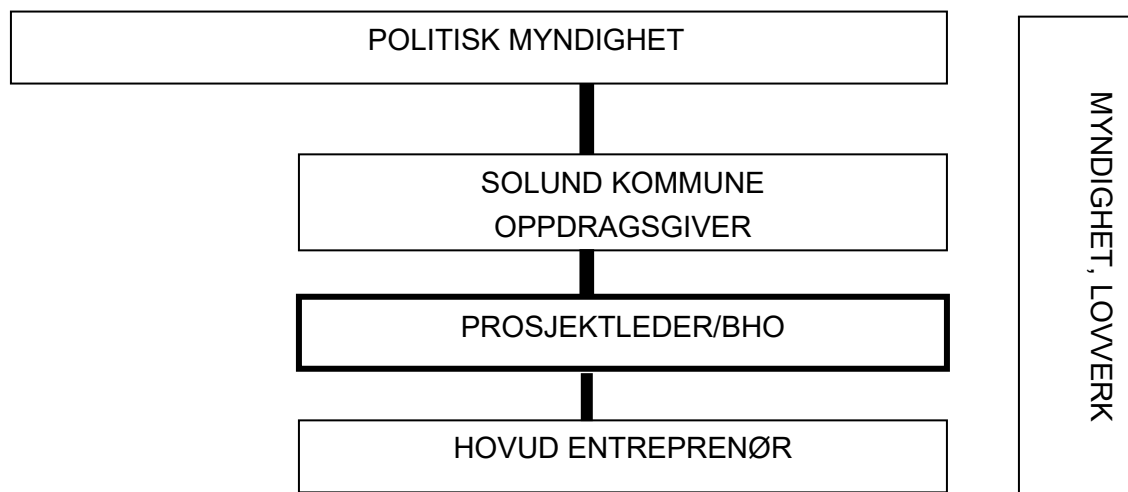

4 Framdriftsplan

Utarbeiding av framdriftsplan skjer etter tildeling av oppdrag.

Framdriftsplanen blir et dynamisk dokument som oppdaterast under vegs i utførelsesfasen. I utførelsesfasen skal det settast av tilstrekkeleg med tid for å sikre at alle arbeidsoperasjonane blir utført på en måte som sikrar Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Ansvarleg utførande skal sørge for å halde seg orientert om endringar i forhold til framdriftsplanen.

Detaljert framdriftsplan skal vere ein del av SHA planen og vere lett tilgjengeleg for arbeidsgjevarar og arbeidstakarar på bygge- og anleggsplassen.

5 Rutinar og avvikshandtering

5.1 Avvikshandtering

Prosjektets rutinar for avviksbehandling ved følgande hendingar:

- Endring i organisasjonskart og ansvar.
- Endring i beskriving av kor og når dei ulike arbeidsoperasjonene skal utføres (endring av framdriftsplan/aktivitetsinnhold).
- Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av sjølve tiltaket.
- Spesifikke tiltak som ikkje gjennomførast i samsvar med planen.
- Identifisering av nye risikoforhold som krev spesifikke tiltak som ikkje har vore beskriven tidlegare.
- Omprosjektering som medfører nye/endra risikoforhold med behov for spesifikke tiltak og/eller endringar i framdriftsplan.

Avvik frå denne SHA-planen skal rapporterast, både frå byggherren til de utførande og frå dei utførande til byggherren på følgande måte:

- Avvika skal skriftlig/munnlig meldes til koordinator utføring (KU) straks når avviket oppdagast.
- KU registrerer innmeldt/oppdaga avvik frå SHA-planen gjennom byggherrens avvikssystem.
- KU følger opp at nødvendige tiltak gjerast for at avviket blir lukka.
- Avgjersle om nødvendig tiltak tas av byggherren v/prosjektleder/byggjeleiar i samråd med KU og anleggsleder eller tilsvarande hos utførande.
- Informasjon om avvik og tiltak til alle involverte parter følger av SHA-planens distribusjonsliste.
- SHA-planen oppdaterast av vedkommande som står oppført som dokumentansvarleg hos byggherren.

5.2 Arbeidsmøter og gjennomføring

Identifikasjon og vurdering av mulige farar knytt til arbeidsoperasjoner i forbindelse med utføring av prosjektet er basert på risikovurderingar utført av prosjekterande og frå informasjon gjennom byggemøter.

6 Risikovurdering med spesifikke tiltak

Nr	Aktivitet/arbeidsoperasjon	Fare/Uønsket hendelse (risikomoment)	Forslag til tiltak for å eliminere eller redusere risiko i prosjekterte løsninger	Spesifikke tiltak for å eliminere eller redusere risiko i utførelsesfasen	Referanse-dokument	Ansvarlig for tiltak
1	Arbeid nær installasjonar i grunnen .	Fare ved gravearbeid. Fare for graving på vannkabler, straum og fiber.	Kjente eksisterande installasjonar påvisast før igongsetting av graveentreprenør.	Eigne rutinar for graving langs eksisterande vassleidning må utarbeidast.		TE
2	Arbeid på stader med passande trafikk.	Arbeidskilt og sikring langs vegtrasé.	Ingen spesifikke tiltak ut over naudsynt sikring og skilting/arbeidsvarsling.	Dirigere trafikk ved behov. Varsle kommunen ved behov for langvarig stenging		TE
3	Arbeid som inneber fare for eksponering av helseskadelig støv, gass, støy eller vibrasjonar	Gaving og sprenging kan forurense en del quartz-støv som kan ansees å være helsefarlig å puste inn i store mengder.	Ved mye støv må det innførast vanningsrutine og evt. Salting.			TE

4	Arbeid i grøft	Fare for utglidning av massar eller fall ned i grøften	Grøfter sikres mot fall der dette er behov. Grøftene må vurderes som stabile før folk kan jobbe nedi grøfter			TE
5	Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff	Dårlig sikring ved sprenging fører til at steiner treffer hus eller personer. Passerende biler/folk kjem i konflikt med sprengingsarbeid	Etableres rutiner for sikring av sprengingsområde. Kommunen varsles når sprenging skal føregå slik at dei kan gi ut informasjon til innbyggjarar			TE
6	Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare	Sprengingsarbeid og gnister fra gravemaskinskuff har utløst terrengbrann i Solund tidligere	Ha brannslukkingsapparat i gravemaskin eller nær der arbeid utførast slik at en kan slukke brann i tidlig fase			TE
