




TAK OG TAKOPPBYG

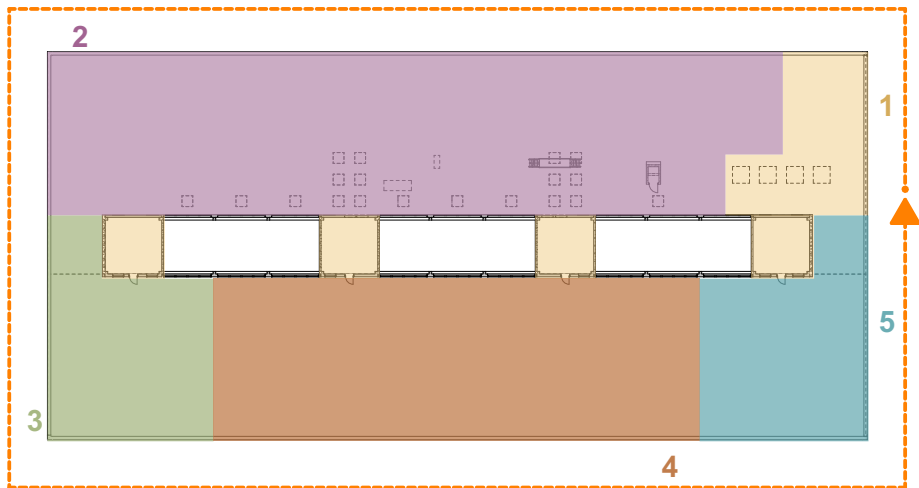

1. ETASJE

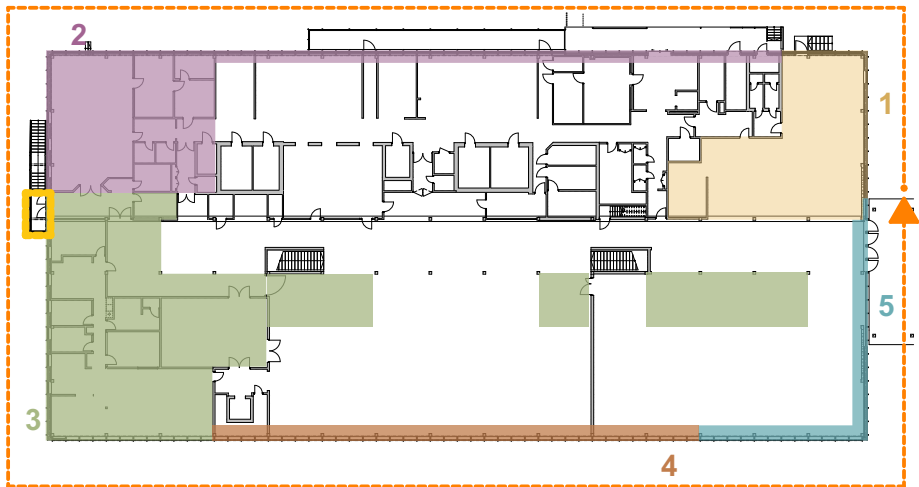

UNDERETASJE

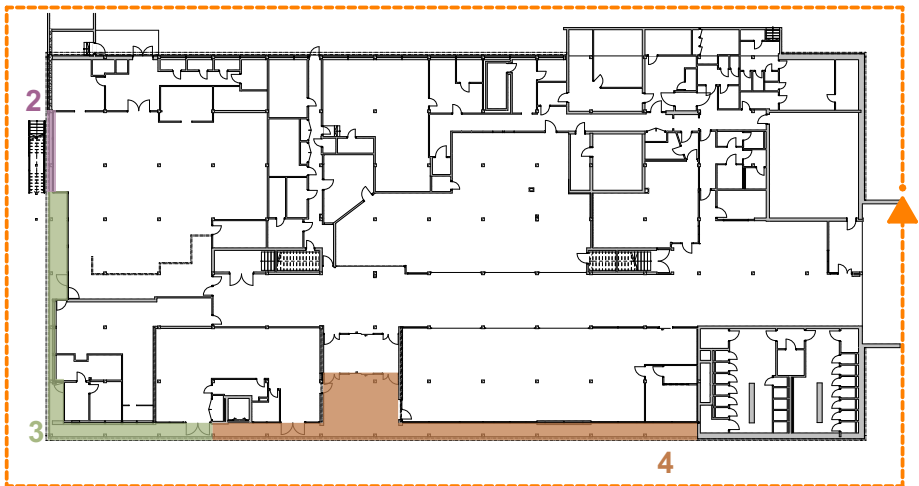

Fremstillingen av ønsket fremdrift er overordnet og arbeidene stikkordsmessig beskrevet. Oppseting av rigg er ikke hensyntatt.

| FASE | ARBEIDER I UNDERETASJEN                              | ARBEIDER I 1. ETASJE                                                                                                                                                                                                                                                                   | ARBEIDER PÅ TAK                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    |                                                      | Rehabilitering/utskifting fasade og gesims<br>Himlingsarbeider<br>Arbeidene må være avsluttet til søknad om midlertidig brukstillatelse                                                                                                                                                | Rehabilitering/utskifting takflate<br>Rehabilitering/utskifting takvinduer<br>Installering teknisk i takoppbygg m/tilhørende åpninger og rister i vegg<br>Arbeidene må være avsluttet til søknad om midlertidig brukstillatelse |
| 2    | Utskifting vinduer<br>Utvendig metallhimling m/inst. | Rehabilitering/utskifting fasade og gesims<br>Himlingsarbeider<br>Arbeidene må være avsluttet til søknad om midlertidig brukstillatelse                                                                                                                                                | Rehabilitering/utskifting takflate<br>Installering teknisk på tak<br>Arbeidene må være avsluttet til søknad om midlertidig brukstillatelse                                                                                      |
| 3    | Utskifting vinduer<br>Utvendig metallhimling m/inst. | Rehabilitering/utskifting fasade og gesims<br>Himlingsarbeider.<br>Arbeidene må være avsluttet til søknad om midlertidig brukstillatelse                                                                                                                                               | Rehabilitering/utskifting takflate                                                                                                                                                                                              |
| 4    | Utvendig metallhimling m/inst.                       | Rehabilitering/utskifting fasade og gesims<br>Himlingsarbeider                                                                                                                                                                                                                         | Rehabilitering/utskifting takflate                                                                                                                                                                                              |
| 5    |                                                      | Rehabilitering/utskifting fasade og gesims<br>Himlingsarbeider<br>NB: Klimatisert fasade mot mellombygg endres ikke<br>NB: Fremdrift må avklares med RIBr med tanke på evt. brannkrav i fasade/gesims. Arbeidene må i så fall være avsluttet til søknad om midlertidig brukstillatelse | Rehabilitering/utskifting takflate                                                                                                                                                                                              |



Demontering av konstruksjoner mot fasade gjennomført i fase 1
