



SHA-plan

**Prosjekt: 500323 P257 E6, Oppgradering av
pumpestasjon**

Byggherre: Moss kommune (MK), Prosjekt og anlegg

Hovedentreprenør: xxx

Versjon nr:1.0

Dato: 20.08.2026



INNHALDSFORTEGNELSE:

Innhold

1. Innledning	3
1.1 Oppdatering og distribusjon av SHA-planen	3
2. Organisering (BHF§ 8a).....	3
3. Fremdriftsplan (BHF§ 8b)	5
3.1 Hovedfremdriftsplan i utførelsefasen.....	5
3.2 Detaljert fremdriftsplan	5
4. Spesifikke tiltak (BHF§ 8c)	6
5. Rutine for behandling av endringer og oppdatering av SHA-planen (BHF§ 8d)	9
6. Vedlegg.....	9



1. Innledning

Prosjektet omfatter oppgradering av pumpestasjon P257 E6 for å øke driftssikkerheten gjennom etablering av tre tørroppstilte driftspumper.

Det er svært viktig at det tas hensyn for påvirkning av ytre miljø. Det skal være spylerbiler tilgjengelig ved kritisk omkobling, og det skal ikke gå spillvann til overløp under arbeidene.

Omkobling bør planlegges i en tørrværsperiode.

Moss kommune (MK) avd. Prosjekt og anlegg har etter [byggherreforskriften](#) (BHF) ansvar for å planlegge, prosjektere og utføre bygge- eller anleggsprosjekter på en slik måte at arbeidstakere vernes mot farer.

SHA-planen er utarbeidet av Moss kommune (MK), med grunnlag i risikovurderinger og tiltak fra ansvarlig prosjekterende. Planen ferdigstilles av MK og oppdateres ved behov, blant annet basert på innspill fra entreprenøren.

Byggherren skal sørge for at SHA-planen holdes oppdatert.

1.1 Oppdatering og distribusjon av SHA-planen

Versjonslogg:

Revisjon nr.	Endring	Dato

Distribusjonsliste: Sendes alle i tabell pkt.2, evnt. andre legges inn i tabell under

Funksjon	Kontaktperson	Virksomhet	E-post

2. Organisering (BHF§ 8a)

Prosjektet er organisert som en utførelsesentreprise.


Alle arbeidsgiverne (underentreprenører) er underlagt hovedentreprenør når det gjelder HMS.

Organisering i forbindelse med utførelse er som følger:

Rolle/ansvar	Firma	Kontaktperson	E-post	Mobil
Byggherre	Moss kommune	Honar Ahmed Said	honar.ahmed.said@moss.kommune.no	909 55 940
Prosjektleder BH	Moss kommune	Hedyeh Salamatravandi	Hedyeh.Salamatravandi@moss.kommune.no	401 77 888
Prosjekterende	Envidan	Rolf Terje Christensen	rtc@envidan.no	469 82 373
Koordinator utførelse	Moss kommune	Hedyeh Salamatravandi	Hedyeh.Salamatravandi@moss.kommune.no	401 77 888
Hovedentreprenør	xxx			
Underentreprenør				
Verneombud (UTF)	xxx			



Organisasjonskart SHA

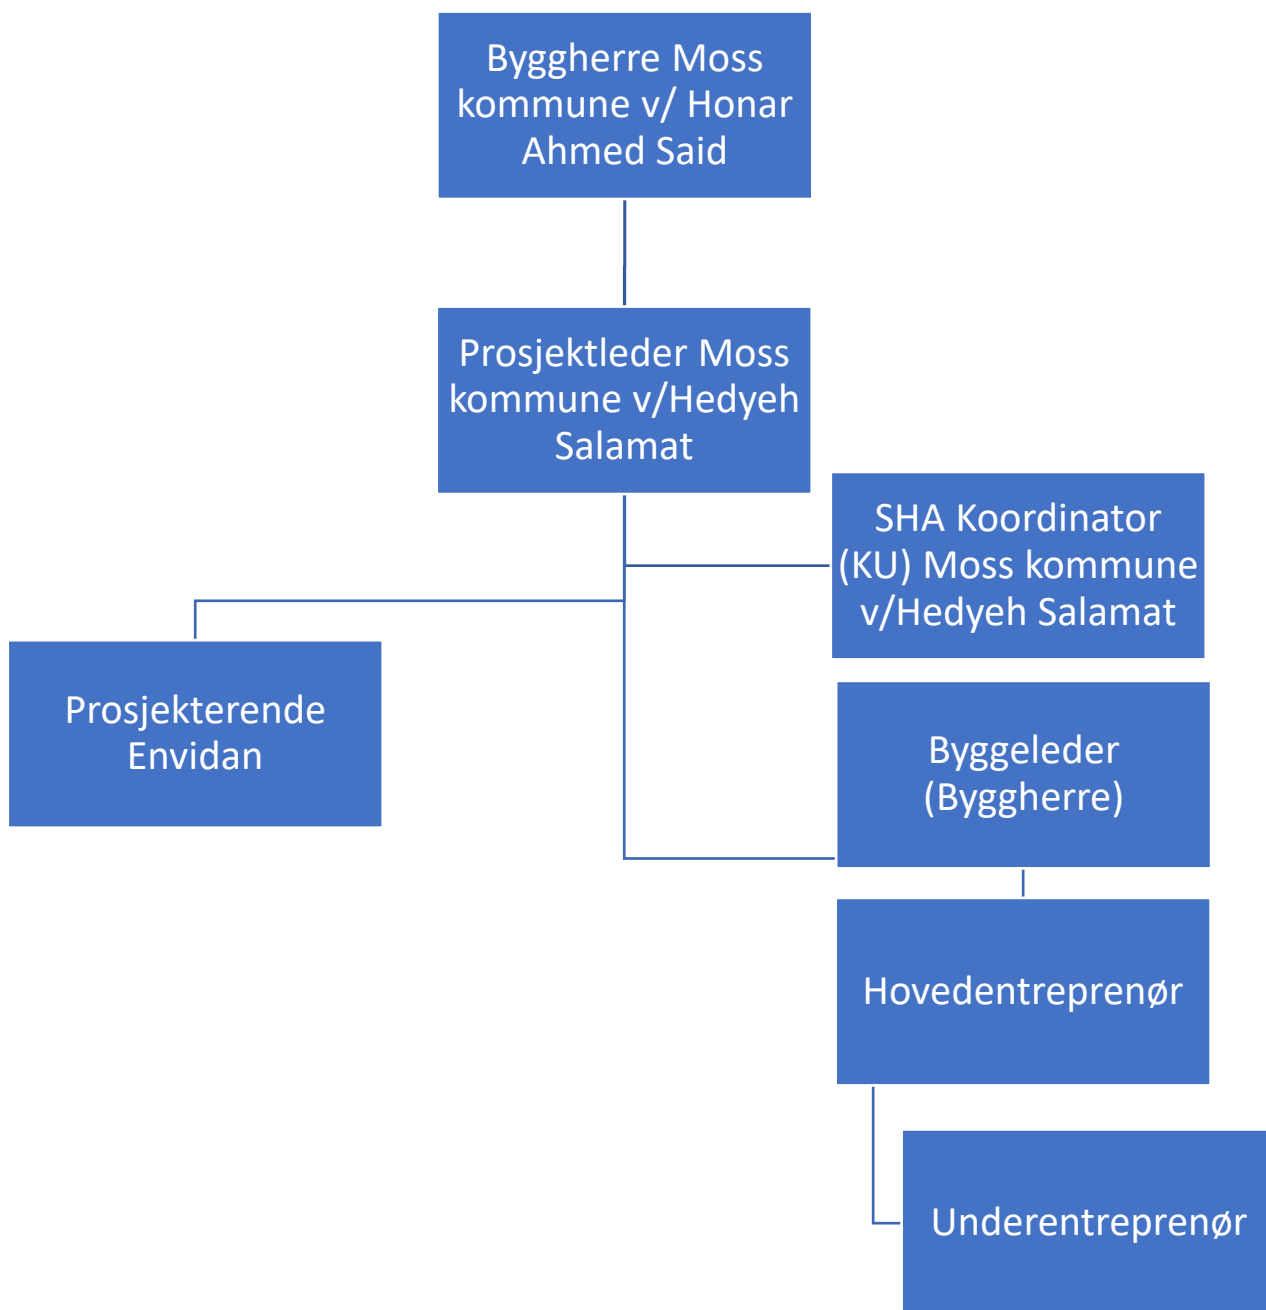



3. Fremdriftsplan (BHF§ 8b)

3.1 Hovedfremdriftsplan i utførelsefasen

Hovedfremdriftsplan:

Nr.	Beskrivelse av delmål	Dato
	Byggestart	xxx
	Ev. delmål, dagmulktbelagte frister, etc.	xxx
	Ferdigstillelse	xxx
	Overtakelse fra entreprenør	

3.2 Detaljert fremdriftsplan

Detaljert fremdriftsplan pr. dato ligger i vedlegg 2 til SHA-planen.

xxx (*sett inn entreprenørens navn*) har ansvar for å holde fremdriftsplanen oppdatert til enhver tid. Sist oppdaterte plan, hvor alle faggrupper kommer frem, skal være hengt opp på vegg inne i brakkerigg.

Dersom endringer i fremdriftsplanen får konsekvenser for risikoforhold, skal xxx (*sett inn entreprenørens navn*) informere prosjektleder MK og entreprenør skal deretter i fellesskap vurdere om risikovurderingen skal oppdateres.

Fremdriftsplanen er satt opp også med tanke på koordinering og samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene (ref. BHF §8 b).



4. Spesifikke tiltak (BHF§ 8c)

De spesifikke tiltakene er basert på risikovurderinger byggherren og de prosjekterende har utført i forbindelse med planlegging og prosjektering av prosjektet. Dette gjelder for risikoforhold som følge av byggherrens og de prosjekterendes "valg".

Spesifikke tiltak beskrives i SHA-planen for arbeidsoperasjoner med uakseptabelt risikonivå som ikke kunne elimineres eller reduseres gjennom planlegging, prosjektering eller valg av løsninger og som ikke ivaretas i spesifikke forskriftskrav, arbeidsinstrukser og sikkerhetsbestemmelser for prosjektet.

Hovedentreprenør har i tillegg til å følge SHA plan, ansvar for å gjøre risikovurderinger for arbeidsoperasjoner de skal gjennomføre, samt følge opp at eventuelle underentreprenører også gjennomfører og dokumenterer dette for sine arbeidere.

Nr.	Arbeid som kan innebære fare for liv og helse (BHF §8)	Ja/Nei	Spesifikke tiltak	Kommentarer
1	Arbeid på steder med passerende trafikk	Ja	- Arbeidsvarslingsplan med skiltplan skal utarbeides i henhold til Statens vegvesens håndbok N301. - Gang-, sykkel- og skolevei samt bussholdeplass skal sikres eller omlegges ved behov. Omlegging av bussholdeplass avklares med veimyndighet og kollektivoperatør - Anleggsområdet skal avgrenses med minimum 2 m ytterligere sikring. - Ryggevaktt skal benyttes ved behov ved rygging. - Kryssing mellom anleggstrafikk og myke trafikanter skal begrenses mest mulig. - Inn- og utkjøringer skal være oversiktlige, og synlighetstøy klasse 3 skal benyttes. - Ved endringer i trafikkmønster skal kollektivselskap og relevante myndigheter varsles.	Særlig risiko på grunn av bussholdeplass, gangvei og nærhet til RV19.
2	Arbeid nær installasjoner i grunnen (Kabler, VA-ledninger, mv.)	Ja	- Gravemelding og kabelpåvisning skal innhentes før gravearbeider starter. - Eksisterende kabel- og ledningsinformasjon skal kontrolleres, og påviste installasjoner skal merkes i terrenget. - Graving nær eksisterende installasjoner skal utføres forsiktig og i henhold til ledningseiers krav. Håndgraving benyttes ved behov. - Avvik eller ukjente installasjoner skal avklares før arbeidet fortsetter	Fare for skade på eksisterende infrastruktur, avbrudd i strøm-, VA- eller andre tjenester.



3	Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner (Luftledninger og kabler i grunnen)	Ja	- Netteier skal kontaktes før arbeid nært høyspentanlegg. Høyspentanleggets plassering og sikkerhetsavstander skal gjennomgås og være kjent for alle involverte. - Arbeidet skal planlegges og utføres i samråd med netteier og i henhold til gjeldende sikkerhetsavstander og prosedyrer. - Leder for sikkerhet (LFS) og tilstedeværelse fra ledningseier avtales ved behov. - Maskiner og arbeidsutstyr skal tilpasses eksisterende luftlinjer dersom disse ikke kan flyttes.	Fare for strømgjennomgang, lysbue og dødsulykke.
4	Montering/ demontering av tunge elementer	Ja	- Løfteplan skal utarbeides ved behov. - Kun sertifisert og kontrollert løfteutstyr skal benyttes. - Løfteområdet skal ha tilstrekkelig oppstillingsplass, sperres av, og ingen skal oppholde seg under hengende last. - Løfteoperasjoner skal utføres av minimum to personer med god kommunikasjon mellom anhuker og kranfører.	Gjelder blant annet montering av pumper, ventiler, rør og prefabrikkerte betongelementer
5	Arbeid i kummer og pumpeump	Ja	- Oksygen- og gassmåling skal utføres før nedstigning og under arbeidet ved behov. - Minimum to personer skal være til stede, med sikkerhetsvakt utenfor. - Adkomst, rømnings- og redningsmuligheter skal være avklart før nedstigning. - Redningssele, livline og nødvendig redningsutstyr skal være tilgjengelig. - Redningsberedskap og alarmrutiner skal være avklart før arbeidet starter.	-
6	Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner	Ja	- Planlegge støv- og støyreducerende tiltak. - Veileder for støy T1442 skal følges - Gassmåler ved arbeid i kummer og pumpeump. - Vibrasjonseksponering begrenses.	-
7	Arbeid hvor personer kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme	Ja	- Geoteknisk vurderingsnotat skal gjennomgås før oppstart og følges under utførelsen. - Gravearbeid skal utføres i henhold til gjeldende veiledning for sikkert grøftarbeid. RVO sin veileder for grøftarbeid - Anleggsområdet skal sikres med minimum 2 m byggegjerde ved behov.	- Kvikkleire fra 2-3,5m. - Graving 0,5 m
8	Arbeid som medfører fare for drukning	Ja	- Arbeid ved åpne pumpeumper skal sikres mot fall. - Minst to personer skal være til stede ved arbeid med fare for drukning.	Fare ved åpne luker og pumpeump.



			- Redningsutstyr skal være lett tilgjengelig. - Ved arbeid i kummer gjelder også kravene under «Arbeid i kummer» (gassmåling, sikkerhetsvakt, fallsikring mv.), se pkt. 5 og 7	
9	Arbeid som innebærer fare for fall fra høyde eller fallende gjenstander	Ja	- Arbeid i høyden skal planlegges og risikovurderes før oppstart. - Arbeid over 2 meter skal utføres i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17. - Kollektive sikringstiltak (rekkverk, stillas, arbeidsplattform eller lift) skal benyttes der det er mulig. Fallsikringsutstyr brukes når kollektiv sikring ikke kan etableres. - Åpninger og nivåforskjeller skal sikres mot fall. - Området skal avspærres ved fare for fallende gjenstander, og ingen skal oppholde seg under hengende last.	Omfatter arbeid i høyden og løfteoperasjoner. Påkrevd personlig verneutstyr skal benyttes i henhold til entreprenørens risikovurdering.
10	Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer	Ja	- Nødvendig vaksinerings skal vurderes for personell som kan eksponeres for avløpsvann. - Gode håndhygienerutiner og tilgang til håndvask/vaskefasiliteter skal etableres.	Risiko for kontakt med avløpsvann og biologiske smittestoffer.
11	Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare	Ja	- Brennbart materiale fjernes før oppstart. - Tilgjengelig slukkeutstyr - Varme arbeider skal utføres av personell med gyldig sertifikat og etter etablerte rutiner.	Kan være aktuelt ved sveising og kutting.
12	Arbeid som innebærer helsemessige ergonomiske belastninger	Ja	- Mekaniske løftehjelpemidler skal benyttes der det er mulig. - Arbeidet skal planlegges for å redusere tunge manuelle løft og ensidige belastninger. - Tunge løft skal utføres av minst to personer dersom tekniske hjelpemidler ikke kan benytte	Tunge konstruksjoner/pumper
13	Trykktesting av rør	Ja	- Trykktestingen av ny rør skal utføres av mannskap med ADK og dokumentert opplæring - Det må utarbeides prosedyre knyttet til trykktesting - Kontroll at muttere og låsemekanismer er stengt - Ikke oppholde seg i kummer ved trykktesting	
14	Arbeid nær europavei (E6)	Ja	- Arbeid skal planlegges i samråd med Statens vegvesen. - Nødvendige tillatelser og arbeidsvarsling skal være på plass før oppstart. - Arbeidet skal utføres slik at vegens stabilitet ikke svekkes. Se pkt. 1 for trafikk.	Fare for setninger i veggrunn.



15	Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner	Ja	- Før riving skal det avklares om eksisterende vegg er bærende. - Rivingsarbeid skal planlegges og utføres iht. prosjekterendes anvisninger. - Midlertidig avstivning etableres dersom nødvendig. - Fareområde skal sperres av.	En av eksisterende hovedvegger i pumpestasjonen skal rives som del av ombyggingen.
16	Arbeid som medfører bruk av sprengstoff	Nei	-	Ikke aktuelt.
17	Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler	Nei	-	Ikke aktuelt.
18	Arbeid i senkekasser der luften er komprimert	Nei	-	Ikke aktuelt.
19	Arbeid med dykkerutstyr	Nei	-	Ikke aktuelt.
20	Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner	Nei	-	Ikke aktuelt.

For detaljert risikovurdering se vedlegg 1

5. Rutine for behandling av endringer og oppdatering av SHA-planen (BHF§ 8d)

- Behov for endringer eller avvik fra SHA-planen skal umiddelbart meldes til KU.
- KU registrerer og følger opp innmeldte endringer og avvik i byggherrens avvikssystem.
- Nødvendige tiltak beslutes av byggherren v/prosjektleder eller byggeleder i samråd med KU og de utførende.
- Endringer, tiltak og relevante avvik informeres til berørte parter i henhold til SHA-planens distribusjonsliste.
- SHA-planen oppdateres av ansvarlig person hos byggherren.
- Avvik gjennomgås i SHA-møter for å avklare årsak og forebygge gjentakelse.
- Alvorlige ulykker og avvik skal varsles umiddelbart til KU og byggherre.

Rutinene for endring og oppdatering av SHA-plan forutsetter at alle virksomheter på byggeplass har et fungerende internkontrollsystem med tilpasninger til prosjektets SHA-plan. Som del av internkontrollsystemet skal alle ha rutiner for oppfølging av avvik.

6. Vedlegg

Vedlegg 1 Risikovurdering

Vedlegg 2 Fremdriftsplan

Vedlegg 3 Varslingsplan



Vedlegg 1

RISIKOVURDERING

Beskrivelse og metodikk

Risikovurderingen har tatt utgangspunkt i BHF §8c og de 17 punktene med eksempler på arbeid som kan innebære fare for liv og helse. I tillegg er det lagt til punkter som er relevante for dette prosjektet.

Risikoen er regnet ut slik: Risiko = sannsynlighet x konsekvens.

Vurderingskriteriene for risiko kommer frem av risikomatrisen samt tabellen nedenfor.

Se vedlegg 2 risikovurdering.

Sannsynlighet (hvor ofte hendelsen kan oppstå):

5: 0 – 14 dager

4: 14 dager – 6 måneder

3: 6 måneder – 1 år

2: 1 år – 5 år

1: > 5 år

Konsekvens for person:

1: Personskade uten fravær

2: Personskade med fravær

3: Alvorlig personskade med fravær

4: Varig men

5: Dødsfall

Risikomatrise:

	Konsekvens (R)				
	1	2	3	4	5
Sannsynlighet (S)	5				
	4				
	3				
	2				
	1				

Vurderingskriterier:

Høy risiko	Det må gjøres tiltak for å redusere risiko. Både forebyggende og kosekvensreduserende tiltak skal vurderes.
Middels risiko	Det bør gjøres tiltak for å redusere risiko. Både forebyggende og kosekvensreduserende tiltak bør vurderes.
Lav risiko	Ytterligere tiltak ikke vurdert nødvendig. Nødvendig verneutstyr må benyttes som forutsatt, og alle bestemte tiltak må gjennomføres / følges.



Risikokartlegging (S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risikotall)

Risikoanalyse for: Ombygging av pumpestasjon PA 257 E6				
Risikoforhold og arbeidsoperasjoner	S	K	R	
			Høy	
			Middels	
			Lav	
Arbeid på steder med passerende trafikk, Bussholdeplass og gangvei	3	5		15
Arbeid nær installasjoner i grunnen	3	2		6
Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner (Luftledninger og kabler i grunnen)	3	5		15
Arbeid med montering eller demontering av tunge elementer- Store pumper	2	5		10
Arbeid i kummer og pumpesump	2	5		5
Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner	2	3		6
Arbeid hvor personer kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme	3	3		9
Arbeid som medfører fare for drukning	2	5		10
Arbeid som innebærer fare for fall fra høyde eller fallende gjenstander	2	5		10
Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll	3	3		9
Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare	1	5		5
Arbeid som innebærer helsemessige ergonomiske belastninger	3	3		9
Trykktesting av rør	3	3		9
Arbeid nær europavei (E6)	1	5		5
Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner	2	5		10



Detaljert risikovurdering og tiltak (S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risikotall)

Nr	Arbeid/aktivitet	Uønsket hendelse som kan eller har oppstått	S	K	R	Spesifikke tiltak	Ansvar
1	Arbeid på steder med passerende trafikk, Bussholdeplass og gangvei	- Fare for skade på 3. person og kollisjon mellom 3. person og anleggstrafikk, evt øvrig trafikk - Fare for 3. person inn på anleggsområdet - Rygging med anleggsmaskiner	3	5	15	- Det må utarbeides arbeidsvarslingsplan, inkludert skiltplan, som viser gangveier. - Benyttes ryggevakt og utøve forsiktighet ved kjøring ved av/på kjøring Rv19. - Krav til synlighetstøy kl.3. - 2-meter byggegjerder skal benyttes.	UTF UTF UTF UTF
2	Arbeid nær installasjoner i grunnen	- Skade på eksisterende ledningsnett og kabler i grunnen	3	2	6	- Kabelpåvisning før oppstart av gravearbeider. - Gravemelding. - Lokalisere kabler og kabelkart.	UTF UTF PRO
3	Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner (Luftledninger og kabler i grunnen)	- Fare for strømgjennomgang og strømgjennomslag - Overgraving av strømførende kabel	3	5	15	- Netteier skal kontaktes før det graves nær høyspent. - Rutiner og prosedyrer innenfor sikkerhetsområdet (30m) for høyspent luftledninger gitt av netteier skal følges. - Leder for sikkerhet avtales med netteier.	UTF UTF UTF
4	Arbeid med montering eller demontering av tunge elementer-Store pumper	- Klemfare ved håndtering av tunge elementer eller maskiner - Fare for fallende gjenstander/last	2	5	10	- Det må lages tilstrekkelig stor oppstillingsplass til utstyr og arbeidssone. - Det skal alltid være minst 2 personer ved denne arbeidsoperasjonen. - Ingen skal oppholde seg nede i grøft eller i området der tungt utstyr løftes inn. - Området skal avspærres slik at andre arbeider ikke skjer under tungeløft i samme område. - Se også pkt 10.	UTF UTF UTF UTF UTF
5	Arbeid i kummer og pumpeump	- Fall ned i kum/pumpeump. - Eksponering for farlige gasser - Oksygenmangel	2	5	5	- Arbeid i kum/pumpeump skal planlegges og risikovurderes. - Minst to personer skal være til stede. - Gassmåling skal utføres før og under arbeid. - Nødvendig fallsikring, sele og livline skal benyttes. - Sikkerhetsvakt skal være tilgjengelig ved behov	UTF UTF UTF UTF UTF
6	Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner	- Fare for gas, støy og støv eksponering	2	3	6	- Planlegge bruk av støv- og støyreducerende utstyr. - Veileder for støv T1442 skal følges - Gassmåler må være tilgjengelig.	UTF UTF UTF
7	Arbeid hvor personer kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme	- Fare for utrasing av grøfteskråning i løsmasser - Personell eller 3-part faller i grøft	3	3	3	- Geotekniske vurderingsnotat skal gjennomgås før oppstart. - Grøfter skal sikres med tette gjerd, 2 meter høye - Gravearbeidene skal utføres i tråd med RVO sin veileder for grøftarbeid	UTF UTF UTF



8	Arbeid som medfører fare for drukning	- Fall til pumpesump	2	5	10	- Fallsikring - Se pkt 7	UTF
9	Arbeid som innebærer fare for fall fra høyde eller fallende gjenstander	- Skade på personer eller utstyr - Fare for fallende gjenstander ved svikt eller feil anhuking av utstyr - Fare for fall med manglende sikring av grøft og grop - Fare for fall ved sjekk av utstyr	2	5	10	- Ingen skal oppholde seg under hengende last. - Anleggsområder skal sikres med forsvarlige gjerder (2 meter høye) - Personlig verneutstyr (blant annet hjelm, vernesko, synbarhetstøy klasse 3) i hht til - Entreprenørens risikovurdering skal benyttes	UTF UTF UTF UTF
10	Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll	- Eksponering for biologisk materiale	3	3	9	- Krav til vaksinasjon - Tilgang på vaskefasiliteter på anleggsområdet	UTF UTF
11	Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare	- Fare for antennelse av materiell - Fare i forbindelse med spregning	1	5	5	- Brennbart materiale fjernes før oppstart. - Tilgjengelig slukkeutstyr.	UTF UTF
12	Arbeid som innebærer helsemessige ergonomiske belastninger	- Muskel og skjelett plager	3	3	9	- Bruk egnet løfteutstyr ved behov. - Organiser arbeidet slik at arbeidstakerne unngår tidspress og monotont arbeid.	UTF UTF
13	Trykktesting av rør	- Skade på personell - Lekkasje på ledningsnett	3	3	9	- Trykktestingen av ny rør skal utføres av mannskap med ADK og dokumentert opplæring - Det må utarbeides prosedyre knyttet til trykktesting - Kontroll at muttere og låsemekanismer er stengt - Ikke oppholde seg i kummer ved trykktesting	UTF UTF UTF UTF
14	Arbeid nær europavei (E6)	- Fare for setninger i veggrunn	1	5	5	- Konsultere og innhente tillatelser fra Statens vegvesen	BH
15	Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner	- Ukontrollert kollaps - Fallende konstruksjonsdeler - Personskade under rivning	2	5	10	- Rivning skal planlegges og risikovurderes før oppstart. - Bærende konstruksjoner skal kartlegges. - Området skal sikres under rivningsarbeid. - Riktig verneutstyr skal benyttes.	UTF UTF UTF UTF



Vedlegg 2

Fremdriftsplan, nr.:

Prosjekt: 500323 – P257 E6

Aktivitet	Uke nr.																					

Dato: _____

Signatur: _____



Vedlegg 3

Varslingsplan

Prosjekt: 500323 P257 E6 Oppgradering av pumpestasjon

Adresse: Ved Mosseporten

Vedkommende som først får kjennskap til en ulykke/nestenulykke

1. Varsle/gi førstehjelp
2. Sikre skadestedet
3. Begrens omfanget

Lege / Ambulanse	113	
Politi	112	
Brann/ forurensing	110	
Nasjonalt nr. for legevakt	116 117	

Hovedbedrift:
Navn:
Tlf:

Arbeidstilsynet 73 19 97 00

DSB 33 41 25 00
v/Sprengningsulykker
v/EL-ulykker med personskade

Giftinformasjonen 22 59 13 00

Ved alvorlig miljøutslipp
Brannvesen 110

Byggherre

Prosjektleder: MK Prosjekt og anlegg
Navn: Hedyeh Salamatravandi
Tlf.: 401 77 888

Dersom PL ikke svarer

Stedfortreder:

1. avdelingsleder prosjekt og utvikling:
Honar Ahmed Said
Mobil: 909 55 940
2. enhetsleder Kommunalteknikk:
Frank Syversen
Mobil: 909 53 563

Koordinator for utførelsen (KU)
Navn:
Tlf.:

Alvorlige nestenulykke	Når du varsler, oppgi følgende	Uttalelser til pressen
• Ulykker og alvorlig nestenulykke som kunne ha medført skade eller dødsfall skal varsles	• HVEM som ringer • HVA som har hendt • HVOR det har hendt • Om noen /noe er skadet – alvorlighetsgrad, skadens art og omfang, antall som er skadet, om noen er innesperret eller fastklemt. • Opplys om oppmøteplass / port / sted for nødetater.	• Det er kun avdelingsleder prosjekt og utvikling, enhetsleder Kommunalteknikk eller direktør PMT som kan gjøre uttalelser til pressen.

Oppdatert dato: 16.07.2026
