


Prosjektplan (framdrift og rigg) mht ombygning Gol Kommunehus – 1. etg NAV/Tjenestetorg

18. August 2026

NAV/Tjenestetorg – Høst 2026

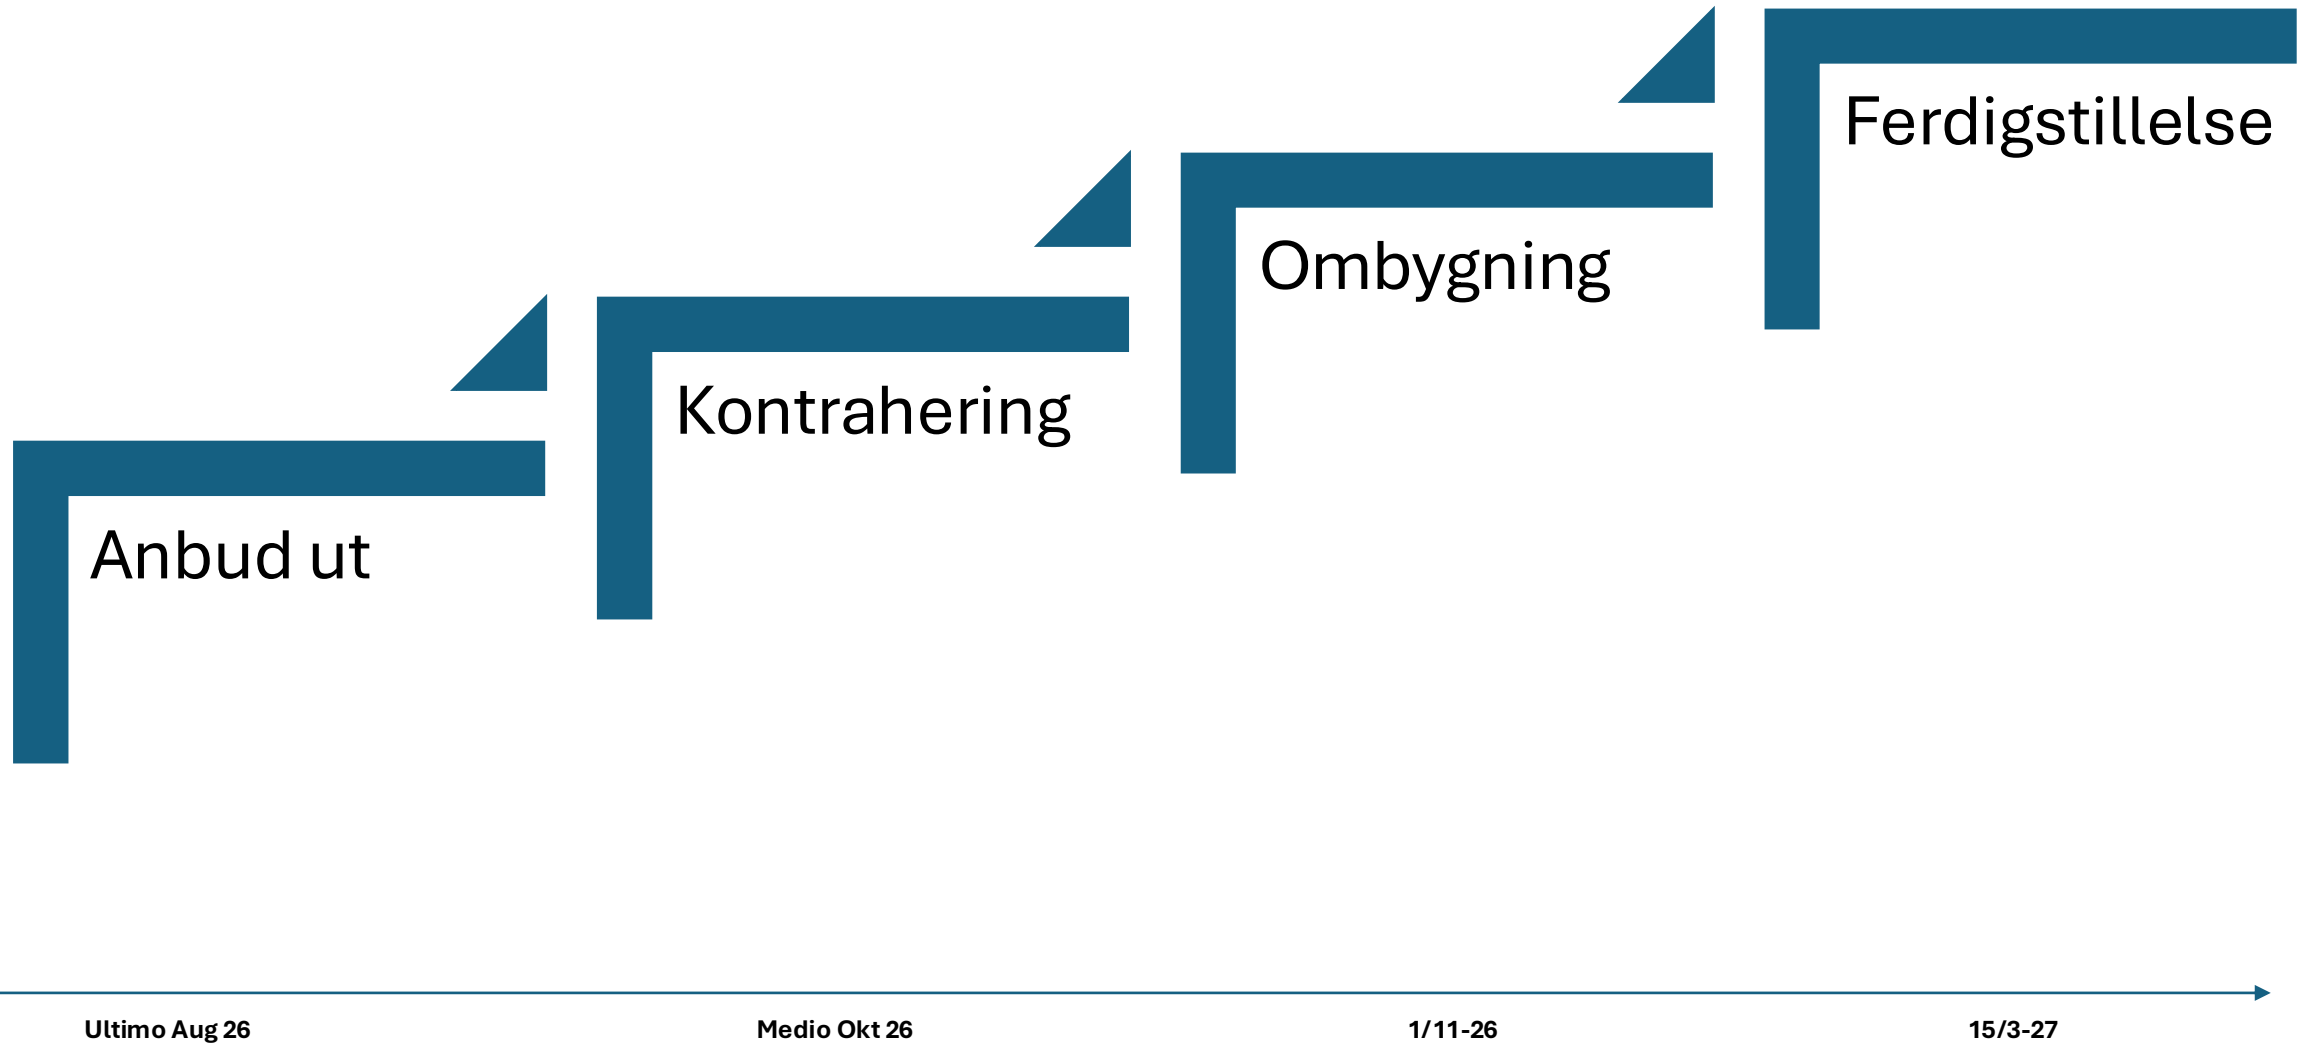

Initiell framdriftsplan i bygget

- A: Østre fløy (Integr tj&kultur)
- B: Servicetorg & møterom
- C: Vestre fløy (helseadmin.)


A: Starte med rød ring (A):

- Ferdigstille østre fløy klart til kontorbruk først
- Ferdigstille ny resepsjonsløsning før arbeider i B

B og C: Kan starte arbeider i både B og C parallelt når A er ferdig



Soneinndelt framdrift

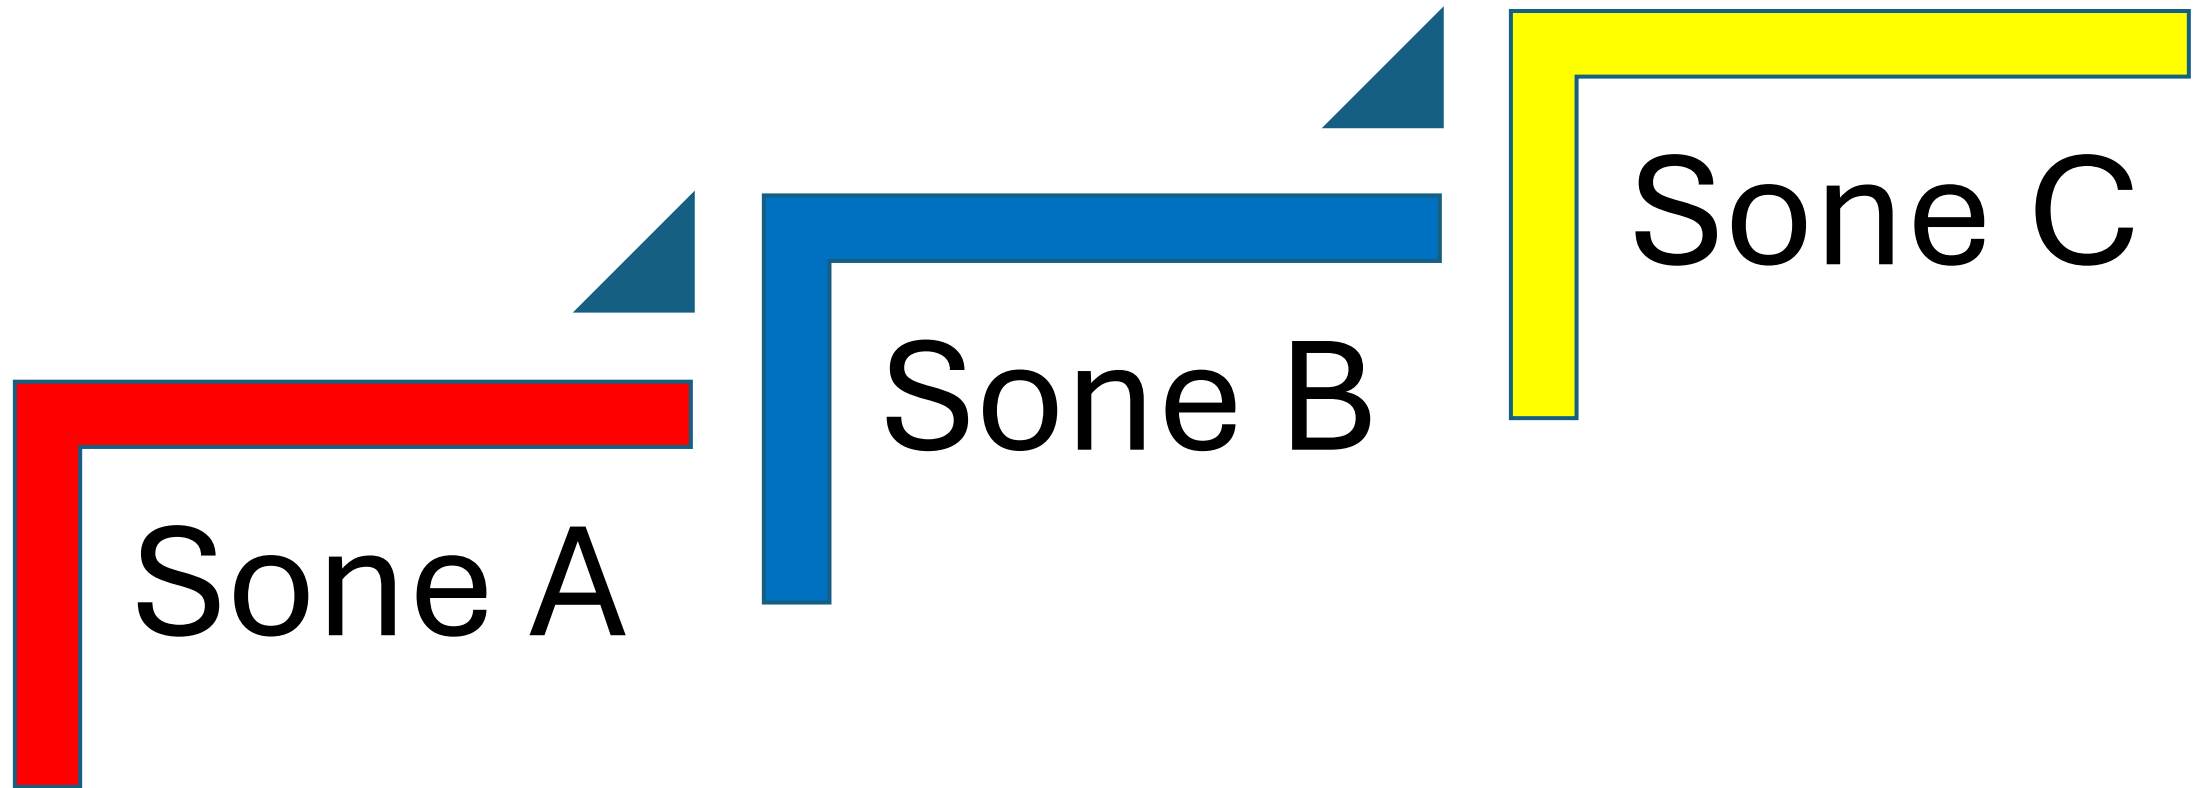

1/11-26 til 31/1-27

31/1-27

til

15/3-27

Riggplan



Sekundær riggplass



Primært riggområde



Parkering TE

