

## **D2-ID3700-31 Hjelviktunnelen**

Henvisning: Kap. D1 prosess 37

### **Innhold**

Oppgaver  
Generell informasjon  
Spesiell informasjon  
Tunnelutstyr  
Definisjoner  
Tunnelhvelv/tunnelkledning

Oppgaver	Frekvens	Arbeidstid	Trafikkregulering Arbeidsvarsling	Merknad
Renhold hel	2 stk. pr. år. Utføres i mai og oktober.	21.00–06.00 Mellom søndag kveld og fredag morgen	Trafikkavvikling skal utføres iht. Hb. N301 "Arbeid på og ved veg" og NA-rundskriv 2015/12 med bruk av trafikkdirigenter og ledebil.  Det må foreligge godkjent arbeidsvarslingsplan.	
Renhold halv	2 stk. pr. år. Utføres i januar og mars.			
Renhold teknisk	4 stk. pr. år. Utføres i februar, april, august og desember.			

Generell informasjon	Data	Merknad
Type tunnel	Berg	
Vegsystemreferanse	EV136 K S4D1 m6843	
Trafikk (ÅDT)	2380	
Tunnellengde (m)	340	
Antall tunnellop	1	
Antall kjørefelt (angis for hvert løp)	Tunnellop 1: 2	
Tunnelprofil/tverrsnitt	T8,5	
Stigning (%)	IA	
Høydebegrensning	4,3m	
Nisjer	Nei	
Tverrforbindelser	Nei	
Tekniske bygg	Nei	

Spesiell informasjon	Data	Merknad
Tunnelportal	Betong	
Tunnelkledning <sup>1)</sup> Se vedlegg som viser oversikt over kledning i tunnelen.		
Betongkant: Lengde (m)	Nei	
Vegbane: Bredde (m)	6,3	
Skulder/bankett: Bredde (m)	Ca. 1 totalt	
Nisjer/tverrforbindelser:	Nei	
Kum/sandfang (antall)	3	
Oljeavskiller	Nei	
Sedimentasjonsbasseng	Nei	
Tilgang på vann i tunnel	Nei	
Annen informasjon	Nei	




---

1) Følgende betegnelser benyttes:

- Sprøytebetong
- Tunnelduk
- PE-skum (utildekket)
- Betonghvelv
- Platehvelv
- Betongkant (føringskant av betong, 90 cm høy, NJ-profil e.a.)

Tunnelutstyr	Beskrivelse	Merknad
Belysningspunkt	17 stk.	
Ventilasjonssystem	Nei	
Måleutstyr	Nei	
Drens-/overvannssystem	Lukket	
Nødstasjoner (antall): Telefon (antall) Håndholdte brannslukkeapparater (antall)	0 0 0	
Brannvannreservoar	Nei	
Skiltpunkt (antall)	56	
Kabelbru	Ja	
Fremmedinstallasjoner med betydning for tunnelvask	Nei	

## Definisjoner

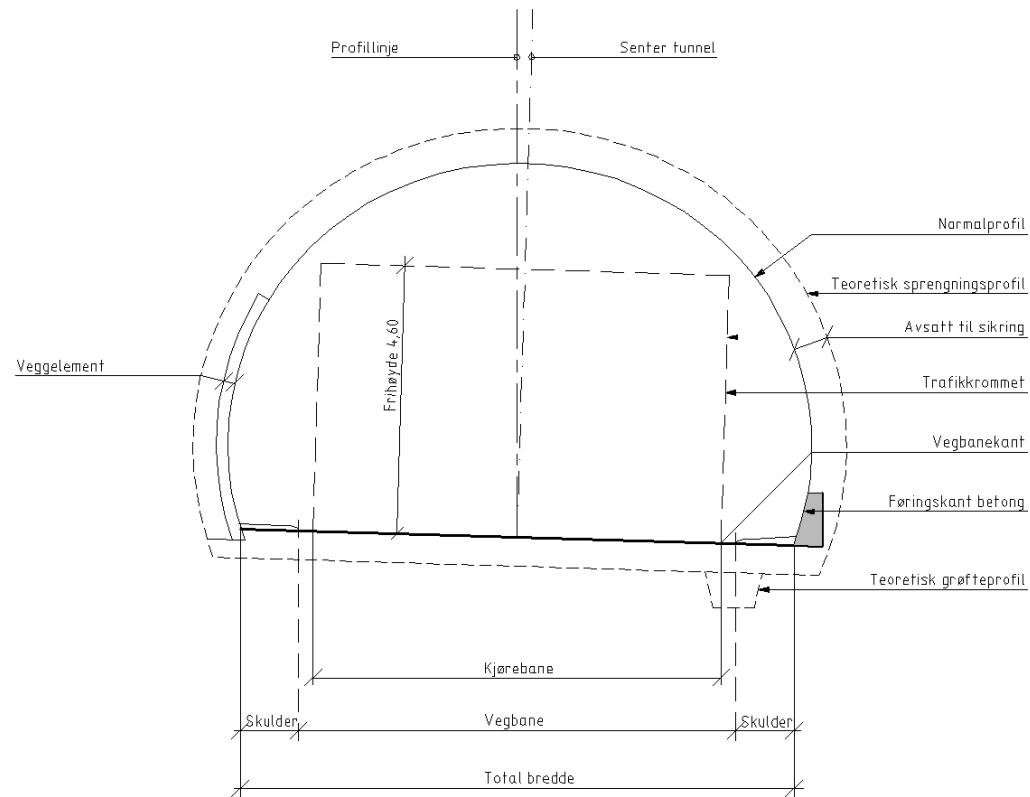

Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens vegvesen håndbok 021 Vegtunneler.

**Heng:** Taket i tunnelen

**Vederlag:** Overgang mellom vegg og tak (heng) i tunnelen

**Vegg:** Vegg regnes opp til høyde 4 meter (målt vertikalt fra vegbanen ved kantlinje) med mindre annet er definert i denne instruksen.

**Tunnelhvelv/tunnelkledning:**

Det er ikke registrert tunnelkledning.
