

D2-ID3700-18 Håggåtunnelen

Henvisning: Kap. D1 prosess 37

Innhold

Oppgaver
Generell informasjon
Spesiell informasjon
Tunnelutstyr
Definisjoner
Tunnelhvelv/tunnelkledning

Oppgaver	Frekvens	Arbeidstid	Trafikkregulering Arbeidsvarsling	Merknad
Renhold hel	1 stk. pr. år. Utføres i mai	22.00 – 06.00 Mellom søndag kveld og fredag morgen.	Trafikkavvikling skal utføres iht. Hb. N301 "Arbeid på og ved veg" og NA-rundskriv 2015/12 med bruk av trafikkdirigenter og ledebil. Det må foreligge godkjent arbeidsvarslingsplan	
Renhold halv	1 stk. pr. år. Utføres i oktober			

Generell informasjon	Data	Merknad
Vegsystemreferanse	EV6 K S69D1 m4415	
Trafikk (ÅDT)	7800	
Tunnellengde (m)	290	
Antall tunnellop	1	
Antall kjørefelt (angis for hvert løp)	2	
Tunnelprofil/tverrsnitt	T9,5	
Stigning (%)	1,4	
Høydebegrensning	4,6 m	
Nisjer	0	
Tverrforbindelser	0	
Tekniske bygg		


Spesiell informasjon	Data	Merknad
Tunnelportal	Betong	
Tunnelkledning ¹⁾ Se vedlegg som viser oversikt over kledning i tunnelen.	Sprøytebetong 2500 m ₂ Betonghvelv 1920 m ₂	6 cm
Tunnelduk: Type Leverandør	IA	
Betongkant: Lengde (m)	0	
Dekkebredde	7,75 m	
Skulder/bankett: Bredde (m)	2,5m	
Nisjer/tverrforbindelser:	Nei	
Kum/sandfang (antall)	6	
Sedimenteringsbasseng		
Oljeavskiller	Nei	
Tilgang på vann i tunnel	Nei	
Annen informasjon		

1) Følgende betegnelser benyttes:
Berg (bart berg)
Sprøytebetong

Tunnelduk
PE-skum (utildekket)
Betonghvelv
Platehvelv
Betongkant (føringskant av betong, 90 cm høy, NJ-profil e.a.)

Tunnelutstyr	Beskrivelse	Merknad
Belysningspunkt	198 stk. armaturer.	
Ventilasjonssystem	Nei	
Måleutstyr	Nei	
Drens-/overvannssystem	Lukket	
Nødstasjoner m/innhold:	0	
Brannvannreservoar	Nei	
Skiltpunkt	2 stk.	
Kabelbru	Ja	
Fremmedinstallasjoner med betydning for tunnelvask		

Definisjoner

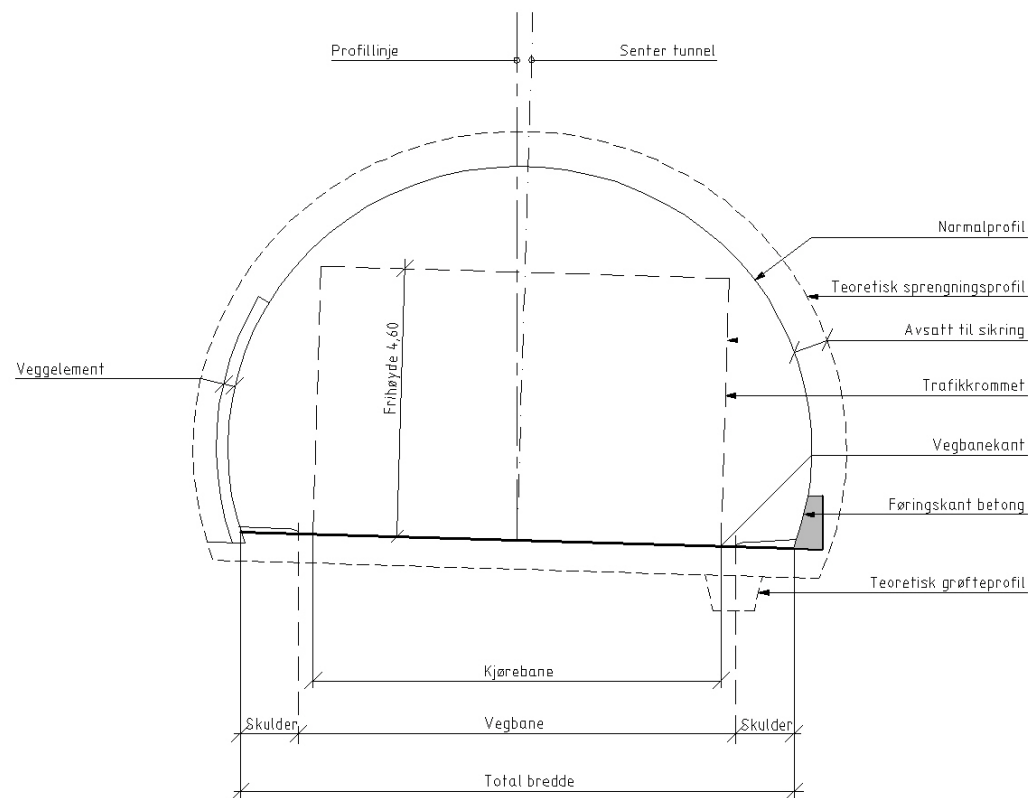

Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens vegvesen håndbok 021 Vegtunneler.

Heng: Taket i tunnelen

Vederlag: Overgang mellom vegg og tak (heng) i tunnelen

Vegg: Vegg regnes opp til høyde 4 meter der skillet mellom vegg og tak er uklart (målt vertikalt fra vegbanen ved kantlinje).

Tunnelhvelv/tunnelkledning:

Type	Areal	Sprøytebetong, tykkelse	Vegreferanse
Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum	2464	6 cm	5000 E6 hp 12 m 4276-4555
