RIVEPLAN 02

GENERELT:

Prosjektet har eit høgt fokus på gjenbruk og har fått innvilga støtte fra ENOVA på programmet «Planlegging og prosjektering for ombruk og fleksibilitet».
Prosjektet skal gjennomførasts i tråd med prosjektskildringa slik den vart beskrevet i søknaden og i tråd med dei kriteriene som er gitt fra ENOVA.

Entreprenør må stille med ekstra lagringsplass under byggetida, slik at det er mogeleg å lagre og systematisere byggkomponenter og vurdere gjenbruk i samarbeid med rådgivere

Rivearbeider må difor utførast aktsamt med tanke på å ikkje skade komponentar som kan gjenbrukast.

Byggkomopnentar som skal gjenbrukast delvis eller i sin heilhet er :

- ***Innvendige dører***
- ***Gulvbelegg Linoleum***
- ***Faste himlingar i toalettkjerner***
- ***Stålhimling.*** Original stålhimling i fellesareal/sosial sone romnr 0050 og Fellesareal romnr.1132 og 0008 skal bevares, samt stålhimling i Tilkoblingsareal 0104 og 1131

Bygningskomponenter som skal demonteres skånsomt og beholdes:

- ***Systemhimlingsplater***
- ***Veggabsorbenter***
- ***Bøkprofiler til takabsorbenter***
- ***Takabsorbenter***
- ***Kjøkkenskrog som skal flyttes***
- ***Skyvedører***
- ***Dører som demonteres for gjenbruk***
- ***Skap på sengerom***
- ***Garderobeskap***

For riving/gjenbruk av VVS komponentar, sjå RIV beskrivelse

Sjå eigne golvplanar for omfang av linoleum som skal behaldast/gjenbrukast
Sjå eigne riveplanar for golvoverflater

FASADER:

Fasadene etterisoleres fra innside vegg. All platekledning, lekter og vindsperre skiftast.
Alle vindauger, dører og glassfelt i yttervegg skal skiftast til nye.

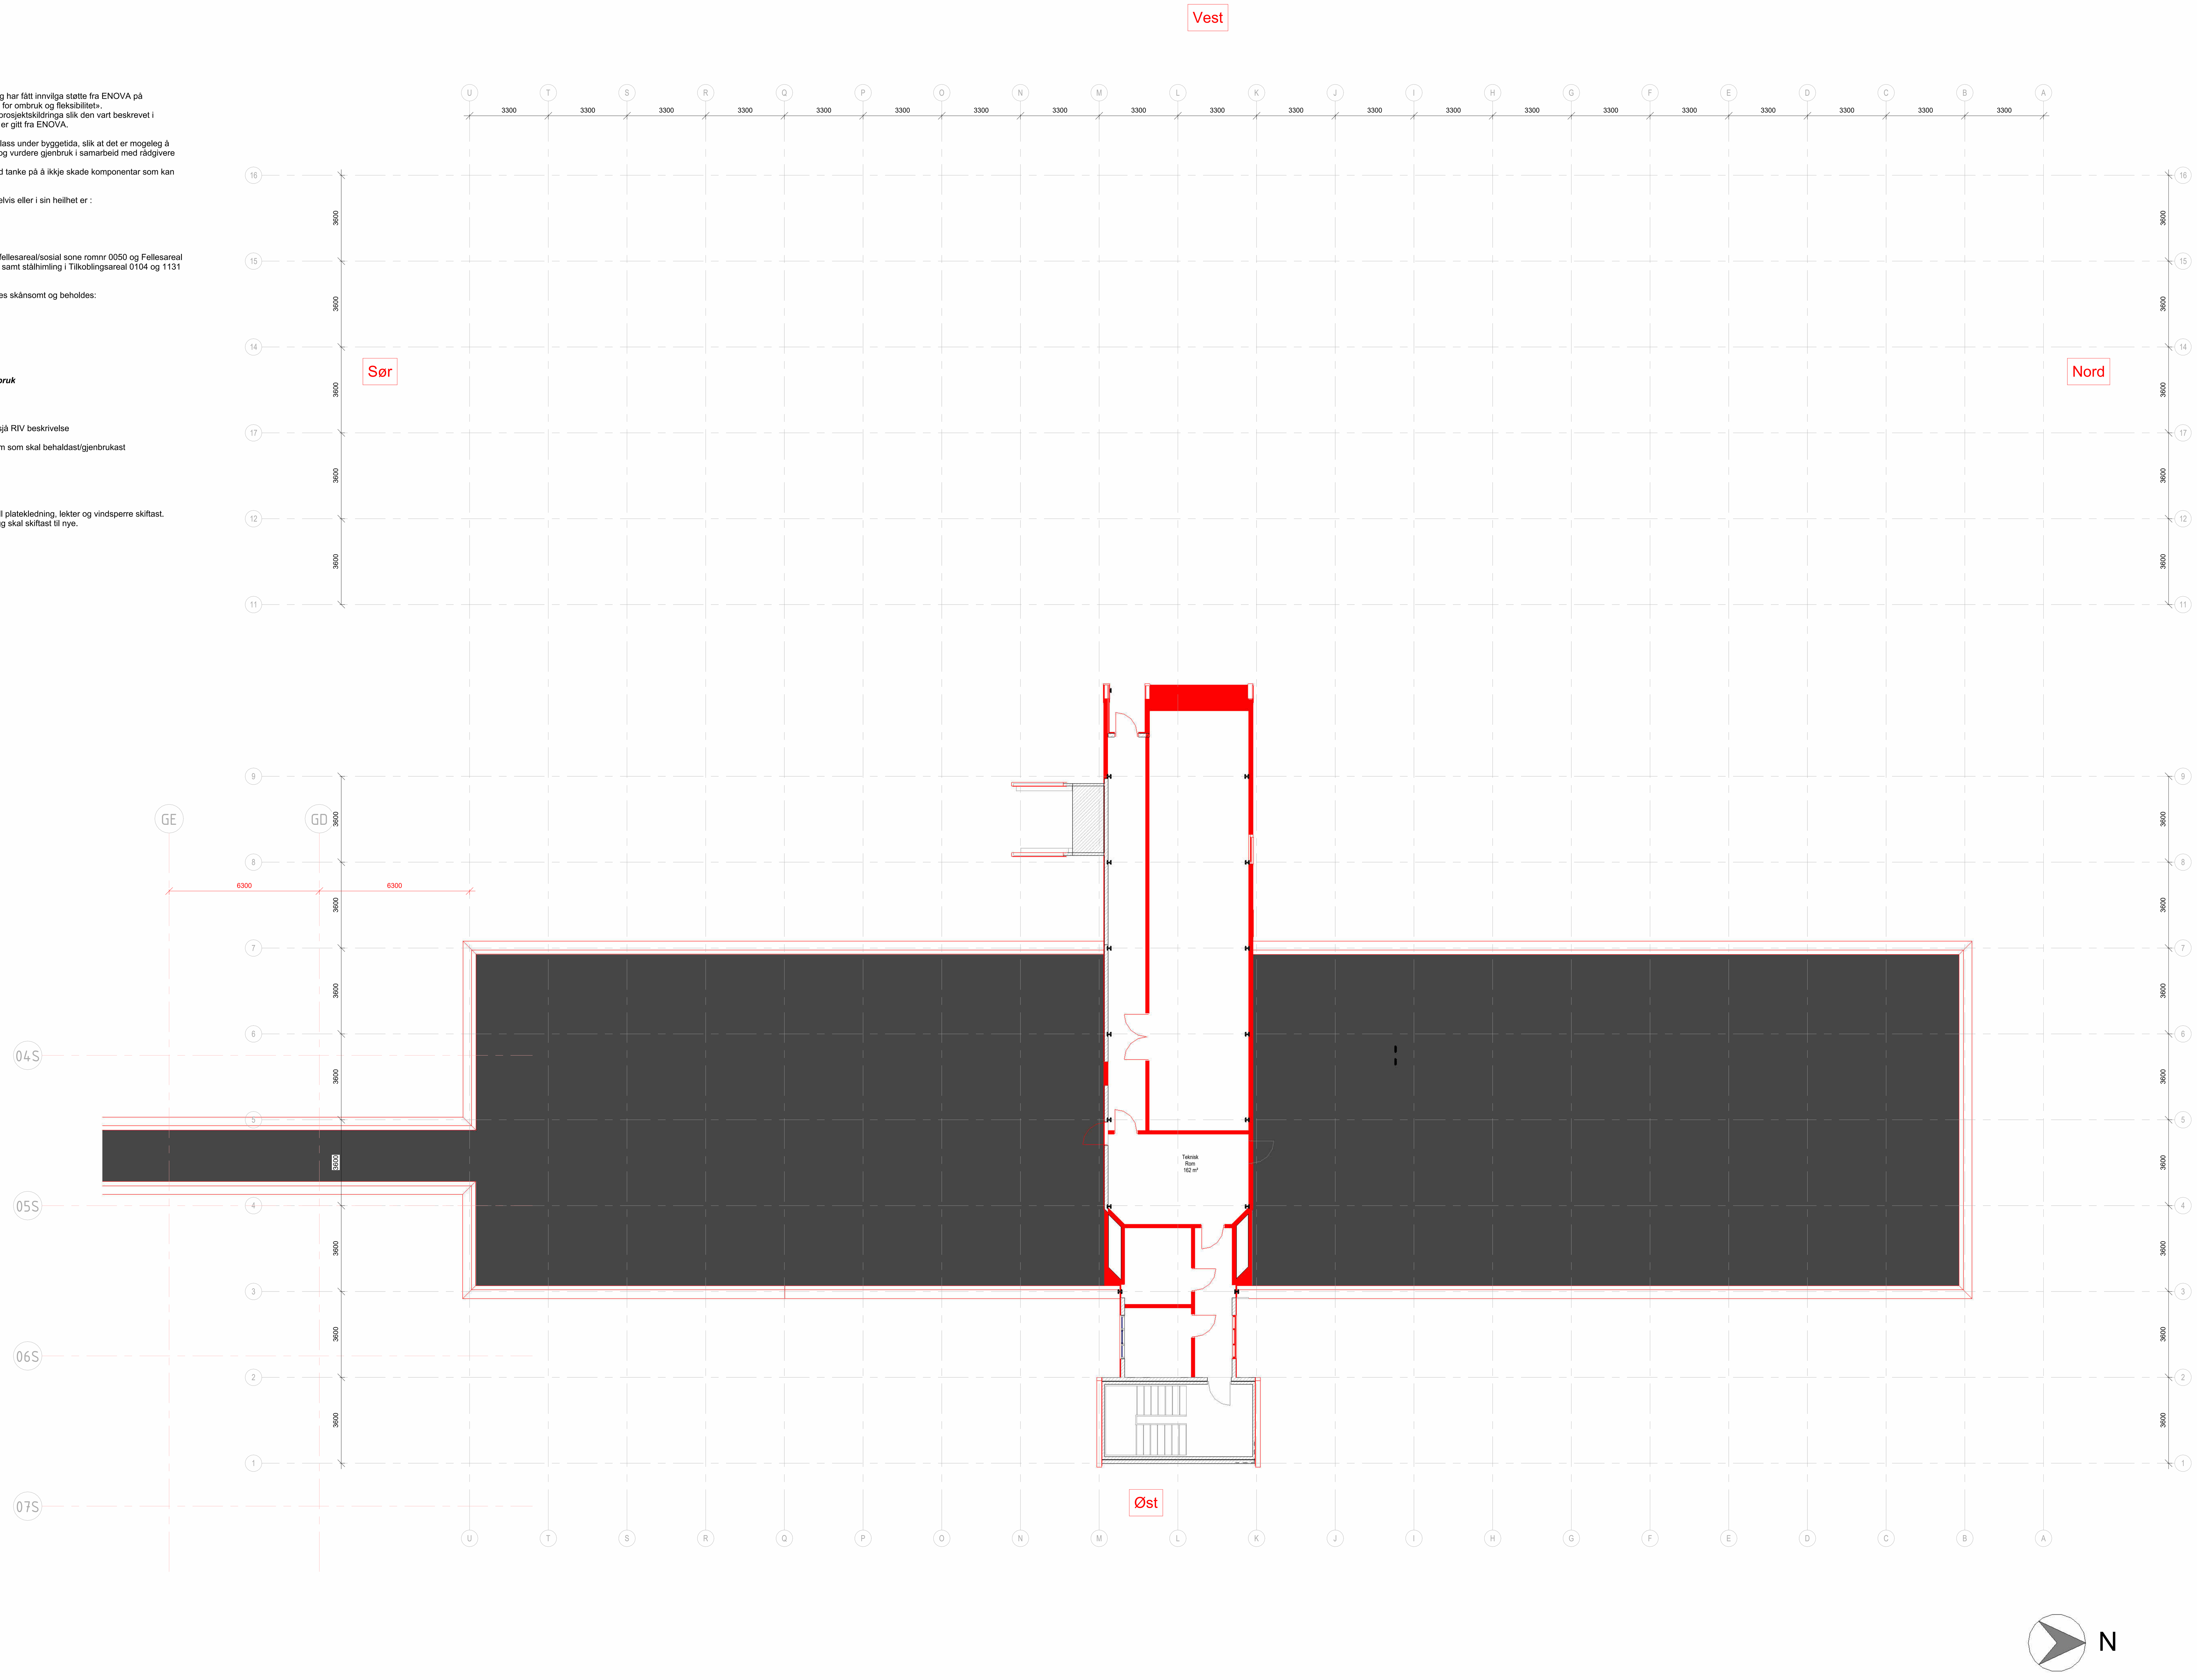

MERKNADER

SKAL RIVAST

EKSISTERANDE/GJENBRUK

HENVISNINGER

MÅLESTOKK	NUMMER	REV.
1 : 100	A-20-23-02-02-01	

REV.	DATO	RETTELSEN GJELDER	ANSV.	OR

Oversiktskart

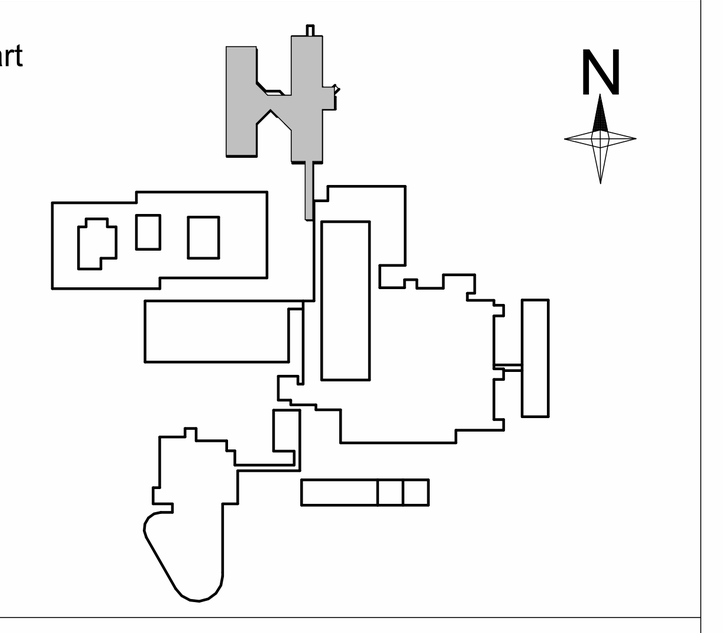

HELSE FØRDE

ARK	Origo Arkitektgruppe as C. Sundts gate 39, 5009 Bergen origo@origoark.no	ORIGO
RIB		
RIV		
RIE		

PROSJEKTNR	TEGNET AV	KONTROLLERT AV	ANSV.
2504	JMS	LR	
DATO	FASE		Original format
2026-05-21	ANBUDSUNDERLAG		A0

ANGABYGGET

Riveplan 02

MÅLESTOKK	NUMMER	REV.
1 : 100	A-20-23-02-02-01	F01
