ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter
1		Mottatt GO	0 dager	ti 14.10.25	ti 14.10.25	
2		**Konkurranse**	**284 dager?**	**ti 14.10.25**	**fr 13.11.26**	
3		Utarbeidelse av konkurransegrunnlag	190 dager	ti 14.10.25	ma 06.07.26	
4		Kunngjøring prekvalifisering	0 dager	ma 06.07.26	ma 06.07.26	3
5		Tilbudsfrist prekvalifisering	0 dager	fr 21.08.26	fr 21.08.26	4AS+34 dager
6		Evaluering prekvalifisering	3 dager	ma 24.08.26	on 26.08.26	5
7		Meddelelse prekvalifisering	0 dager	on 26.08.26	on 26.08.26	6
8		Regneperiode	36 dager	to 27.08.26	to 15.10.26	7
9		Tilbudsbefaring	0 dager	to 10.09.26	to 10.09.26	
10		Tilbudsfrist	0 dager	to 15.10.26	to 15.10.26	8
11		Evaluering	5 dager	fr 16.10.26	to 22.10.26	10
12		Meddelelse	0 dager	to 22.10.26	to 22.10.26	11
13		Karensperiode	10 dager	fr 23.10.26	to 05.11.26	12
14		Behandling av evt innsyn	5 dager	fr 06.11.26	to 12.11.26	13
15		Kontraktsignering	1 dag?	fr 13.11.26	fr 13.11.26	14
16		**Prosjekteringsfase og tomteforberedelse**	**164 dager**	**ti 15.09.26**	**fr 30.04.27**	**15**
23		Omlegging infrastruktur fase 1 (egen entreprise)	40 dager	ti 15.09.26	ma 09.11.26	
17		Oppstartssamling med totalentreprenør og UE'er	2 dager	ma 30.11.26	ti 01.12.26	15AS+10 dager
18		Detaljprosjektering	100 dager	on 02.12.26	ti 20.04.27	17
19		Fremleggelse av prosjektplaner iht kontrakt	0 dager	fr 11.12.26	fr 11.12.26	15AS+20 dager
24		Riving av smøre-og vaskehall (egen entreprise)	40 dager	ma 04.01.27	fr 26.02.27	
20		Utarbeidelse av brannkonsept	15 dager	ma 11.01.27	fr 29.01.27	15AS+40 dager
21		Byggesøknad/rammesøknad	5 dager	ma 01.02.27	fr 05.02.27	20
25		Omlegging infrastruktur fase 2 (egen entreprise)	50 dager	ma 01.02.27	fr 09.04.27	
22		Byggetillatelse	0 dager	fr 02.04.27	fr 02.04.27	21AS+40 dager
26		Levering av FDVU-dokumentasjon 10%	0 dager	fr 30.04.27	fr 30.04.27	15AS+120 dager
27		**Byggefase**	**468 dager**	**fr 16.04.27**	**on 31.01.29**	**22**
28		Igangsetting på byggeplass	0 dager	fr 16.04.27	fr 16.04.27	22AS+10 dager
29		Byggeperiode	378 dager	ma 19.04.27	on 27.09.28	28
31		Ferdigbefaringer	10 dager	to 28.09.28	on 11.10.28	29
32		Innredning	80 dager	to 12.10.28	on 31.01.29	31
33		Utbedring av feil og mangler	80 dager	to 12.10.28	on 31.01.29	31
30		Levering av FDVU-dokumentasjon komplett	0 dager	to 11.01.29	to 11.01.29	34AS-15 dager
34		Overtakelse av kontraktsarbeidet	0 dager	on 31.01.29	on 31.01.29	33
35		Overlevering til bruker	0 dager	on 31.01.29	on 31.01.29	34

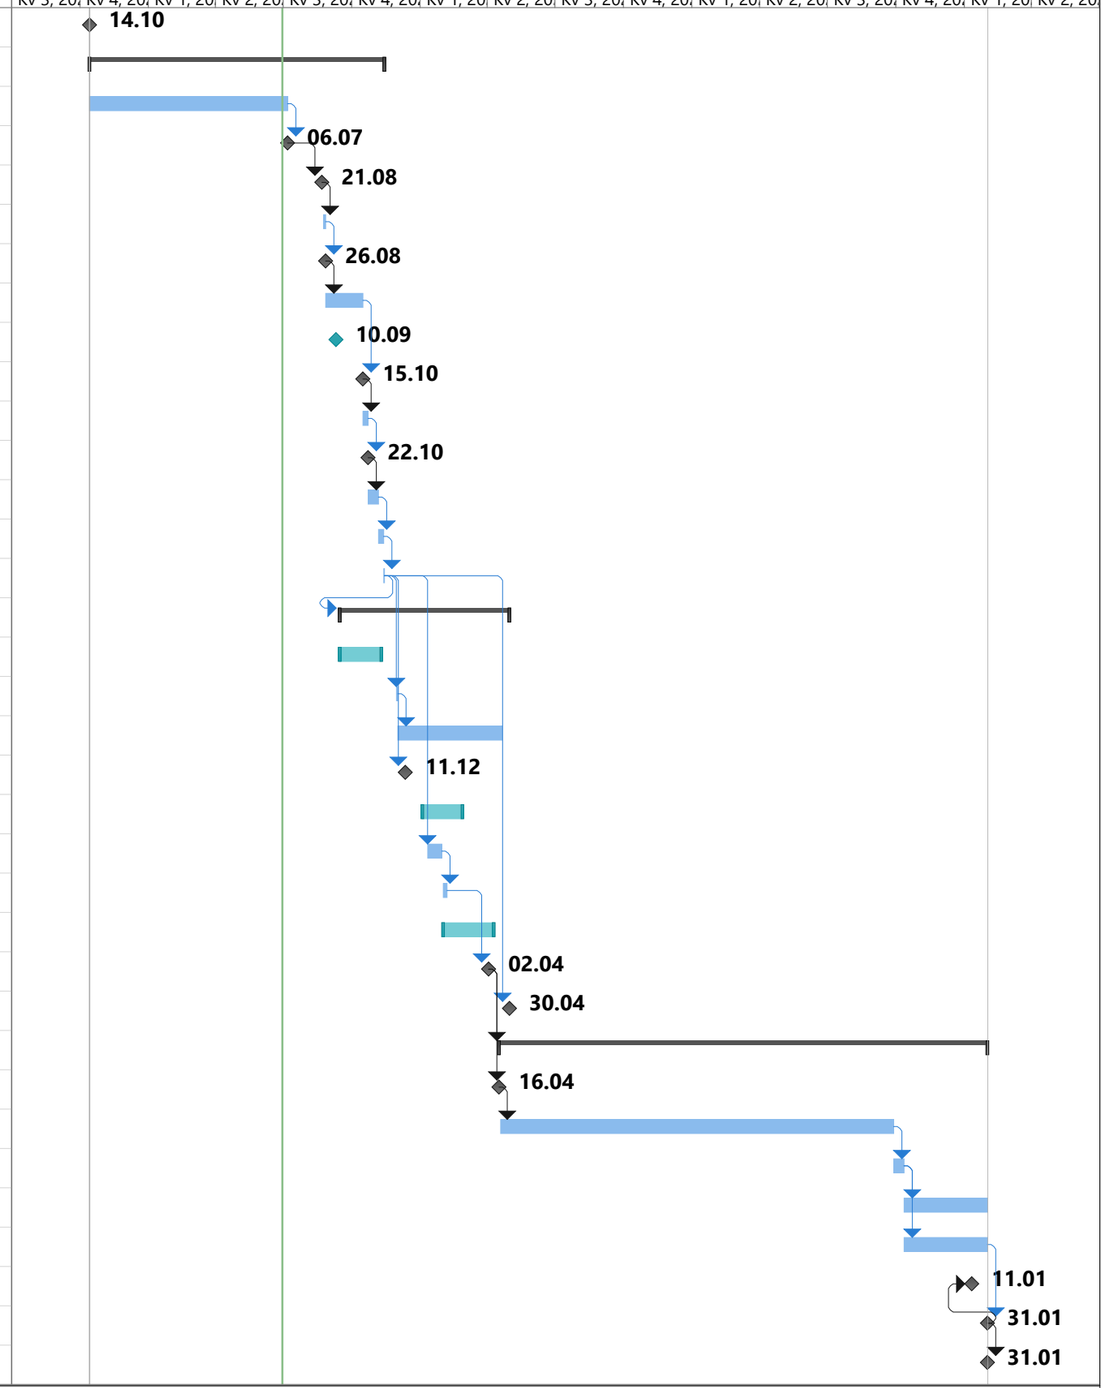

Prosjekt: Verksted og vedlikeho
Dato: ti 30.06.26

Aktivitet	Inaktiv aktivitet	Manuell sammendragsfremheving	Ekstern milepæl
Deling	Inaktiv milepæl	Manuelt sammendrag	Tidsfrist
Milepæl	Inaktivt sammendrag	Bare start	Fremdrift
Sammendrag	Manuell aktivitet	Bare slutt	Manuell fremdrift
Prosjektsammendrag	Bare varighet	Eksterne aktiviteter	
