Rapport

10260219-01 Ekro, Rusti og Eikevegen VA-anlegg

OPPDRAGSGIVER

Stord Vatn og Avløp AS

EMNE

SHA-plan Ekro, Rusti og Eikevegen VA-anlegg

DATO / REVISJON: 29. oktober 2026 / 03

DOKUMENTKODE: 10260219-01-SHA-RAP-001



Multiconsult

Dette dokumentet har blitt utarbeidet av Multiconsult på vegne av Multiconsult Norge AS eller selskapets klient. Klientens rettigheter til dokumentet er gitt i den aktuelle oppdragsavtalen eller ved anmodning. Tredjeparter har ingen rettigheter til bruk av dokumentet (eller deler av det) uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Multiconsult med mindre annet følger av norsk lov. Multiconsult påtar seg intet ansvar for bruk av dokumentet (eller deler av det) til andre formål, på andre måter eller av andre personer eller enheter enn det som er godkjent skriftlig av Multiconsult. Deler av dokumentet kan være beskyttet av immaterielle rettigheter og/eller eiendomsrettigheter. Kopiering, distribusjon, endring, behandling eller annen bruk av dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Multiconsult eller annen innehaver av slike rettigheter med mindre annet følger av norsk lov.

Rapport

OPPDRAG	10260219-01 Ekro, Rusti og Eikevegen VA-anlegg	DOKUMENTKODE	10260219-01-SHA-RAP-001
EMNE	SHA-plan Ekro, Rusti og Eikevegen VA-anlegg	TILGJENGELIGHET	
OPPDRAGSGIVER	Stord Vatn og Avløp AS	OPPDRAGSLEDER	Håkon Eskeland Børtveit
KONTAKTPERSON	Tarjei Limstrand	UTARBEIDET AV	Håkon Eskeland Børtveit/ Asbjørn Rafdal
KOORDINATER	Sone: 32 / Øst: 304774 / Nord: 6633467	ANSVARLIG ENHET	10233037 Seksjon VA Sørvest
GNR./BNR./SNR.	26 / 378 mfl. / / Stord		

SAMMENDRAG

Dette er en SHA-plan utarbeidet iht. krav i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser § 8 (Byggherreforskriften, BHF). Malen er tilpasset veilederen «SHA-plan. Veileder til utfylling av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø», utgitt i juni 2016.

SHA-planen skal ha fokus på risikovurderinger med beskrivelse av arbeider og tiltak som kan innebære fare for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser i det spesifikke prosjektet. BHF krever at prosjekterende allerede i prosjekteringsfasen gjennomfører risikovurdering med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggefasen. Resultatene fra denne skal innarbeides i SHA-planen.

03	29.10.2026	Revidert etter kommentar fra byggherre	HEB	AR	HEB
02	26.10.2026	Byggherrens representant og veglys (opsjon) lagt inn	HEB	AR	HEB
01	25.08.2026	Eikevegen og kabelgrøft Villavegen inkludert i SHA-plan	AR	JBO	HEB
00	10.12.2025	SHA-plan (KP)	HEB	JBO	HEB
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 Innleiing 5
1.1 Formålet med planen 5
1.2 Orientering om prosjektet 5
1.3 Definisjonar og forkortingar 6
1.4 Oppdatering og distribusjon av SHA-planen 6
1.5 Revisjonsoversikt 7
2 Organisasjon og entreprisemodell 8
3 Framdriftsplan 9
4 Risikovurdering og spesifikke tiltak 10
5 Rutinar for behandling av endringar og oppdateringar av SHA-planen 22

1 Innleiing

1.1 Formålet med planen

SHA-planen er utarbeida i samsvar til krava i § 8 i Forskrift om sikkerheit, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassar (byggherreforskrifta), og er byggherren sin overordna plan for styring av SHA-arbeidet i prosjektet.

Entreprenør skal planlegge utføring av bygge- og anleggsarbeida i samsvar til byggherrens SHA-plan, men plikter sjølv å vurdera risiko for forhald ved byggeplassen og informere byggherre om risikoforhold som ikkje er skildra i planen.

Byggherren sitt mål er at prosjektet gjennomførast utan skade på person eller miljø. For å oppnå dette, skal det leggast vekt på at byggeplassen blir planlagt, organisert og kontrollert i samsvar med regler og intensjonar i forskrift om sikkerheit, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassar (Byggherreforskrifta).

Krav og vilkår slik de framkjem i denne SHA-planen skal formidlast til alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen, på eit språk de forstår.

1.2 Orientering om prosjektet

Tabell 1-1 Informasjon om prosjektet

Byggeplassens namn	Ekro, Rusti og Eikevegen
Gnr./Bnr.	26 / 378 mfl.,Stord
Byggeplassadresse	Ekro 1, 5416 Stord
Kommune	Stord kommune
Entreprise	Generalentreprise
Type prosjekt /prosjektskildring	Oppgradering og separering av kommunal VA-nett i Ekro, Rusti og Eikevegen, ca. 480m. Kabelgrøft Villavegen-Hystadvegen, ca. 300 m hovudgrøft (370m inkl. stikkgrøfter).

Stord Vatn og avløp AS skal oppgradera leidningsnettet i Ekro, Rusti og Eikevegen. Leidningsnettet ligg i dag inne på privat grunn gjennom hagar og består mykje av underdimensjonerte fellesleidningar i dårleg stand. Vassleidning skal også oppgraderast med større dimensjon.

Det blir etablert separate leidningar for spillvatn og overvatn, og alle nye hovudtrasear blir lagt i veg. Stikkleidningar for vatn blir tilknytt samlestokk og det blir etablert hydrantar/brannventilar for å betre brannvassdekninga i området. Eksisterande stikkleidningar tilkopla kommunal VA i dag vert ivareteke. For eigendommar utan stikk vert det tilrettelagt for framtidig tilkopling.

Ny trasé for VA ligg i veg i Ekro, Rusti og Eikevegen. For delar av Ekro, og langs heile Rusti og Eikevegen ligg det anna teknisk infrastruktur som skal iveratakast. Dette gjeld høgspent, lågspent samt tele og fiber. Veglys er opsjon i entreprisen, og kan bli aktuelt å etablere.

I tillegg skal det leggast ein ny høgspentkabel (ca. 300 meter) gjennom hagar mellom nettstasjon i Villavegen og nettstasjon i Hystadvegen like ved Rusti for å unngå å ha høgspentkabel i Rusti i drift under gravearbeidet i Rusti. Dette arbeidet inkluderer noko nytt lavspentanlegg på strekninga og ombygging i eks. nettstasjonar.

1.3 Definisjonar og forkortingar

Tabell 2 Definisjonar og forkortingar

AML	Arbeidsmiljøloven
BHF	Byggherreforskriften. Forskrift om sikkerheit, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassar
Entreprenør / UTF	Byggherrens kontraktspart uansett kontraktstype. Entreprenør er således fellesbetegnelse på kontraktspart i totalentrepriser, vare- og utstyrs-leveranser og tradisjonelle entrepriser.
IKF	Internkontrollforskriften, Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten
HB	Hovedbedrift iht. AML § 2-2 og IKF § 6
HMS	Helse, miljø og sikkerhet. Inkluderer også ytre miljø.
KP	Koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjekteringsfasen
KU	Koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i utførelsesfasen
SJA	Sikker-jobb-analyse
SHA	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

1.4 Oppdatering og distribusjon av SHA-planen

Byggherren/KP har ansvaret for utarbeiding av innhald til SHA-planen med tanke på tidsbruk, risikovurdering av løysningar samt beskrivelse av spesifikke tiltak. Tabell 3 syner distribusjonsliste SHA-plan.

Byggherren / KU har ansvaret for å ajourføre, komplettere og distribuere planen i bygge- og anleggstida. Vedlegg til planen, som til dømes framdriftsplanar, reviderast etter behov og blir distribuert separat.

SHA-planen må sjåast i samanheng med SHA-krav og spesifikasjonar ivaretatt i andre deler av kontrakten da disse krava ikkje er medtatt i SHA- planen. Dette gjeld blant anna krav til:

- Førebyggande tiltak (riggforhold) i samsvar med BHF §9
- Ansvar og oppgåver for hovudbedrift og verneorganisasjonen inkludert rutinar for samordning av vernearbeidet (AML § 2-2, kap. 6 og IK-forskrifta § 6)

Tabell 3 Distribusjonsliste SHA-plan

Funksjon	Kontaktperson	Firma	E-post
Byggherre	Tarjei Limstrand	Stord Vatn og Avløp AS	tli@stordva.no
Byggherrens representant	Øyvind Kannelønning	Novaform	oyvind.kannelonning@novaform.no
Koordinator prosjektering, KP	Håkon E. Børtveit	Multiconsult	hakon.bortveit@multiconsult.no
Koordinator utføring, KU			
Prosjekterande VA	Erik Vikestrand	Multiconsult	erik.vikestrand@multiconsult.no
Prosjekterande RIG	Lise Føsund Christiansen	Multiconsult	lise.fosund.christiansen@multiconsult.no
Generalentreprenør			

1.5 Revisjonsoversikt


Tabell 4 syner oversikt og dato for revisjon av SHA-planen.

Tabell 4 Revisjonsoversikt

Rev. nr.	Endring	Dato
03	Revidert etter kommentar fra byggherre	29.10.2026
02	Byggherrens representant og veglys (opsjon) lagt inn	26.10.2026
01	Eikevegen og kabelgrøft Villavegen inkludert i SHA-plan	25.08.2026
00	SHA-plan (KP)	10.12.2025

2 Organisasjon og entreprisemodell

Oppdraget vert utført som generalentreprise.

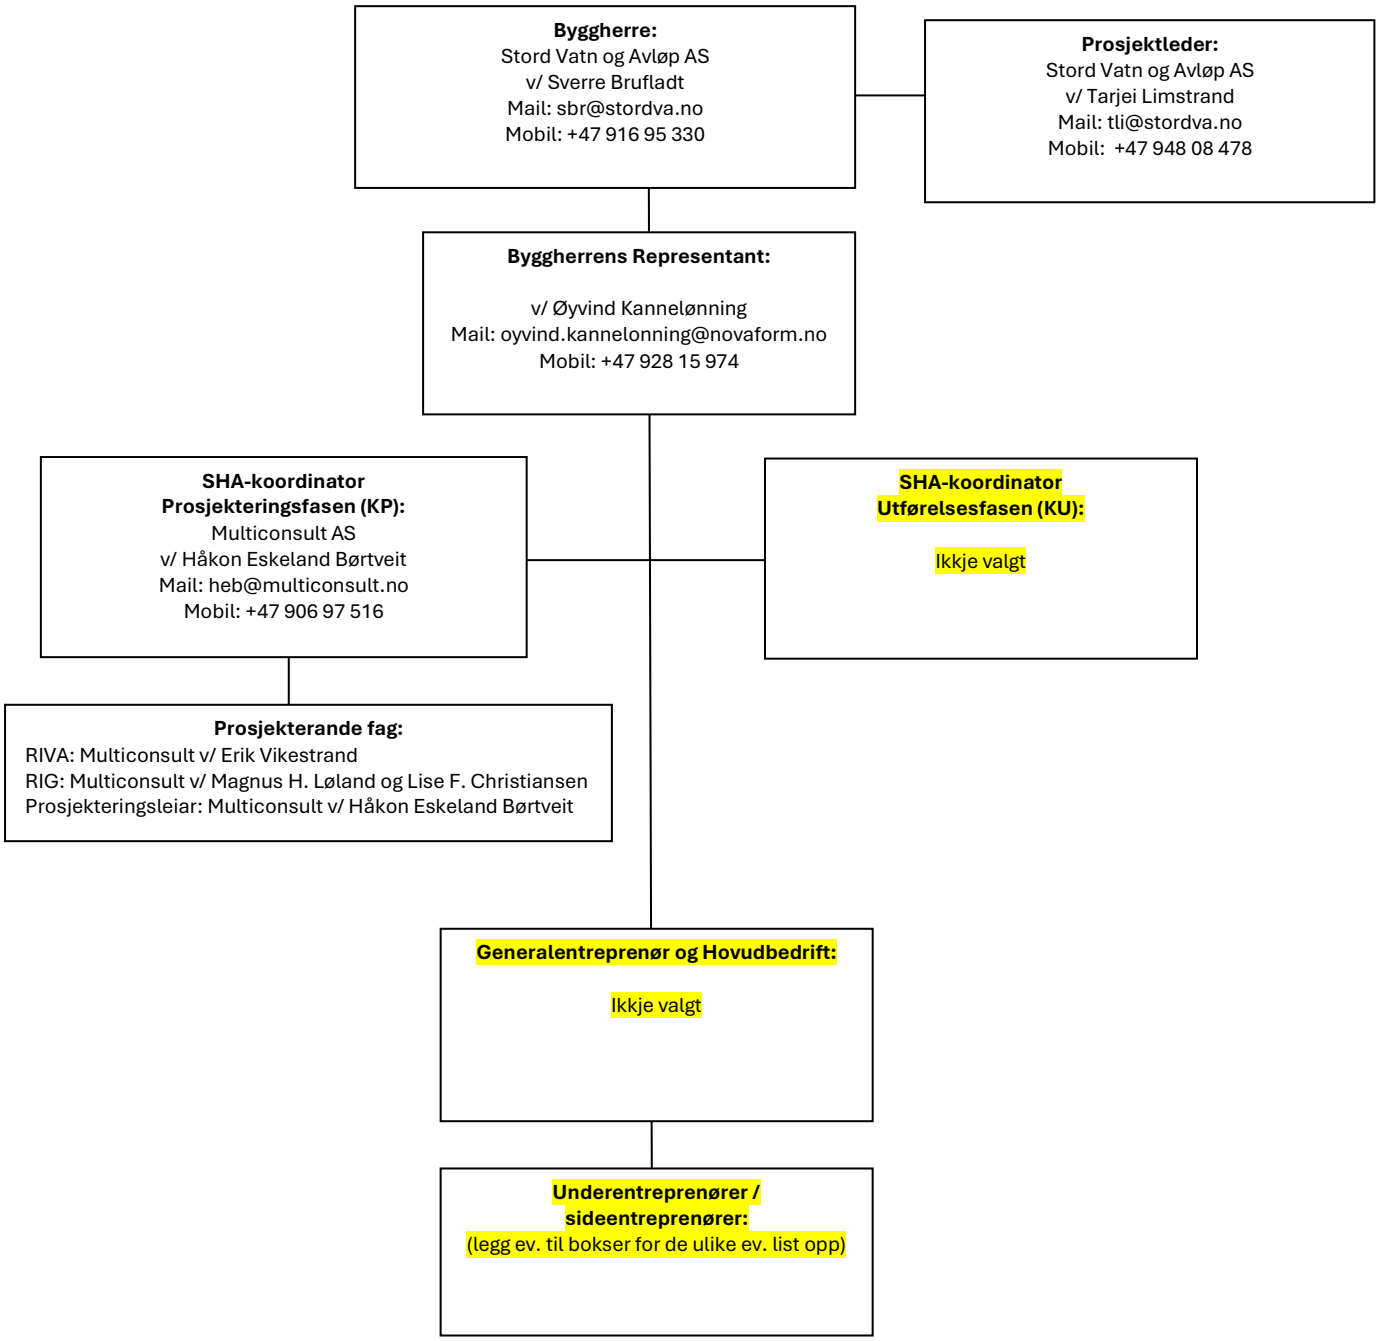

3 Framdriftsplan

Prosjektets framdriftsplan skal vise at dei ulike arbeidsoperasjonar ikkje samanfall i tid slik at arbeidstakarane utsettast for farar, og skal være så detaljert at den er et hensiktsmessig verktøy for koordinering i utføringsfasen.

Overordna framdrift for prosjektet framkjem av entreprenøren sin hovudframdriftsplan. Detaljert framdriftsplan skal innarbeidast før oppstart.

Estimert oppstart av arbeida er 15.02.2027. Ferdigstilling seinast innan 17.01.2028.

Entreprenør for entreprise har ansvar for å utarbeide og vedlikehalde detaljert framdriftsplan for alle arbeider i samsvar til krav i kontrakten med byggherre. Framdriftsplanen skal utarbeidast før oppstart av arbeida, og gjeldande utgåve av framdriftsplanen skal alltid være tilgjengeleg på bygge- eller anleggsplassen.

Tabell 5 Prosjektet sin framdriftsplan

Nr	Skildring	Dato
1.	Oppstart og rigg	15.02.2027
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	Ferdigstilling	17.01.2028
9.		

4 Risikovurdering og spesifikke tiltak

Spesifikke tiltak knytt til arbeider som kan innebera fare for liv eller helse skildrast. De spesifikke tiltaka er basert på risikovurderingar byggherren og dei prosjekterande har utført i samband med planlegging og prosjektering av prosjektet. Dette gjelder for risikoforhold som følge av byggherren og dei prosjekterande sitt "val".

Oversikt over identifiserte risikoforhold og risikoreduserande tiltak som skal implementerast, framkjem av tabellen under.

Tabell 6 Oversikt over prosjektets risikoforhold

Aktivitet/farekjelde	Fare/uønskt hending	Spesifikke tiltak	Referanse dokument	Ansvarleg for tiltaket
Ca. 3m djupe grøfter i vegbane ved Rusti og Ekro	Ustabile grøfteskråningar	Vurdering av veg -og grøfteforhold i forkant. Grøfteskråning i samsvar med Forskrift om utførsle av arbeid (Arbeidstilsynet, 2023) § 21-4. For heilning på graveskråning må det bestemmast en skråningsheilning som er tilpassa grunnforholda. Grøftekassar	Godkjent arbeidsvarslingsplan med risikovurdering Gjennomgang Entreprenørens SJA Vernerunderapport SHA-synfaringsrapport	UTF
Sprenging nær personell, hus og andre konstruksjonar, trafikkerte vegar og infrastruktur	Rystingar gjer alvorleg skade/død på personell, leidningsnett, nærliggjande bygningar og konstruksjonar og vegbane. Sprenging og pigging kan medføre steinsprut som	Sprengingsplan med risikovurdering. Bruk av rystelsesmålarar. Trafikksikring ved sprenging. Opphald i pigging dersom utførande	Entreprenørens risikovurdering Entreprenørens SJA Vernerunderapport SHA-synfaringsrapport Infoskriv til naboar	UTF

	kan treffe utførande og trafikk i nærleiken.	kommer for nær sprutsonen.		
Arbeid ved bustadstrøk med omsyn til personar med behov for heimetenester, legevakt eller anna helseoppfølging	Personar med behov for heimetenester, legevakt eller anna helseoppfølging får redusert tilgang til naudsynt helsehjelp	Entreprenøren skal kartleggja om det finst særskilde behov hos bebuarar før oppstart i kvar delstrekning. Det skal etablerast sikre og framkomelege mellombelse tilkomstar. Tilkomsten skal vere eigna for personell med utstyr og for personar med redusert mobilitet.	Godkjent arbeidsvarslingsplan med risikovurdering Entreprenørens SJA Vernerunderapport SHA-synfaringsrapport	UTF
Arbeid ved bustadstrøk med omsyn til blålysetatar	Forsinka framkomst for ambulanse, brannvesen og politi ved utrykking Blålysetatar får ikkje tilgang til eigedomar eller område med beredskapsbehov	Planlagde stengingar skal varslast til naudetatane i god tid. Det skal etablerast alternativ framkomst som til dømes tilgjengelege køyresterke plater	Godkjent arbeidsvarslingsplan med risikovurdering Entreprenørens SJA Vernerunderapport SHA-synfaringsrapport	UTF

	Utrykkingskøyretøy må stoppe eller snu grunna manglande framkomst Utrykkingskøyretøy vert hindra av skilting, sperringar eller anleggsmaskiner Akutt behov for passasje gjennom arbeidsområdet Naudetatane er ikkje kjende med pågåande arbeid eller stengingar	dersom tilkomstar vert stengd. Køyrebreidde og bereevne skal dimensjonerast for utrykkingskøyretøy. Eventuelle mellombelse løysingar skal avklarast med byggherren. Sperringar skal vere enkle å opne ved behov. Anleggsmaskiner og utstyr skal ikkje parkerast slik at framkomst vert redusert. Entreprenøren skal ha rutinar for rask opning av arbeidsområdet ved utrykking. Alt personell skal vere kjent med rutinane. Entreprenøren skal varsle aktuelle blålysetatar før		

		etablering av trafikkavvikling og ved større endringar i framkomstsituasjone n.		
Arbeid ved bustadstrøk med omsyn til gåande/syklande	Uvedkommande kjem seg inn på anleggsområde.	Mjuke trafikantar må ha tilkomst til bustadar, og anleggsområde skal skal legge til rette for gåande og syklande i anleggsfasen. Sikring av grøft /anleggsområde for uvedkommande.	Godkjent arbeidsvarslingsplan med risikovurdering Entreprenørens SJA Vernerunderapport SHA-synfaringsrapport	UTF
Smal vegbane medfører mykje pigging i staden for sprenging	Støyande aktivitet i nærområdet over tid. Skade på 3.part	Bruk av rystelsesmålarar. Informere eksponerte grunneigera fortløpande for å skape betre forståelsen for dei ulike arbeids-operasjonane og skape tillit	Infoskriv til grunneigarar Byggemøtereferat SHA-synfaringsrapport	BH/ UTF

Arbeid med grøft langs høg lausmassefylling/ fjellskjering ved Ekro 7 og 9.	Alvorleg skade ved utrasing frå lausmassefylling/ fjellskjering ved arbeid i grøft i vegbane langs ved Ekro 7 og 9.	Vurdere arbeidssikring av lausmassefylling/ fjellskjering langs grøfta.	Godkjent arbeidsvarslingsplan med risikovurdering Entreprenørens SJA Vernerunderapport SHA-synfaringsrapport	UTF
Etablering og drift av mellombels VA-anlegg (provisorisk VA)	Svikt i vassleveranse, lekkasje, forureining av drikkevatn, snublefare eller skade på provisoriske leidningar og koplingar	Entreprenøren skal planleggje, etablere og drifte mellombels vassforsyning slik at abonnentane har tilfredsstillande tilgang til vatn gjennom heile anleggsperioden. Provisoriske leidningar og koplingar skal sikrast mot lekkasje, mekanisk skade, frost og forureining. Leidningar som kryssar vegar, innkøyrsler eller gangareal skal sikrast slik at dei ikkje medfører fare for	Godkjent arbeidsvarslingsplan med risikovurdering Entreprenørens SJA Vernerunderapport SHA-synfaringsrapport	UTF

		trafikantar eller bebuarar. Ved planlagde avbrot skal berørte abonnentar varslast i god tid. Det skal vere beredskap for rask utbetring ved lekkasje eller bortfall av vassforsyning.		
Arbeid med vassleidning under trykk	Skade på eksisterande vassleidning ved tilkopling eksisterande anlegg. Rørene inneheld vatn under trykk og trykket vil ikkje reduserast eller stoppes av seg sjølv ved en skade på røyret. Testkøyring av ny vassleidning.	Påvising og avtale med Stord VA v/ drift ved arbeid nær røyrleidning. Utarbeide beredskapsplan som skal formidlast til utførande. Viktige telefonnummer må framkomme på beredskapsplanen. Rømmingsveg i grøft.	Påvisingsdokument. Entreprenørens SJA Beredskapsplan Vernerunderapport SHA-synfaringsrapport	UTF
Vatn i djup grøft / brot på eksisteirande leidningar	Skade på eksisterande VA-anlegg arbeid tett på eksisterande VA i drift. Rørene inneheld vatn under trykk, overvann og	Påvising og avtale med Stord VA v/ drift ved arbeid nær røyrleidning.	Påvisingsdokument. Entreprenørens SJA Beredskapsplan	UTF

	spillvatn frå eit større nedslagsfelt som kan fylle grøft med vatn.	Utarbeide beredskapsplan som skal formidlast til utførande. Viktige telefonnummer må framkomme på beredskapsplanen. Rømmingsveg i grøft.	Vernerunderapport SHA-synfaringsrapport	
Fjerning av eternittleidning, asbest.	Eksponering for asbestfibrar ved brot, kapping eller handtering av røyr. Alvorleg helseskade.	Varsam oppgraving, unngå knusing og kapping (avgrense støvutvikling), avsperring av arbeidsområde, naudsynt opplæring og verneutstyr, og levering til godkjent mottak. Emballering, merking og mellomlagring iht. gjeldande regelverk.	Godkjent arbeidsvarslingsplan med risikovurdering Entreprenørens SJA Vernerunderapport SHA-synfaringsrapport	UTF
Arbeid nær trafikkert fylkesveg 5050 (Hystadvegen)	Arbeid nær trafikkert hovudveg kan gi trafikkale problem ved behov for midlertidig stenging av eit køyrefelt.	Trafikksikring ved sprenging. Manuell trafikkdirigering ved behov.	Godkjent arbeidsvarslingsplan med risikovurdering Beredskapsplan Vernerunderapport SHA-synfaringsrapport	UTF

Arbeid på eksisterande høgspentkabel og andre elektriske installasjonar langs Rusti og deler av Ekro og Eikevegen. Legging av nye kabler fra Villavegen til Hystadvegen og omkopling.	Alvorleg skade på person / død i forbindelse med skade på eksisterande høgspentkabel i drift ved graving og straumgjennomgang.	Kabelpåvisning og graveløyve før arbeidet startar Koordinering mot kabeleigar før graving nær høgspentleidning Nær Ved Avtale Utførande personell må ha utført HK-kurs: - "Aktivitetar nær kraftleidningar og kablar i bakke» (årleg) - «Kurs i anleggsarbeid» (gyldig i 3 år) Beskyttelse av HS-kabel.	Dokument for kabelpåvisning Godkjent graveløyve Kursbevis SHA-synfaringsrapport	UTF
Fiber, tele, veglys og lågspent kablar	Straumskade på person ved arbeid og graving nær kablar.	Kabelpåvisning og graveløyve før arbeidet startar. Forsvarleg midlertidig plassering/sikring av ladningar.	Dokument for kabelpåvisning SHA-synfaringsrapport	UTF
Gravemaskin river ned leidningar i luftspenn	Linje skader person.	Være ekstra observant på risiko når man jobbar med	Entreprenørens risikovurdering	UTF

	Stoppet tilførsel til forbruker.	gravemaskin i område med luftlinjer.	SHA-synfaringsrapport	
Arbeid tett på eksisterande gassleidning i Rustungvegen	Alvorleg skade på person / død ved arbeid nær eksisterande gassleidning i Rustungvegen grunna lekkasje av gass.	Kabelpåvisning og graveløyve før arbeidet startar Koordinering mot kabeleigar før graving i nærleik av gassrøyr. Nær Ved Avtale	Dokument for kabelpåvisning Godkjent graveløyve SHA-synfaringsrapport	UTF
Køyring innanfor arbeidsområdet	Alvorleg skade / død som følgje av påkøyrsle av personell i anleggsområdet	Arbeidsvarslingsplan som sikrar utførande mot påkøyrsel i arbeidsområdet. Sikring av anleggsstad for uvedkommande	Godkjent arbeidsvarslingsplan med risikovurdering Entreprenørens SJA Vernerunderapport SHA-synfaringsrapport	UTF
Svikt i terreng som følgje av ustabil grunn.	Svikt i terreng kan medføre klemskade/død på personar etter velt av utstyr eller maskiner	Vurdering av veg -og grøfteforhold i forkant. Vurdere å etablere tilkomstsvei for maskin.	Entreprenørens SJA Vernerunderapport SHA-synfaringsrapport	UTF

Treffelling av trær i konflikt med etablering av VA-grøft.	Alvorleg skade eller død ved trefelling over person.	I vareta sikkerheitstiltak ved arbeid med trefelling.	Godkjent arbeidsvarslingsplan med risikovurdering Entreprenørens SJA Vernerunderapport SHA-synfaringsrapport	UTF
Løft av lange og/eller tunge rør og kummer	Skade som følge av rør som vert løfta eller senka under en løfteoperasjon.	Arbeidsvarslingsplan som sikrar utførande mot å få fallande røyr og kummar over seg ved løfteoperasjonar i arbeidsområdet. Sikring av anleggsstad for uvedkommande	Godkjent arbeidsvarslingsplan med risikovurdering Entreprenørens SJA Vernerunderapport SHA-synfaringsrapport	UTF
Arbeid og sprenging tett på bygg, mur og konstruksjonar langs VA-trasé.	Fare for skade og utrasing av bygg, mur og konstruksjonar i forbindelse med arbeid. graving og sprenging i nærleiken.	Sprengingsplan. Bruk av rystelsesmålarar. Trafikksikring ved sprenging. Følge sikkerheitstiltak i samsvar med NS8141 og gjeldene rystingskrav.	Godkjent arbeidsvarslingsplan med risikovurdering Sprengingsplan med risikovurdering Entreprenørens SJA Vernerunderapport SHA-synfaringsrapport	UTF
Parallelle byggearbeid i nærområde:	Skade på personell grunna parallelle arbeidsoperasjonar på	Være ekstra observant på risiko i nærleiken av	Entreprenørens risikovurdering	UTF

Hystadgardane (Nordplan) Hystadvegen VA-anlegg (SVA) Valevegen VA-anlegg (SVA) Borggata VA-anlegg del 1 (SVA)	omliggjande anleggsområde.	parallelle anleggsområde.	Entreprenørens SJA Vernerunderapport SHA-synfaringsrapport	

5 Rutinar for behandling av endringar og oppdateringar av SHA-planen

Med endringar meinast i denne samanheng endringar i løysingar, planar, framdrift, risikoreduserande tiltak eller andre forhold i prosjektet som kan påverke SHA for arbeidstakarane på bygge- eller anleggsplassen.

Arbeidsgjevarar og einmannsbedrifter skal informere byggherren ved KU om avvik frå SHA-planen som kan ha betydning for arbeidstakaranes sikkerheit, helse og arbeidsmiljø. Risikoforhald som er forårsaka av byggherren og/eller de prosjekterande sitt val og som ikkje er skildra i SHA-planen skal også meldast som avvik til byggherren.

Eksempel på endringar frå SHA-planen:

- Endring i organisasjonskartet
- Endring av skildring av kor og når dei ulike arbeidsoperasjonane skal utførast (endring av framdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhald)
- Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av sjølve tiltaket
- Identifisering av nye risikoforhold som krev spesifikke tiltak som ikkje har vært skildra tidlegare
- Omprosjektering som medfører nye/endra risikoforhold med behov for spesifikke tiltak og/eller endring i framdriftsplanen.

Hovudbedrift skal ved endringar og oppdateringar av SHA-planen varsle og vidareformidla disse endringane til sine side- og underentreprenørar.

Endringar i SHA-planen skal formidlast til alle i distribusjonslista.

Tabell 5-1: Distribusjonsliste

Namn	Firma/Rolle	Telefon	e-post
Tarjei Limstrand	Prosjektleiar / Stord Vatn og Avløp AS	+47 948 08 478	tli@stordva.no
Øyvind Kannelønning	Byggherrerepresentant / Novaform AS	+47 928 15 974	oyvind.kannelonning@novaform.no
Håkon Eskeland Børtveit	Prosjektansvarleg prosjektering Multiconsult AS/	+47 906 97 516	heb@multiconsult.no
Ikkje valt	NN/Hovudbedrift	xx	xx
Ikkje valt	NN/Verneombod	xx	xx
