Notat fra anbudsbefaring 3 november 2026 kl. 10.00.

Kort oppsummering i fm diverse spørsmål:

Prosjektet i utgangspunktet er ment som vedlikeholdsprosjekt hvor hovedoppgaven er å bytte eksisterende belegg pga. lekkasjer. Men pga kommunen har ikke spisskompetanse hva skal til for å få det 100% riktig og i ht gjeldende lovverk, garantier o.l., så vi lyser dette ut som Totalentreprise iht NS 8407.

Grensesnittet – prosjektet er begrenset til selve bassenget inkl. betongstruktur og alt som er inne i betongen samt umiddelbart tilstøtende rør og/eller andre konstruksjoner. Se illustrasjonene nede – grensesnittet markert med rødt.



Fig. 1 Grensesnitt fra «utsiden»

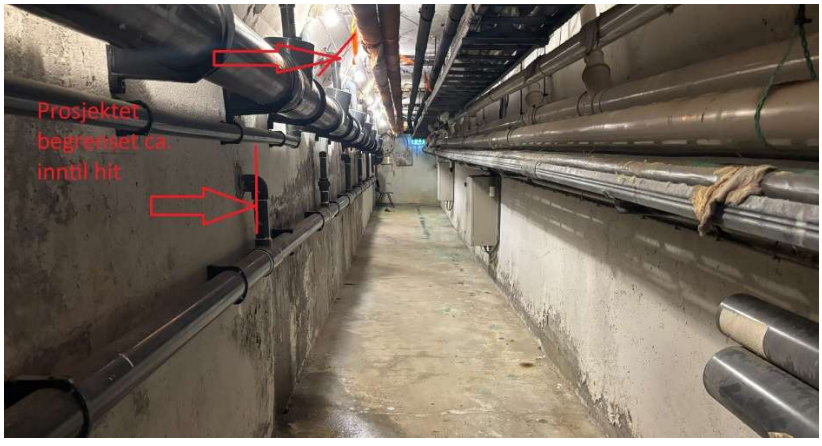


Fig. 2 Grensesnitt fra «innsiden».

Hva konkret, hvilke detaljer o.l. utenom det som er konkret beskrevet i konkurransegrunnlaget og innom det ovennevnte området må byttes og bygges om sånt

at bassenget er lovlig, er ikke mindre enn det er nå og med tilsvarende garantier – det er Totalentreprenørens ansvar.

Andre spørsmål som vi fikk underveis (Spørsmål – Svar):

1. **Krav til konkurransebasseng** – kan fravikes, men bassenget må ikke være mindre enn det er nå.
2. **Innstøpningsgods, gjennomføringer og rørføringer** – Hva av dette skal skiftes eller ikke det er an på totalentreprenøren som iht NS8407 står også for prosjektering av det som er nødvendig med tilsv. garantier o.l.

Ang. fliser – grensesnittet mellom det gamle og nye vi tenkte i utgangspunktet som på bildene oppe. Men om totalentreprenøren velger å ta litt mer eller litt mindre pga sin prosjektering og garantier. 2 stiger, 4 startpaller og innfestninger til 4 baneskillere må være nye.

3. **Garanti ved eventuell gjenbruk** – Hvis Totalentreprenøren velger å beholde de gamle gjennomføringene – han må stå for full garanti av dette.

4. (JK) Anbydere som velger å levere tilbud erklærer med dette at de var med på anbudsbefaringen, besiktiget bassenget, fikk alle nødvendige prøver og informasjon, så det er ikke adgang å stille vesentlige forbehold o.l.

5. **Grensesnitt og gjennomføringer:** Det må defineres nøyaktig hvem som har ansvaret for demontering, modifisering og flensetetting rundt tekniske komponenter som dyser, sluk, lysarmaturer og innløp – Totalentreprenøren står for dette.
6. **Krav til underlag og forarbeid:** PVC-duk krever et helt jevnt underlag for å unngå synlige ujevnheter og mekanisk slitasje. Omfanget av sliping, sparkling og oppretting av eksisterende bassengkropp, samt krav til godkjent underlagsfilt (geotekstil), må spesifiseres – Vi kan ikke gå altfor detaljert i beskrivelsen pga. dette er totalentreprise. - Detaljene prosjekteres og utarbeides av totalentreprenøren.
7. **Dokumentasjon og garantikrav:** Det bør stilles strenge, predefinerte krav til entreprenørens dokumentasjon, herunder materialsertifikater (UV- og kjemikaliebestandighet) og utførelsesgarantier på selve sveisejobben. Dokumentasjon og materialvalg iht gjeldende lovverk og anbudsbeskrivelse.
