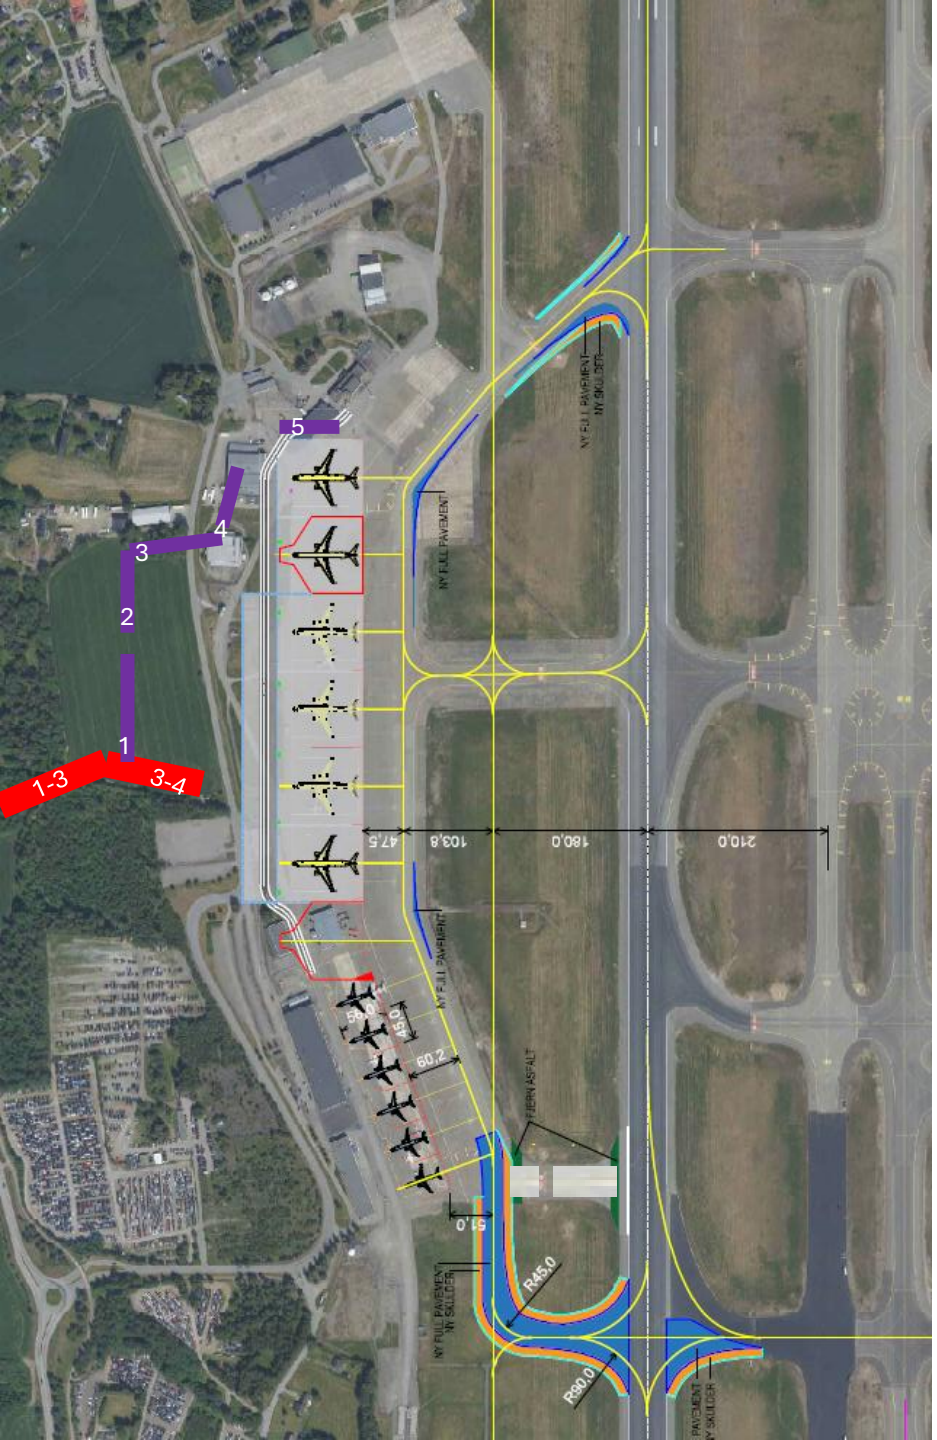



# Landside OV1000, kommunal VA, og vei
# Mai – oktober 2027

**Matjordavtak** , 24.5. – 3.9.

Riggplass for flyside, opparbeide 6.9. – 22.10.

**OV 1000**, 260m, 1+3+1 kum, d=3-5m, obs kollisjon
31.5.27-1.9.27
1-3: 170m 31.5. – 6.8. Start i vest , etapper før ny vei
3-4: 90m 7.8. – 1.9. i og ved ny vei, blir noe samtidighet med første etapper.
Avsluttes i kum før eksisterende kommunal vei

**OV600**, omlegg 550m, 5 kum, d=3-4m
31.5.-2.9.
Nummerering fra sør til nord, nord for eksisterende OV1000
1-2: 150m 31.5.- 21.6.
2-3: 100m22.6. – 9.7. inkludert kobling til eksisterende OV1000 ved kum 4 og inkludert VA til CB2
3-4: 125m 2.8.- 19.8. må undergrave kommunal VA og HSP, Kommunal veg stenges senest 1.7.
4-5: 100m 20.8. – 2.9.
5-6: 100m OV300 fra øst. (bygges av Flyside)
Full omlegging fra tilkobling eksisterende OV1000 til ny OV1000 blir ca. 1.2.2029. inkludert kobling til eksisterende OV1000 ved kum 4

**VA, omlegg 500m**, 6 kum, d=3m Langs ny veitrase
Graving VA, EL/IKT og vei går samtidig 19.5.27 – 17.8.27.
Kommunal veg stenges senest 1.7. (før oppstart OV600 etappe 3-4.)
