
Plan OV1000, OV600 og kommunal vei

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	% fullført	Kommentar
1	**Plan OV1000 og vei**	**120 dager**	**ma 24.05.27**	**fr 26.11.27**	**0%**	
2	**Milepæler**	**100 dager**	**ma 24.05.27**	**fr 29.10.27**	**0%**	
3	Oppstart	0 dager	ma 24.05.27	ma 24.05.27	0%	
4	Avtaking matjord ferdig	0 dager	on 01.09.27	on 01.09.27	0%	
5	OV600 nord for eksisterende OV1000 ferdig	0 dager	to 02.09.27	to 02.09.27	0%	
6	Sluttfrist fysiske arbeider	0 dager	fr 22.10.27	fr 22.10.27	0%	
7	Sluttdokumentasjon levert til BH og godkjent av BH	0 dager	ti 26.10.27	ti 26.10.27	0%	
8	TF/M3 - DVA/Overtagelse/Eierskifte	0 dager	on 27.10.27	on 27.10.27	0%	
9	TF/M6 - Klar for drift (åpne kommunal vei)	0 dager	fr 29.10.27	fr 29.10.27	0%	
10	**Generelt**	**95 dager**	**ma 24.05.27**	**fr 22.10.27**	**0%**	
11	Fjerne og transportere bort matjord/vegetasjonsdekke	58 dager	ma 24.05.27	on 01.09.27	0%	
12	Stenge kommunal vei	0 dager	ma 05.07.27	ma 05.07.27	0%	
13	Fjerne jordrenseanlegg	15 dager	to 02.09.27	on 22.09.27	0%	
14	Utgraving arealer med PFAS	20 dager	to 02.09.27	on 29.09.27	0%	
15	Opparbeide riggplass for flyside	35 dager	ma 06.09.27	fr 22.10.27	0%	
16	**Plan OV1000**	**58 dager**	**ma 24.05.27**	**on 01.09.27**	**0%**	
17	Fjerne og transportere bort matjord	5 dager	ma 24.05.27	fr 28.05.27	0%	
18	Del 1-3 (ca 170 m)	35 dager	ma 31.05.27	fr 06.08.27	0%	Fra vest mot øst
19	Del 3-4 (ca 90 m)	18 dager	ma 09.08.27	on 01.09.27	0%	Fra vest mot øst
20	**OV600 nord for eks OV1000**	**59 dager**	**ma 24.05.27**	**to 02.09.27**	**0%**	
21	Tilkomst under Aerochef og Hjemmebakeriet	0 dager	ma 02.08.27	ma 02.08.27	0%	
22	Fjerne og transportere bort matjord	5 dager	ma 24.05.27	ma 31.05.27	0%	
23	Etappe 1-2	16 dager	ma 31.05.27	ma 21.06.27	0%	
24	Etappe 2-3	14 dager	ti 22.06.27	fr 09.07.27	0%	
25	Etappe 3-4	14 dager	ma 02.08.27	to 19.08.27	0%	
26	Etappe 4-5	10 dager	fr 20.08.27	to 02.09.27	0%	Etappe 5-6 OV300 v/Mesta-garasjen i flysideentreprisen
27	**Kommunal vei og VA, inkl stikkvei mot E16**	**95 dager**	**ma 31.05.27**	**fr 29.10.27**	**0%**	
28	Fjerne og transportere bort matjord	5 dager	ma 31.05.27	fr 04.06.27	0%	
29	Graving og oppfylling samt kummer og ledninger/føringsveier EL og IKT, vann og avløp	50 dager	ma 07.06.27	fr 03.09.27	0%	Betinger to gravelag
30	Kommunen demobiliserer eksisterende pumpesta	10 dager	to 16.09.27	on 29.09.27	0%	
31	Forsterkningslag	30 dager	ma 09.08.27	fr 17.09.27	0%	
32	Bærelag	20 dager	ma 30.08.27	fr 24.09.27	0%	
33	Asfalt	10 dager	ma 27.09.27	fr 08.10.27	0%	
34	Oppmerking	5 dager	ma 11.10.27	fr 15.10.27	0%	
35	Gatebelysning	5 dager	ma 11.10.27	fr 15.10.27	0%	
36	Sluttbefaring	1 dag	fr 22.10.27	fr 22.10.27	0%	
37	Åpne ny vei	0 dager	fr 29.10.27	fr 29.10.27	0%	
38	**Igangkjøring**	**35 dager**	**ma 11.10.27**	**fr 26.11.27**	**0%**	
39	**UF/HF**	**13 dager**	**ma 11.10.27**	**on 27.10.27**	**0%**	
40	SAT prosedyre godkjent av BH	0 dager	ma 11.10.27	ma 11.10.27	0%	
41	Spenningsetting UF	1 dag	ma 18.10.27	ma 18.10.27	0%	



Plan OV1000, OV600 og kommunal vei

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	% fullført	Kommentar
42	Sluttkontroll iht NEK400	3 dager	ti 19.10.27	to 21.10.27	0%	
43	Oversendelse protokoll til BH	1 dag	fr 22.10.27	fr 22.10.27	0%	
44	SAT/integrert test UF	1 dag	ma 25.10.27	ma 25.10.27	0%	
45	SAT-rapport	1 dag	ti 26.10.27	ti 26.10.27	0%	
46	DVA befaring	1 dag	on 27.10.27	on 27.10.27	0%	
47	**ORAT-prosess vei og kommunal VA**	**24 dager**	**ma 25.10.27**	**fr 26.11.27**	**0%**	
48	M1 - SAT godkjent	0 dager	ma 25.10.27	ma 25.10.27	0%	
49	M2 - Integrerte tester ferdig	0 dager	ma 25.10.27	ma 25.10.27	0%	
50	Buffer	0 dager	ma 25.10.27	ma 25.10.27	0%	
51	M3 - DVA/Overtagelse/Eierskifte	0 dager	on 27.10.27	on 27.10.27	0%	
52	M4 - Leveranser fra drift ferdig	0 dager	on 27.10.27	on 27.10.27	0%	
53	Tjenestetest					
54	M5 - Tjenestetest ferdig					
55	Beslutningsprosess M6	2 dager	to 28.10.27	fr 29.10.27	0%	
56	M6 - Klar for drift	0 dager	fr 29.10.27	fr 29.10.27	0%	
57	Oppramping					
58	M7 - Normal drift	0 dager	fr 29.10.27	fr 29.10.27	0%	
59	M8 - Overtagelser og eierskifter	0 dager	fr 26.11.27	fr 26.11.27	0%	

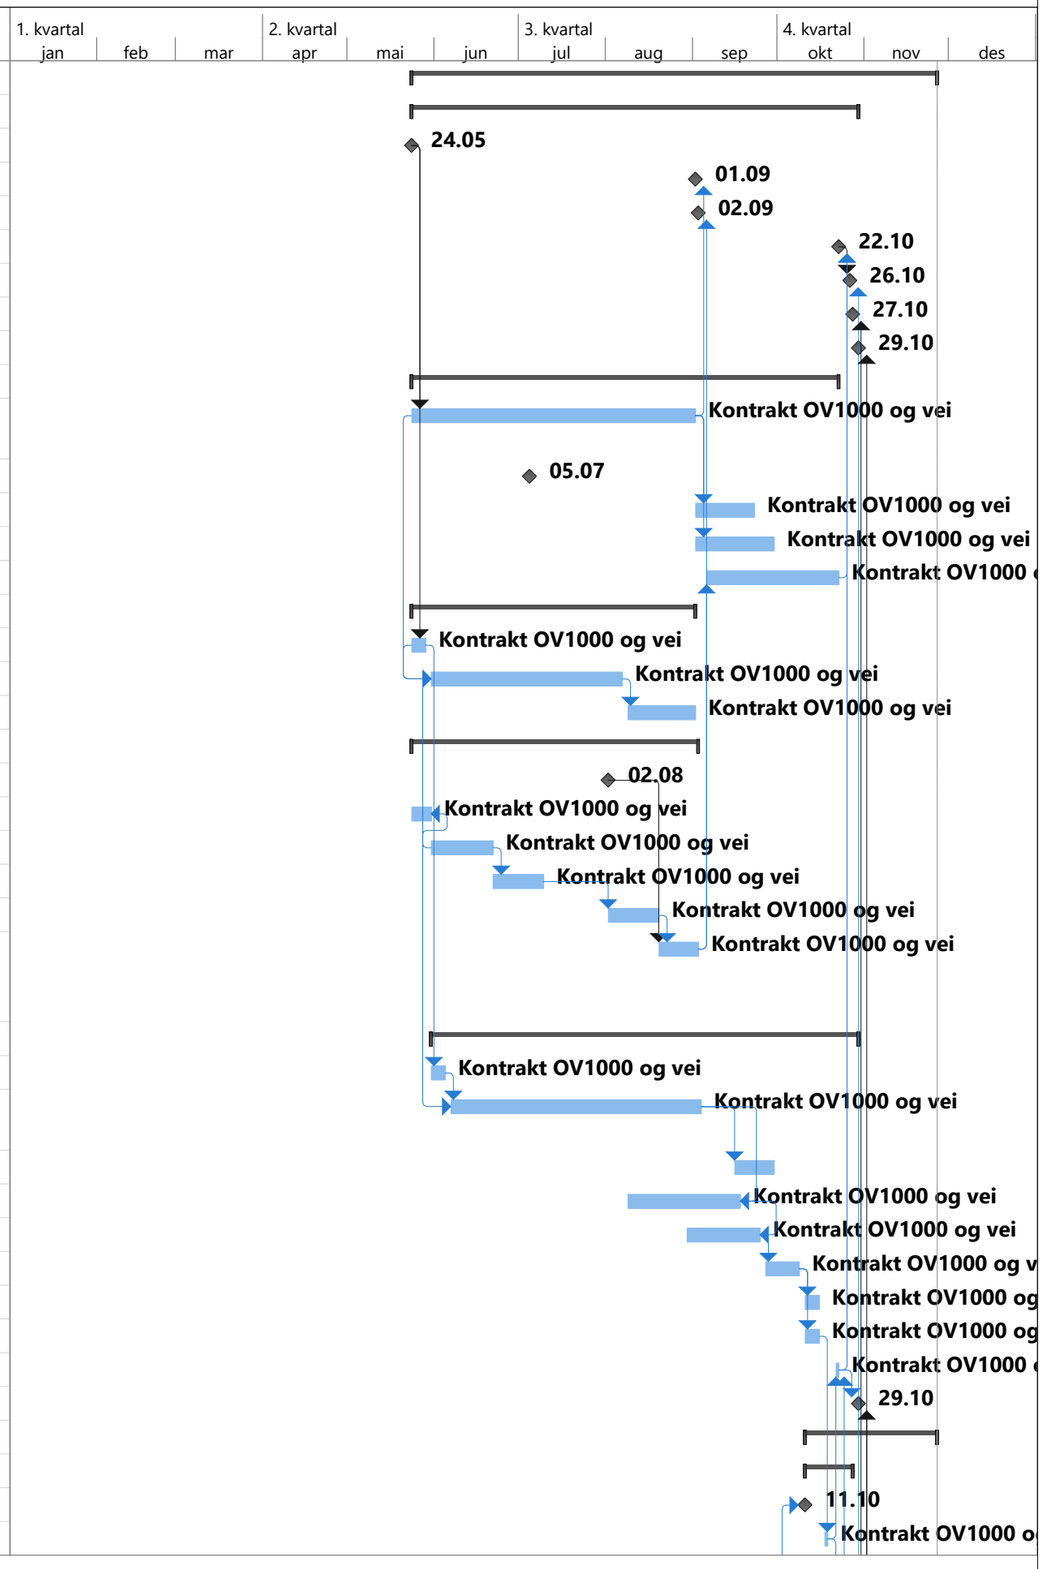
