



J06	2026-09-24	Justert faseplan for E1		TEi	SakMai	TEi
Rev.	Dato	Beskrivelse		Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av del oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.						
Østre Toten kommune					Målestokk (gjelder A1) 1:5000	
VA Stensbygd - Gransmarka Oversiktsplan - alle etapper Forslag til gjennomføring og faser						
		Oppdragsnummer	Tegningsnummer			Revisjon
		5197400	101			J06

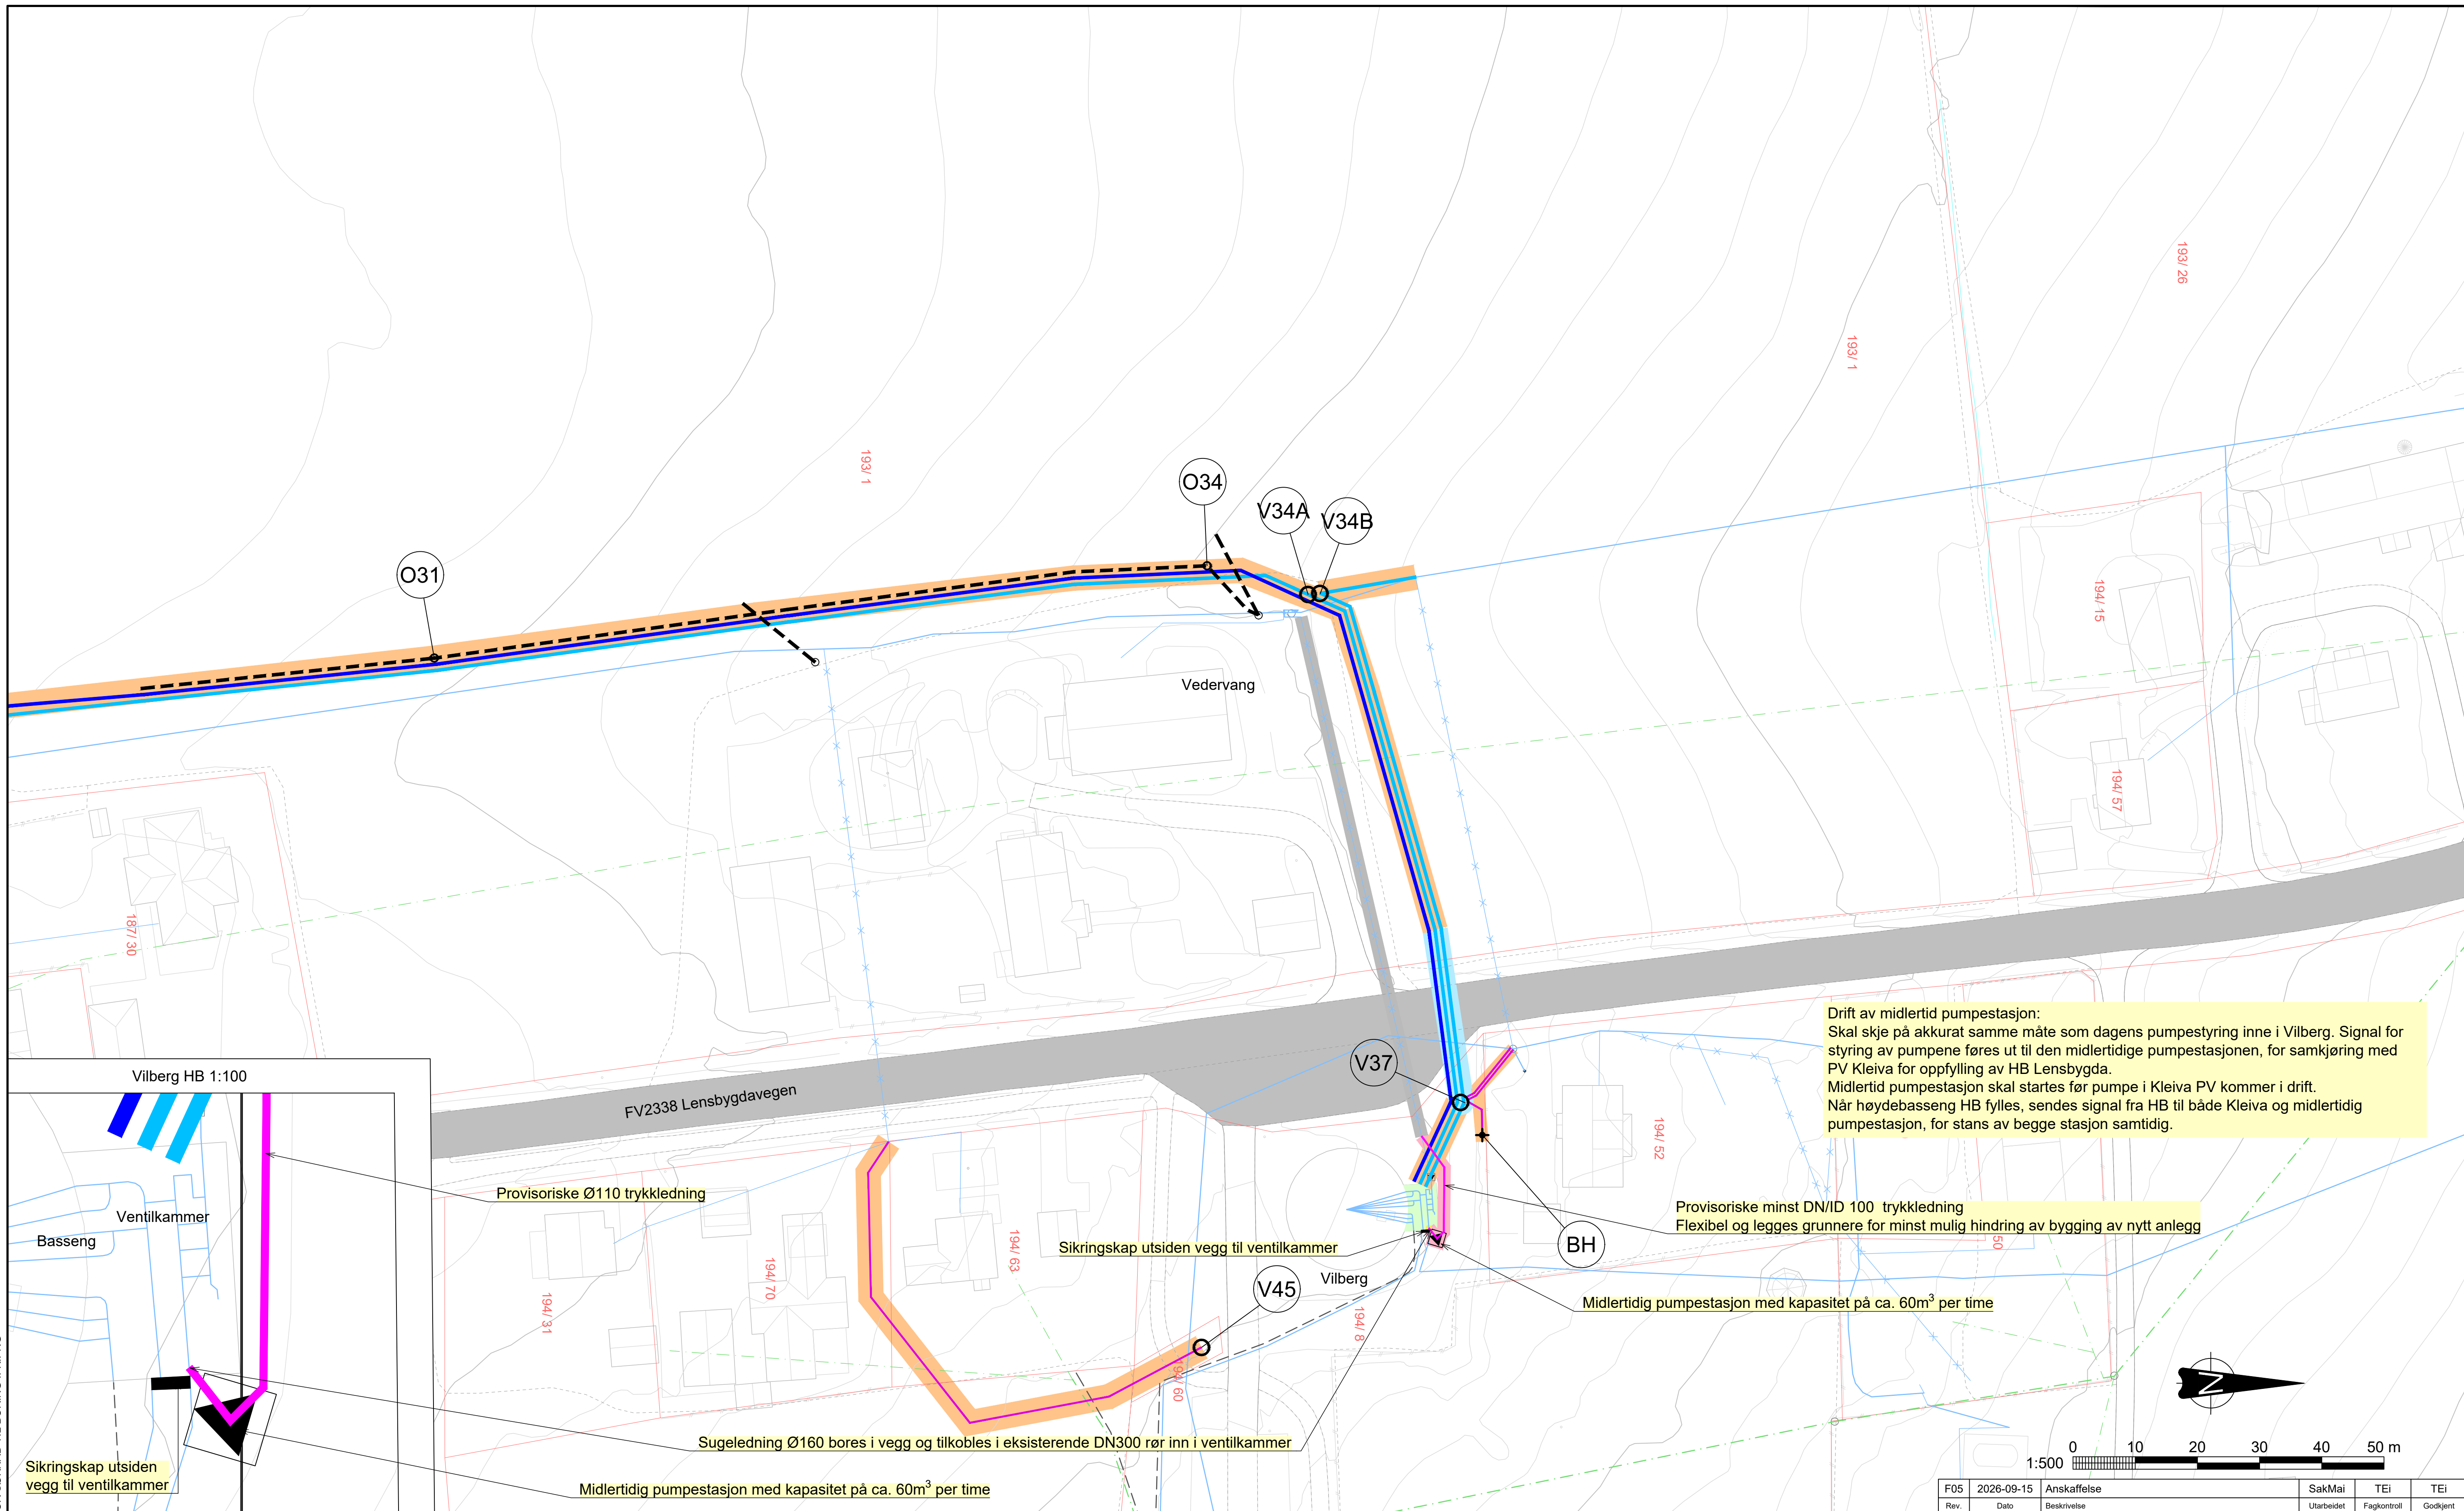

F05	2026-09-15	Anskaftelse	SakMai	TEI	TEI
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor: Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					
Østre Toten kommune				Målestokk (gjelder A1)	1:500
VA Lensbygdta - Gransmarka Situasjonsplan - Etappe 1 Faseplan Provisorium høydebasseng Vilberg					
		Oppdragsnummer	Tegningsnummer		Revisjon
Norconsult		5197400	E1-113		F05

"\\norconsult\adcom\vf\en\opprodrag\Lillehammer\519\4151\7400\BIM\VA_T\VA\K\fil\Etappe 1\LAY\Etappe 1 detaljer1.dwg - SakMai - Utskriftsdato: 2026-10-08 09:03:58 - LAYOUT = E1-141C - XREF = 2D_FKB-SOSI 2025-08-12_2D_VA-SOSI Gransmarka, Eksis_VA-modell, Etappe 1 standard tegninger, Etappe1 Kumskisse - RASTER = 8121.JPG, 62129.JPG, 1766.JPG"

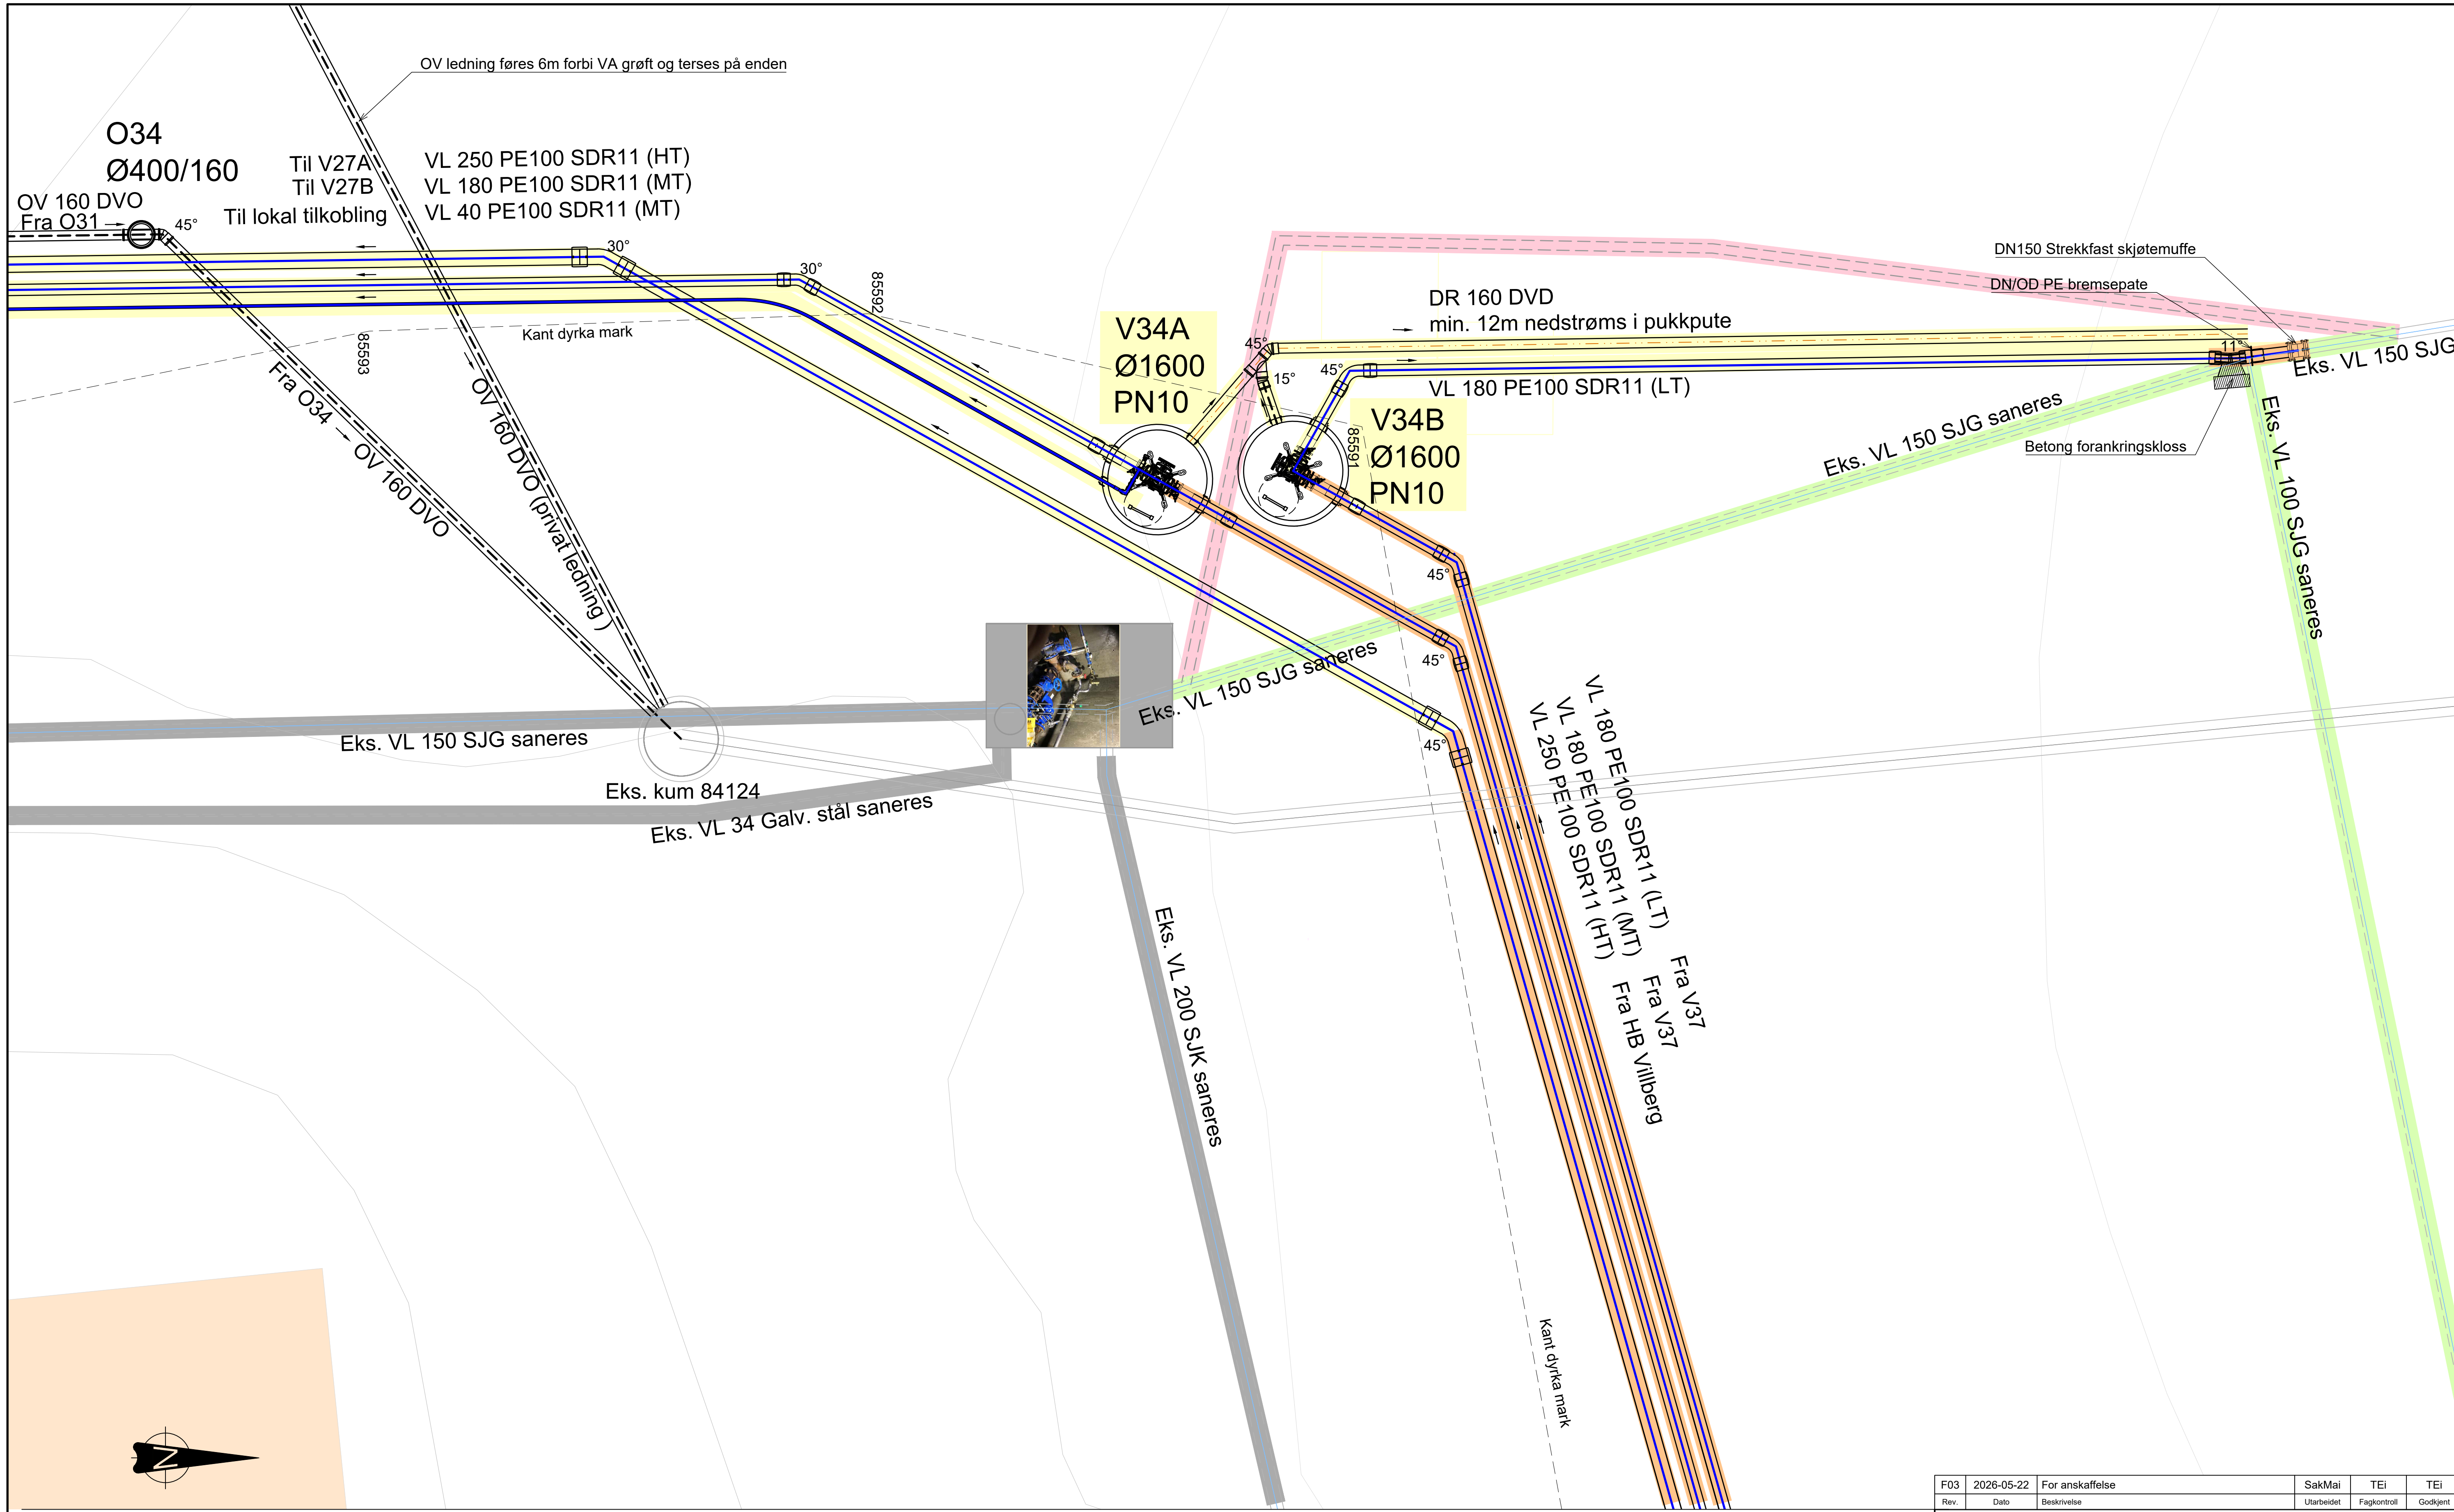

Faseplan:

- E1a. Eksisterende situasjon, eksisterende kummer og ledninger, alle i drift
- E1b. KG34 og tilhørende nord-sør gående ledninger (gull farge)
- E1c. Provisoriske ledninger fra eksisterende kum 1766 til eks. VL 150 SJG (rosa farge)
- E1d. Sanering av VL 150 SJG og 100 SJG (grønn farge)
- E1e. Etablering av ledningsanlegg mellom KG34 og KG37 (oransje farge)
- E1f. Sanering av eksisterende ledninger og provisoriske ledninger (grå farge)

Henvisninger:
E1-141A: Kumskisse, Kumgruppe 34, 1:20
E1-141B: Kumskisse, Kumgruppe 34, 1:50

F03	2026-05-22	For anskaffelse	SakMai	TEi	TEi
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					Målestokk (gjelder A1)
Østre Toten kommune					1:50
VA Lensbygda - Gransmarka Etappe 1 Faseplan Kumgruppe 34					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5197400	E1-141C	F03	

E1a.	Eksisterende situasjon,eksisterende kummer og ledninger, alle er i drift
E1b.	Etablering av V27A og V27B (gull farge)
E1c.	Etablering av S27 og O27 samt sanering og omkobling av sidegren Ø160 (rosa farge)
E1d.	Etablering av ledninger sør for KG27 samt tilrettelegging for etappe 2 (grønn farge)
E1f.	Provisorisk VL 63 fra eksisterende vannkum (blå farge)
E1g.	Etablering av ledninger nord for KG27, tilkobling av V27B med eksisterende VK. Tilkobling av Ø63 stikkledning i kum V27B og fjerning av provisorisium (oransje farge)
E1h.	Eksisterende VL nord for eks. VK frakobles når vannledninger lagt i etappe 1 er satt i normal drift.
E1i.	Etablering av Etappe 2 (lille farge)
E1j.	Frakobling av eksisterende vannkum 62129 og tilhørende ledninger (rød farge)

F03	2026-05-22	For anskaffelse	SakMai	TEi	TEi
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

VA Lensbygda - Gransmarka
Etappe 1
Faseplan
Kumgruppe 27

Norconsult 	Oppdragsnummer 5197400	Tegningsnummer E1-142C	Revisjon F03
---	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

E1a.	Eksisterende situasjon,eksisterende kummer og ledninger, alle er i drift
E1b.	Lokalisering av eksisterende ledninger til/fra kummer/pumpestasjon før etablering av nye kummer
E1c.	Etablering av kumgruppe 50 og tilhørende ledninger (ikke skjøting til eksisterende ledninger (gull farge)
E5d.	Etablering av ny vannstasjon i buskum (kum V1 i oversiktskart) og nye pumper og ombygging av røropplegg i ventilkammer Vilberg HB
E1d.	Midlertidig omkobling trykkside av pumper i Kleiva, via nyetablert kum V50A, for å kunne sette vanntrykk i deler av nytt anlegg i E1, testkjøring av nye Buskumlinna vannstasjon (kum V1).
E1f.	Sanering av eksisterende ledning og skjøting med nylig etablerte ledninger når resten av E1 er ferdigstilt, og nye pumper i Vilberg etc. er klart til å settes i drift. (rosa farge)
E1g.	Riving av pumpestasjon8122 og kum 8121 samt drenskum 68964 (grønn farge)
E1h.	Sanering av eksisterende ledninger som tilhører til eksisterende kummer og pumpestasjon, samt midlertid Ø110 ledning til kum V50A (oransje farge)

F02	2026-05-22	For anskaffelse	SakMai	TEi	TEi
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					
Østre Toten kommune				Målestokk (gjelder A1) 1:50	
VA Lensbygdta - Gransmarka Etappe 1 Faseplan Kumgruppe 50					
		Oppdragsnummer	Tegningsnummer		Revisjon
		5197400	E1-147C		F02
