STATSBYGG

Livsvitenskapsbygget

Nivå 1 - Hovedfremdriftsplan - Baseline 9

UiO : Livsvitenskap
Universitetet i Oslo

Beskrivelse

- **Hovedfremdriftsplan**
  - 1. Prosjektering og utførelse - Til tett bygg
    - Fase 1A: Avgraving
      - 1 - Prosjektering
      - 3 - Produksjon
    - Fase 1B: KC-kulvert, VA-kulvert
      - 1 - Prosjektering
      - 3 - Produksjon
    - Fase 1C: Staging av spunt, masseutgraving
      - 1 - Prosjektering
      - 3 - Produksjon
    - Fase 1C: Stålkjernepeling
      - 1 - Prosjektering
      - 3 - Produksjon
    - Fase 2A: Bunnplate og yttervegger K3/K1
      - 1 - Prosjektering
      - 2 - Myndighetsbehandling
      - 3 - Produksjon
    - Fase 3A: Råbygg
      - 1 - Prosjektering
      - 2 - Myndighetsbehandling
      - 3 - Produksjon
    - Fase 3B: Fasade og tak
      - 1 - Prosjektering
      - 2 - Myndighetsbehandling
      - 3 - Produksjon
  - 2. Prosjektering og utførelse - Innvendig
    - Fase 4: Tekniske arealer inkl sjakter
      - 1 - Prosjektering
      - 2 - Myndighetsbehandling
      - 3 - Produksjon
      - 4 - Igangkjøring
    - Fase 4: Lab
      - 1 - Prosjektering
      - 2 - Myndighetsbehandling
      - 3 - Produksjon
      - 4 - Igangkjøring
    - Fase 4: Kontor, Allmenning, Undervisning
      - 1 - Prosjektering
      - 2 - Myndighetsbehandling
      - 3 - Produksjon
      - 4 - Igangkjøring
  - 3. Prosjektering og utførelse - Uteområder
    - Rekkefølgekrav: Sykkelbro
      - 1 - Prosjektering
      - 2 - Myndighetsbehandling
      - 3 - Produksjon
    - Fase 5: Landskap
      - 1 - Prosjektering
      - 2 - Myndighetsbehandling
      - 3 - Produksjon
  - 4. Ibruktakelse
    - Trinn 1: ~del 2 (felt 4-6)
      - 5 - Idriftsetting
      - 6 - Myndighetsbehandling
      - 7 - Prøvedrift
    - Trinn 2: ~del 3 (felt 7-8)
      - 5 - Idriftsetting
      - 6 - Myndighetsbehandling
      - 7 - Prøvedrift
    - Trinn 3: ~del 1 (felt 1-3)
      - 5 - Idriftsetting
      - 6 - Myndighetsbehandling
      - 7 - Prøvedrift

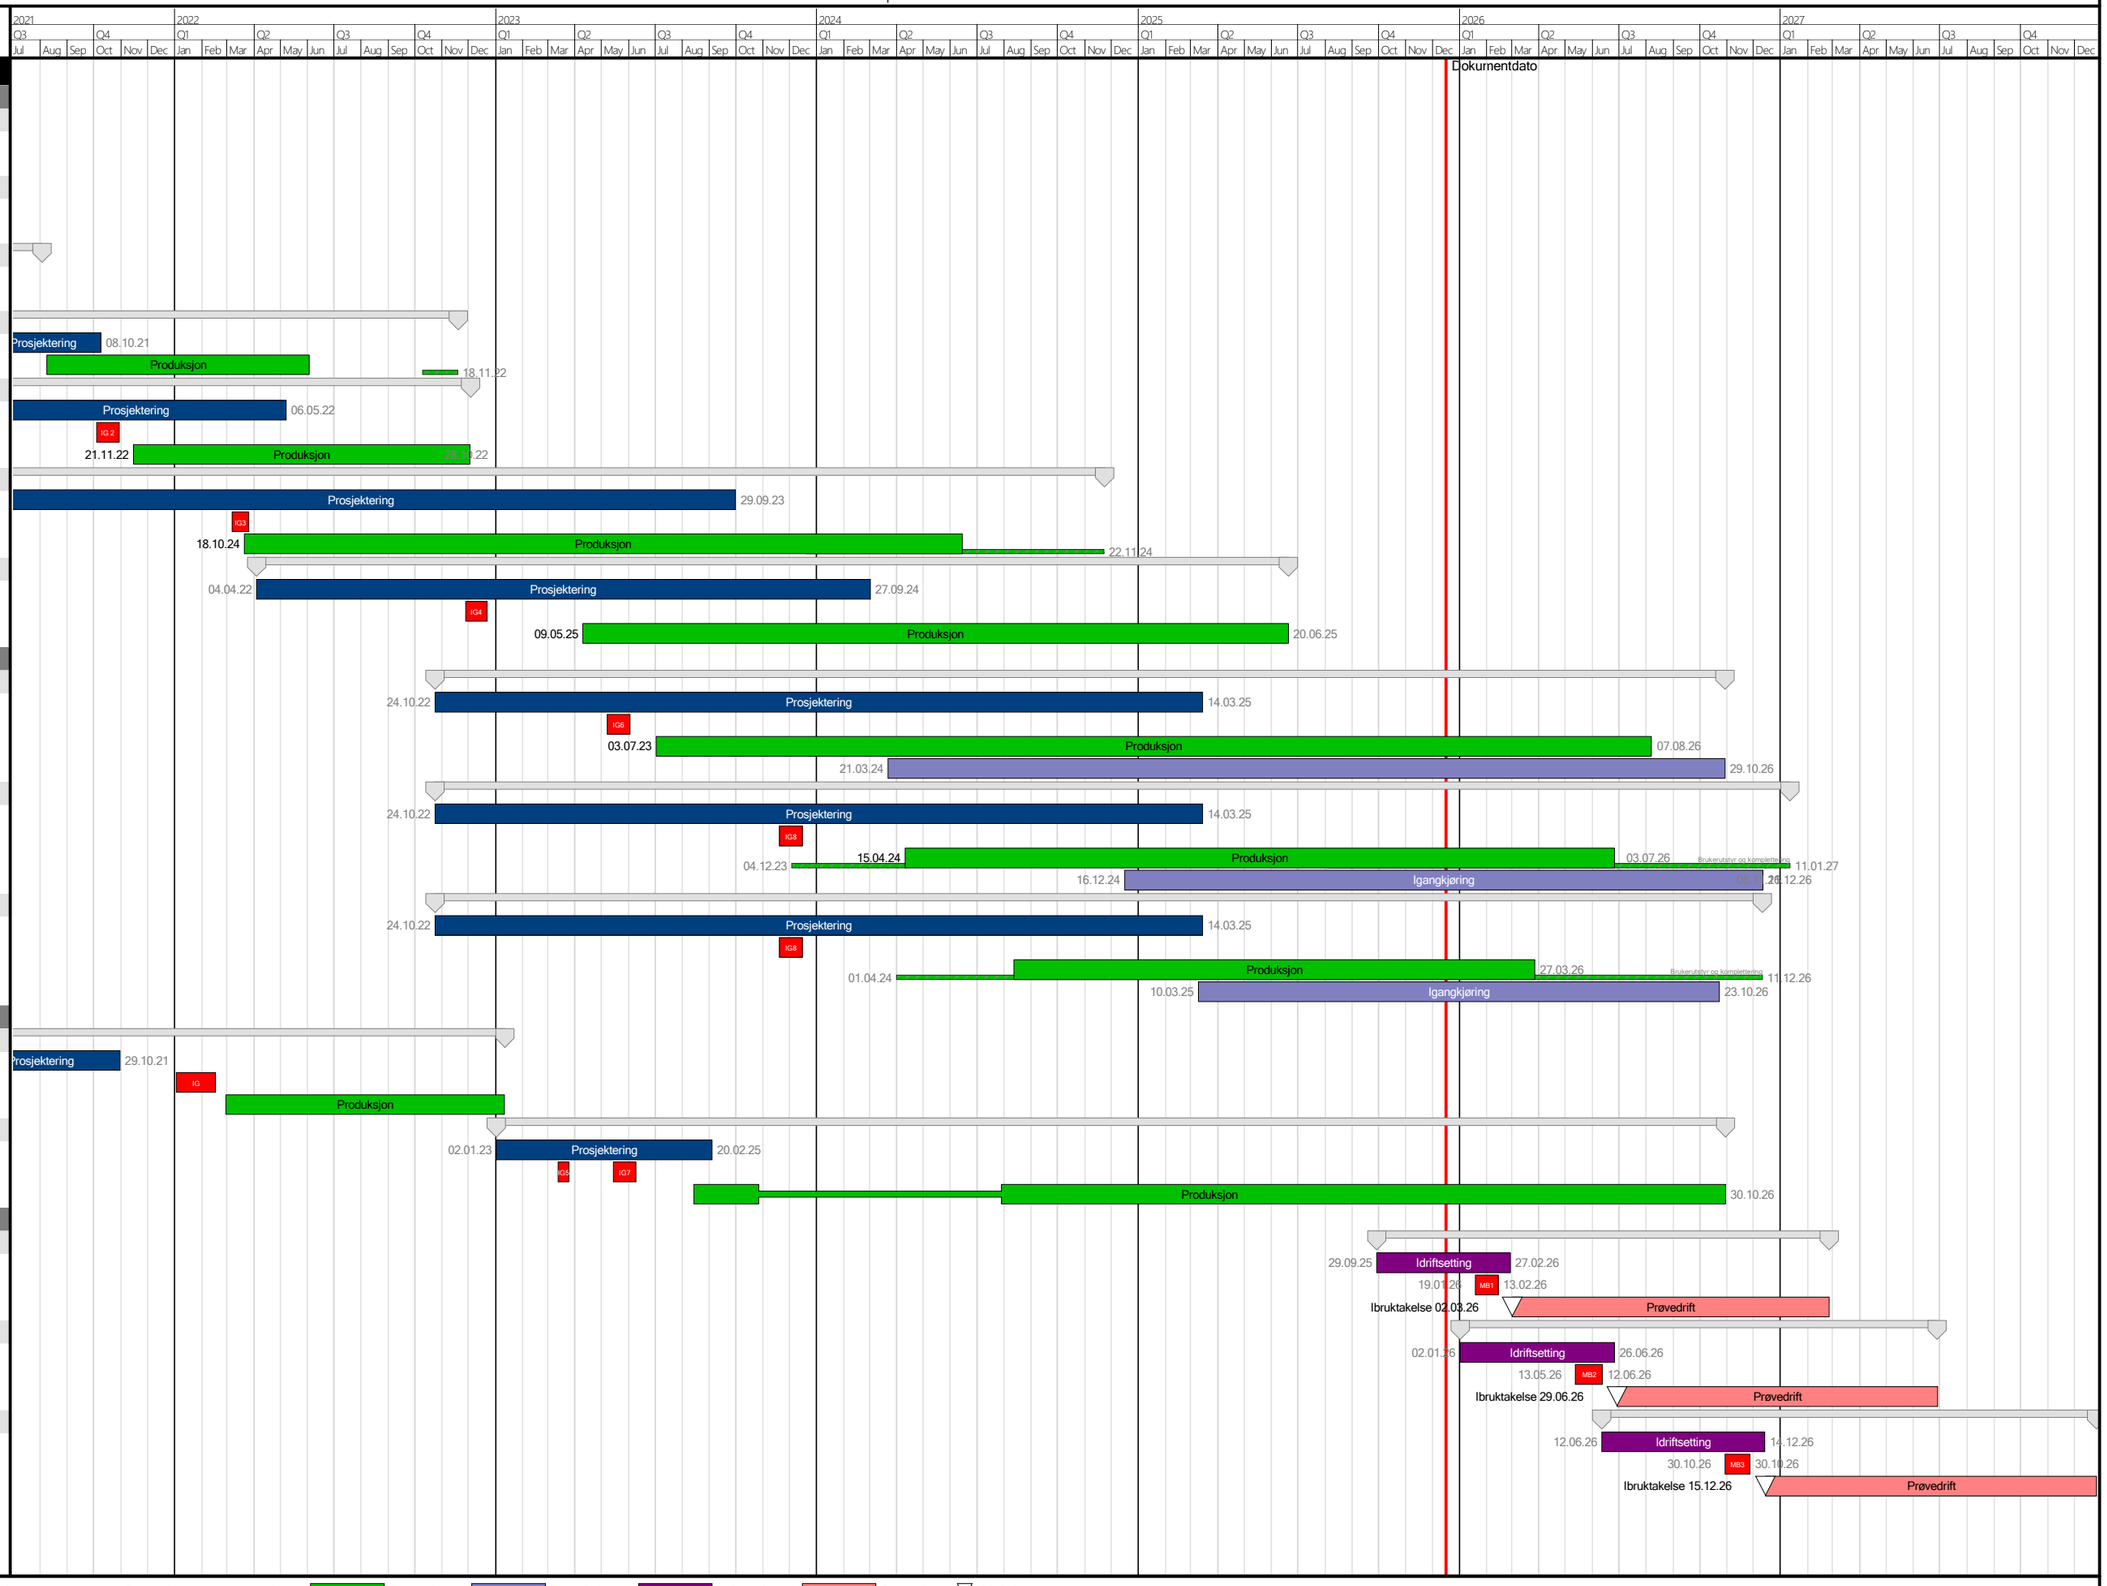

Prosjektering | Myndighetsbehandling | Produksjon prep/komplettering | Produksjon | Igangkjøring | Idriftsetting | Prøvedrift | Mulig ibruktakelse
