ID	Aktiv	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
1		**Judaberg kai**	**254 dager**	**on 12.08.26**	**ma 02.08.27**
2		Tomatfestivalen Judaberg	3 dager	to 20.08.26	ma 24.08.26
3		Prosjektering og tilrigging	30 dager	on 12.08.26	ti 22.09.26
4		Riving	20 dager	on 23.09.26	ti 20.10.26
5		Fundamentering	20 dager	on 21.10.26	ti 17.11.26
6		Gyteperiod for torsk	65 dager	ma 01.02.27	fr 30.04.27
7		Betongarbeider m.m	100 dager	on 18.11.26	ti 06.04.27
8		**Forbefaring**	**0 dager**	**ti 06.04.27**	**ti 06.04.27**
9		Retting evt. feil og mangler	10 dager	on 07.04.27	ti 20.04.27
10		**Overtakelsesforretning**	**0 dager**	**ti 20.04.27**	**ti 20.04.27**
11		Hekkeperiode	88 dager	to 01.04.27	ma 02.08.27

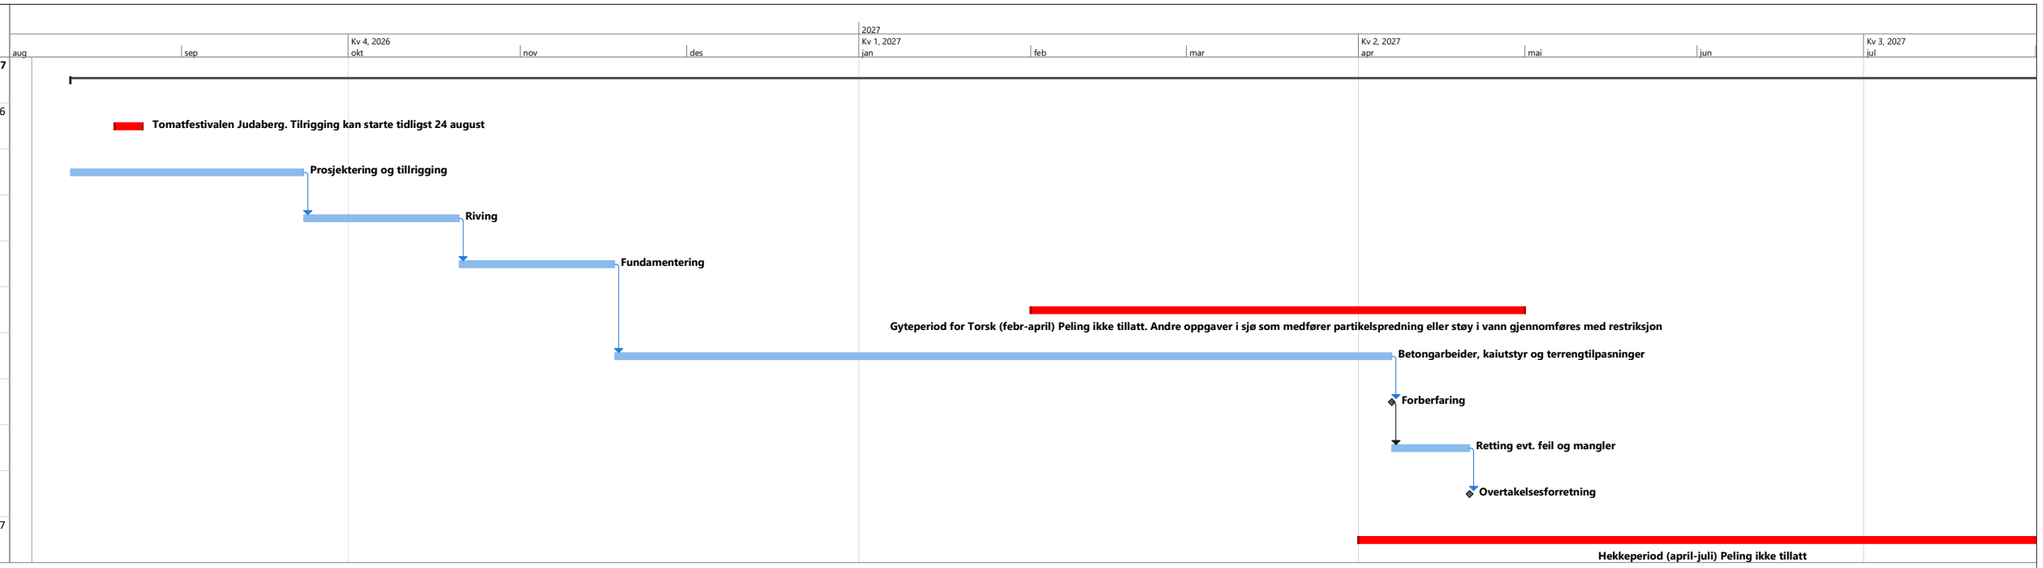

Prosjekt: Hellesøy Kai^J oriente
Dato: on 27.05.26

Aktivitet | Milepæl | Prosjektsammendrag | Inaktiv milepæl | Manuell aktivitet | Manuell sammendragsfremheving | Bare start | Eksterne aktiviteter | Tidsfrist | Manuell fremdrift
Deling | Sammendrag | Inaktiv aktivitet | Inaktivt sammendrag | Bare varighet | Manuelt sammendrag | Bare slutt | Ekstern milepæl | Fremdrift
