
ID	WBS	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
1	**1**	**Del I - Hovedentreprise**	**280 dager**	**ma 26.10.26**	**to 23.12.27**
2	1.1	Veg/VA/elektro	423 udager	ma 26.10.26	to 23.12.27
3	**2**	**Del II - Borehull**	**111 dager**	**ma 15.03.27**	**ma 13.09.27**
4	2.1	Boring Stølebekken-Støleheia	182 udager	ma 15.03.27	ma 13.09.27
5	2.2	Boring under høyspent/eksisterende skogsbilveg	30 udager	ma 15.03.27	on 14.04.27
6	**3**	**Del III - Høydebasseng**	**237 dager**	**ma 02.11.26**	**ma 01.11.27**
7	3.1	Veg/VA/elektro	210 udager	ma 02.11.26	ma 31.05.27
8	3.2	Høydebasseng	182 udager	ma 03.05.27	ma 01.11.27
9	**4**	**Del IV - Trykkøker**	**71 dager**	**to 01.04.27**	**fr 30.07.27**
10	4.1	Trykkøker 1	120 udager	to 01.04.27	fr 30.07.27
11	4.2	Trykkøker 2	120 udager	to 01.04.27	fr 30.07.27
12	**5**	**Del V - Avløpspumpestasjon**	**70 dager**	**ma 19.04.27**	**ti 17.08.27**
13	5.1	Avløpspumpestasjon	120 udager	ma 19.04.27	ti 17.08.27
14	**6**	**Ferdigstillelse**	**85 dager**	**ma 30.08.27**	**fr 24.12.27**
15	6.1	Sammenkobling VA/elektro	80 udager	ma 30.08.27	to 18.11.27
16	6.2	Testing og idriftsetting	70 udager	to 14.10.27	to 23.12.27
17	6.3	Overlevering	0 dager	fr 24.12.27	fr 24.12.27
18					
19	**7**	**Utkoblinger høyspent**	**0 dager**	**to 01.10.26**	**to 01.10.26**
20	7.1	Planlagte utkoblingsdatoer for høyspent må innhentes fra netteier.	0 dager	to 01.10.26	to 01.10.26
21					
22	**8**	**Tilkomst Stasjonsvegen**	**298 dager**	**to 01.10.26**	**fr 24.12.27**
23	8.1	Fullt beslaglagt	15 udager	to 01.10.26	fr 16.10.26
24	8.2	Tidvis beslaglagt	320 udager	fr 16.10.26	on 01.09.27
25	8.3	Åpen	114 udager	on 01.09.27	fr 24.12.27
26					
27	**9**	**Hensyn - natur**	**302 dager**	**lø 01.08.26**	**sø 31.10.27**
28	9.1	Hekkeperiode	91 udager	to 15.04.27	to 15.07.27
29	9.2	Unngå fjerning av kantvegetasjon	91 udager	to 01.04.27	to 01.07.27
30	9.3	Gyteperiode 2026	91 udager	lø 01.08.26	lø 31.10.26
31	9.4	Gyteperiode 2027	91 udager	sø 01.08.27	sø 31.10.27

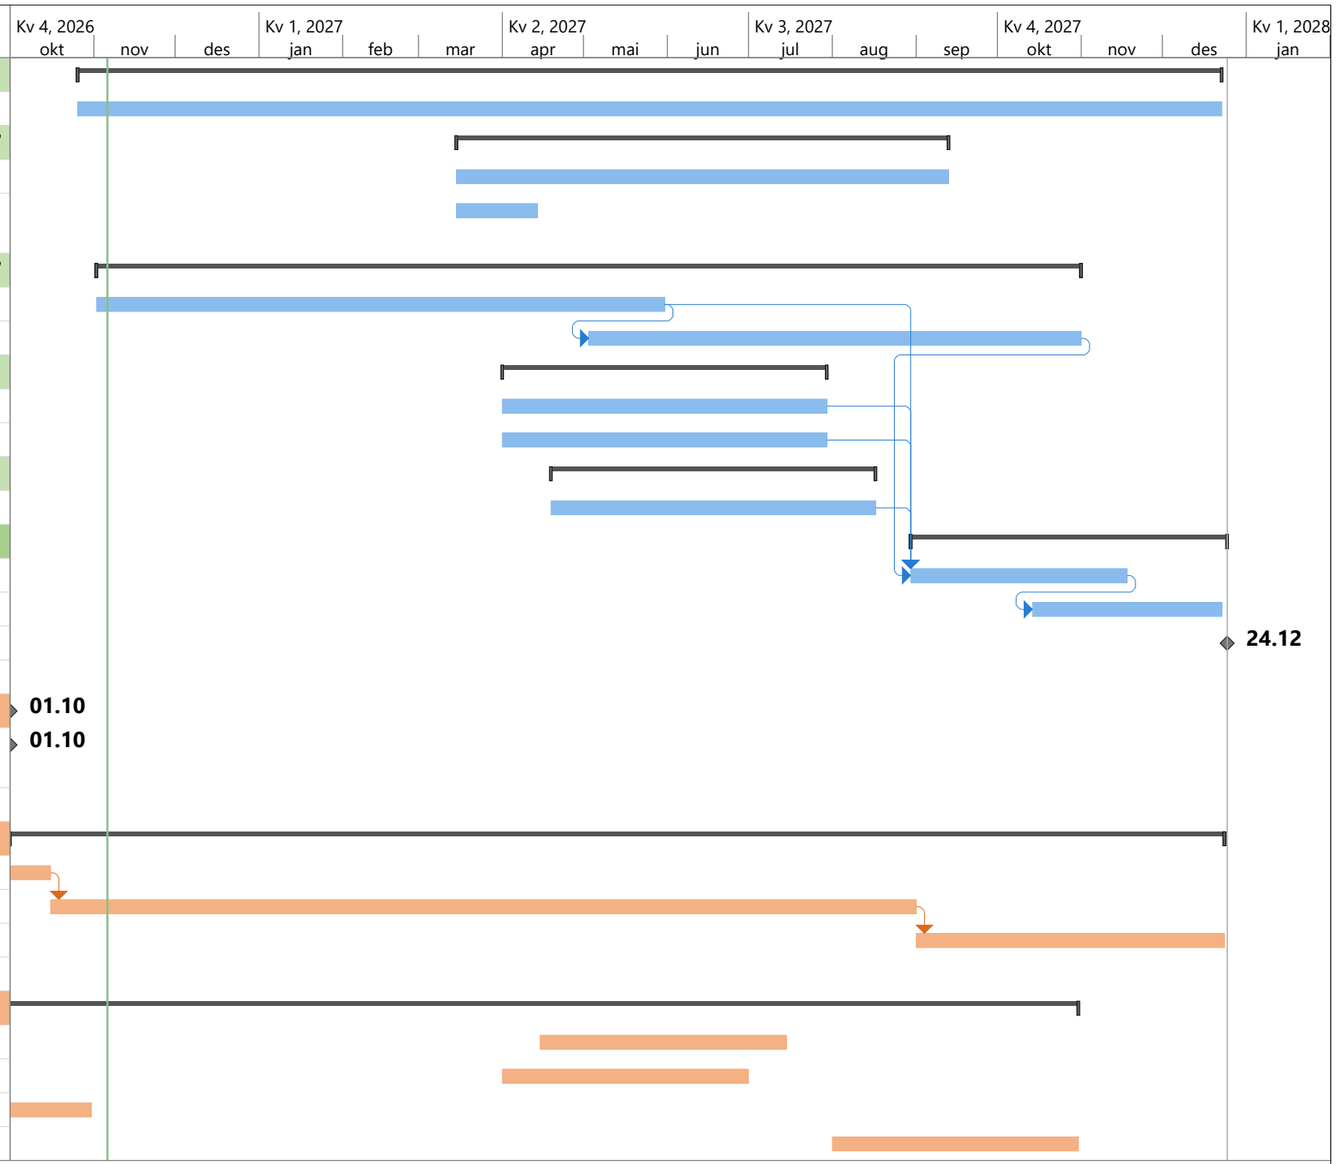

Prosjekt: Fremdriftsplan byggep
Dato: fr 06.11.26

Aktivitet	Inaktiv aktivitet	Manuell sammendragsfremheving	Ekstern milepæl
Deling	Inaktiv milepæl	Manuelt sammendrag	Tidsfrist
Milepæl	Inaktivt sammendrag	Bare start	Fremdrift
Sammendrag	Manuell aktivitet	Bare slutt	Manuell fremdrift
Prosjektsammendrag	Bare varighet	Eksterne aktiviteter	
