

INVITASJON TIL MARKEDSDIALOG

Fv552 HATVIKVEGEN –

GJENNOMFØRING OG KONTRAKTSFORM

1. Innledning

Vestland fylkeskommune ønsker å invitere til markedskonferanse med relevante aktører for prosjektet Fv552 Hatvikvegen. Parsell: Hegglandsdalvegen-Bjåneskrysset i Bjørnafjorden kommune. Markedskonferansen gjennomføres for å få leverandørenes tilbakemelding på konkurransen/prosjektet før utarbeidelse av konkurransedokumentene.

Markedskonferansen vil bestå av åpen dialogkonferanse, samt en-til-en møter.

Formålet med markedskonferansen er å få tilbakemelding fra entreprenører på hvordan en best kan fullføre prosjektet med tanke på økonomi, fremdrift og kvalitet. Det er også ønskelig å få tilbakemelding fra interesserte på forventet byggetid og entrepriseform.

2. Om prosjektet

Prosjektet blir i hovedsak finansiert gjennom Miljøløftet. Samtidig er det et spleiselag med både kommunale og fylkeskommunale midler, sammen med bidrag fra utbyggerinteressene på Bjåneshalvøya. Formålet med prosjektet er ferdigstilling av påbegynt anleggsarbeid.

Prosjektet Fv. 552 Hatvikvegen er et prosjekt i Miljøløftet som hadde anleggsstart i 2024. Deler av anleggsområdet er omfattet av reguleringsplan for Fv552 Hatvikvegen. Resten av anleggsområdet er omfattet av teknisk plan for veg og VA. Prosjektet innebærer etablering av gang- og sykkelveg, to kjørefelt, vann- og avløp, samt overvannshåndtering og annen teknisk infrastruktur. Store deler av anlegget er påbegynt og hadde planlagt ferdigstilling 31. august 2026. Entreprenør som hadde kontrakt på anleggsarbeidet, gikk i mars 2026 konkurs. Det har etter konkursen blitt gjennomført noe sikringsarbeid, samt pågående kompletterende arbeider for å klargjøre et tydeligere grensesnitt, før utlysing av ny kontrakt. Vegstrekningen er ca. 1,1 km.


Noen momenter:

- Tidligere entreprenør har utført største delen av vann- og avløpsledninger og overvannsledninger. Det gjenstår likevel noen strekninger med vann, avløp og overvannsledninger, samt utbedring av strekninger med underkjente trykktester.
- En del av grunnarbeidet er utført, men det gjenstår vegoverbygning på største deler av vegstrekningen. Det skal også utføres en del arbeider knyttet til sekundærveier.
- Prosjektet inneholder en del natursteinsmurer. Ca. 1620 m² natursteinsmurer er etablert. Av etablerte natursteinsmurer skal ca. 400 m² tas ned og reetableres grunnet kvalitetsavvik. Dette arbeidet inkluderer m.a. riving av etablert betongrekkverk, asfalt, VA- ledninger og kabelgrøfter. Det må også påregnes resetting av avlastingsplater for etablert betongkulvert. Ca. 1000m² ny natursteinsmur skal også etableres.


- Deler av betongarbeidet er utført. Gjenstående betongarbeid skal fullføres. Søyler for støyskjermer må tilpasses utført betongarbeid (boltegrupper).
- Kabelgrøfter
- Etablering av støyskjermer. Ca. 1300 m²
- Kantstein og legging av smågatestein
- Arbeid med grøntarealer, sideareal og oppfylling av grunnavtaler
- Vegbelysning, skilt, leskur, rekkverk og annet vegutstyr

På hele strekket er det stor trafikkmengde på grunn av ferjesambandet Hatvik-Venjanaset. Det er også viktig å ivareta myke trafikanter i anleggsperioden. Det kreves god plan for trafikkavvikling og koordinasjon med både trafikanter, naboer, ferjesamband og andre tjenester som buss, post og avfallshåndtering. Hele anleggsområdet ligger tett inntil boliger, og det er vesentlig å hensynta disse i anleggsgjennomføringen mtp. støy, støv, informasjon m.m.


Det er begrenset areal innenfor anleggsgrensen til håndtering av masser og riggområde. Tidligere entreprenør inngikk egne avtaler med naboer om riggområde, omkjøringsveg og deponiområder. Det pågår avklaringer knyttet til disse arealene, men det er pr. tidspunkt ingen avtale mellom Vestland fylkeskommune/Bjørnafjorden kommune og grunneiere for arealer som ikke inngår i grunnervervsavtaler.

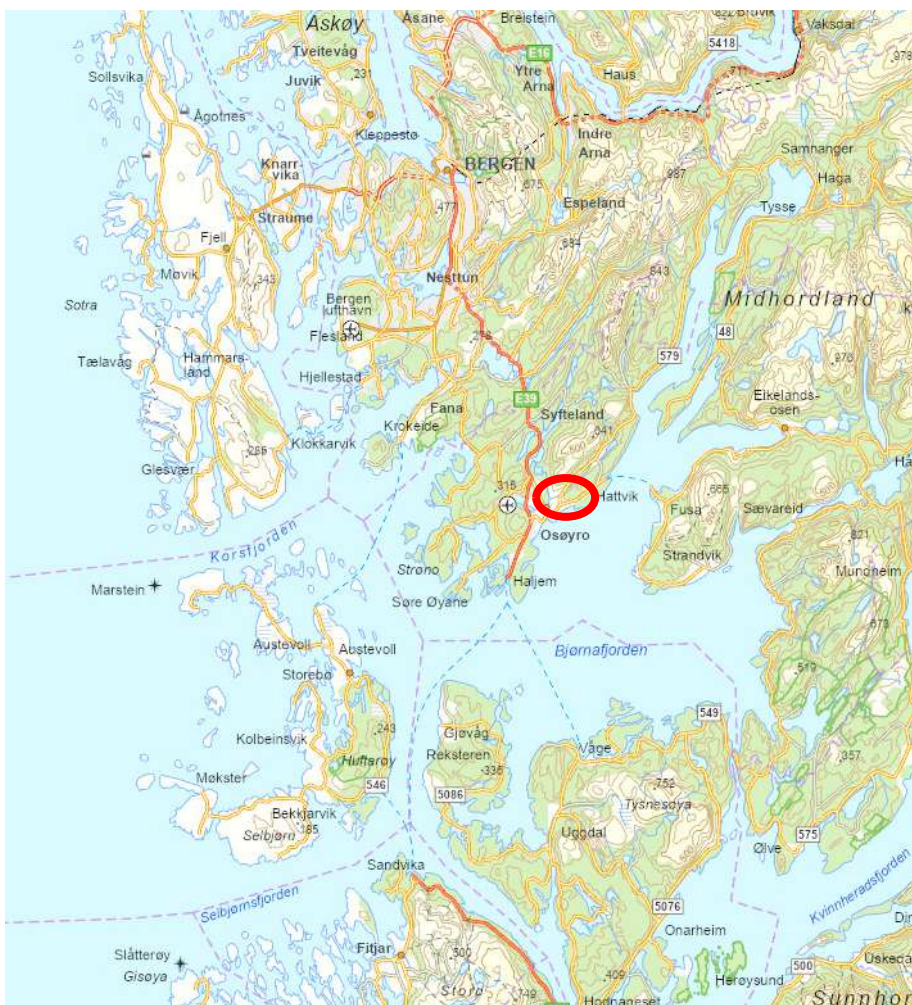

Figur 1: Oversiktskart som viser lokalisering av anleggsområdet. Anleggsområder er markert med rødt omriss i kartet.

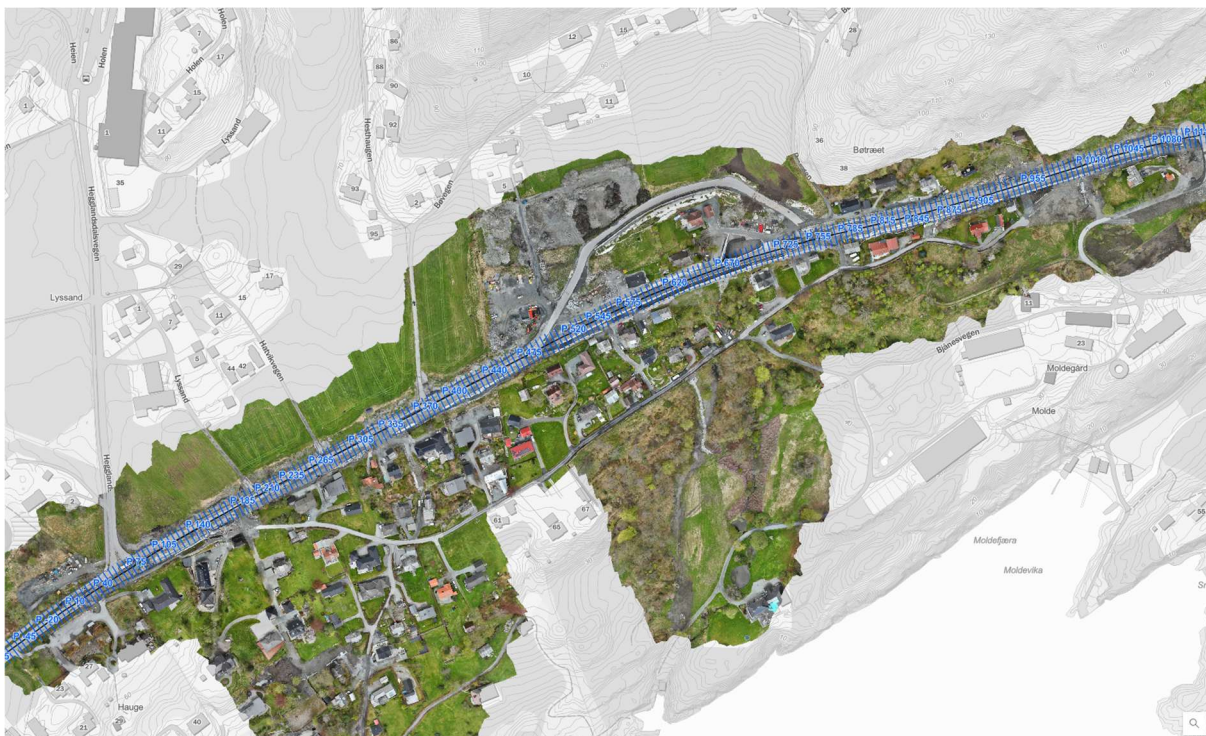

Figur 2: Dronefoto av anleggsområdet

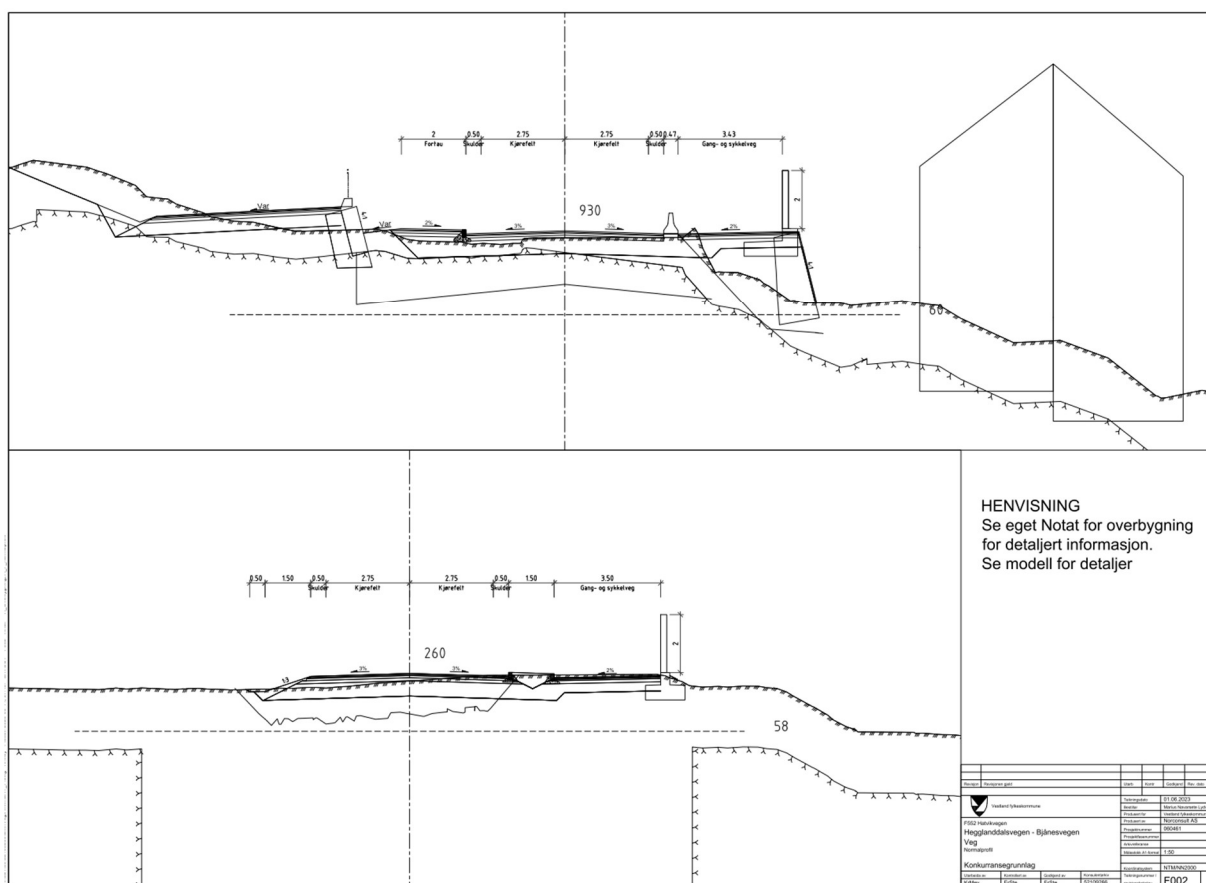

Figur 3: Normalprofil for prosjektet

Side 4 av 6

3. Gjennomføring av markedsdialog

3.1 Program

- Kl. 09:00- Orientering om prosjektet og behov
- Kl. 09:30- Innspill og spørsmål fra leverandører
- Kl. 10:00: Befaring på prosjektet
- Kl. 11:30: Lunch
- Kl. 12:30 – 16:00: en-til-en møter (ca. 1 time pr. interessent)

3.2 Markedskonferanse

Vestland fylkeskommune gjennomfører en markedskonferanse 18.06.2026. Formålet er at Vestland fylkeskommune presenterer behov, svarer på spørsmål og får innledende innspill fra deltakerne.

Dialogkonferanse vil dokumenteres og presentasjon fra møtet, samt spørsmål og svar, vil gjøres offentlig tilgjengelig.

Sted:	Oselvarnaustet, Hamnevegen 49, 5200 Os
Tidspunkt:	18.06.2026 kl. 09:00
Påmelding:	Påmelding til markedskonferansen innen 16.06.2026 kl. 12:00 til: ola.klyve.dalland@vlfk.no
Formål:	- Orientering om prosjektet - Angi oppdragsgivers behov - Gi relevant informasjon slik at interessenter kan gi skriftlig/muntlig tilbakemelding på: 1. Hvordan ser entreprenør for seg å videreføre et allerede påbegynt anleggsarbeid? 2. Kontraktsform a. Utførelsesentreprise NS8406 eller totalentreprise NS8407? b. Forslag til miljøkriterier – Krav eller konkurranse? 3. Nødvendig byggetid? Skiftelige svar på etterspurte spørsmål sendes til ola.klyve.dalland@vlfk.no merket «Fv552 Hatvikvegen» innen 10.07.2026.

3.3 Befaring

Det gjennomføres felles befaring på prosjektet. ca. kl. 10:00. Det er begrenset parkering i anleggsområdet, så det oppfordres til samkjøring. Befaringen vil i hovedsak bli gjennomført langs Fv552 Hatvikvegen. Deltakere som ønsker å delta på befaringen må ha synlighetstøy kl. 3, hjelm og vernesko.

3.4 En-til-en møter

Etter lunch gjennomføres det en-til-en møter på ca. 1 time med aktører som ønsker dette. Det settes av tid fra kl. 12:30 – 16:00 for gjennomføring av møtene.

Formålet med en-til-en møtene er å få konkrete innspill fra markedet, presentasjon av aktuelle løsninger og legge til rette for diskusjon knyttet til hvordan behovet til Vestland fylkeskommune best mulig kan dekkes. Ideer som kommer frem i denne prosessen vil kunne bli brukt i både utarbeidelse

av kontraktsstrategi og i andre dokumenter som tilhører konkurransen. Forretningshemmeligheter som fremkommer i møtene vil ikke deles videre.

Sted	Oselvarnaustet, Hamnevegen 49, 5200 Os
Tidspunkt:	18.06.2026 kl. 12:30-16:00
Bestilling av en-til-en møter:	Påmelding til en-til-en møter innen 16.06.2026 kl. 12:00 til: ola.klyve.dalland@vlfk.no Listen fylles fortløpende opp.

3.5 Påmelding

Påmelding til dialogkonferansen og en-til-en møter sendes innen 16.06.2026 kl. 12:00 til:

ola.klyve.dalland@vlfk.no

I påmeldingen oppgis:

- Bedrift
- Kontaktperson
- Kontaktpersons telefonnummer og e-post
- Ønsket tidspunkt for en-til-en møte
- E-post til ev. andre som skal delta frå same leverandør

Leverandører vil bli tildelt tidspunkt for en-til-en møter fortløpende. Hvis det viser seg at det er mange som ønsker en-til-en møter vil det kunne tas en-til-en møter digitalt 19.06.2026.

4. Etterfølgende konkurranse

Anskaffelsesregelverket gjelder herunder FOA del I og II.

Vestland fylkeskommune forbeholder seg retten til å benytte innspill fra markedskonferansen i utarbeiding av konkurransegrunnlaget for angjeldende anskaffelse. Videre forbeholder Vestland fylkeskommune seg retten til å gjennomføre ytterlige markedsundersøkelser dersom det er behov for det.

Det presiseres at deltagelse i senere konkurranse ikke betinget av at interessenter deltar på konferansen eller gir skriftlige tilbakemeldinger til oppdragsgiver.

Det gjøres oppmerksom på at Vestland fylkeskommune har en plikt til å sørge for at deltakere i konferansen ikke får noen urimelig konkurransefordel (jfr. FOA § 12-2), og at tilbydere i den senere konkurranse vil motta samme relevante opplysninger som er utvekslet i dialogen.
